





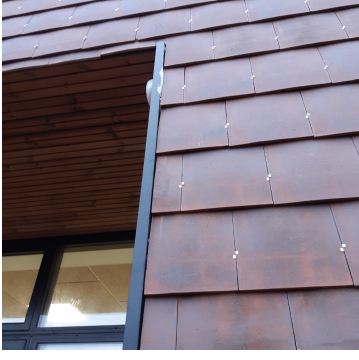





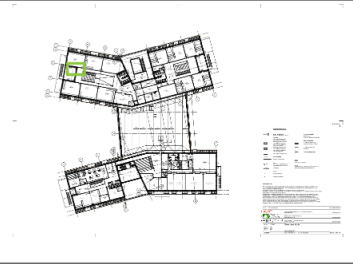
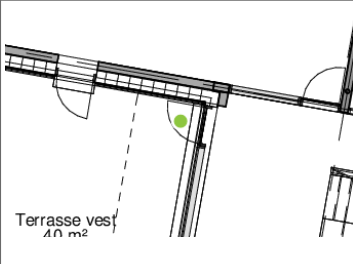
















Placering		Forløb	
			<p><b>M252: Teglsten</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:43</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s</p> <p>Emne: Teglsten</p> <p>"Teglsten sidder ikke fast"</p>
			<p><b>M251: Skæring af tegl</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:41</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s</p> <p>Emne: Skæring af tegl</p> <p>"Teglsten skal rettes, og skæres til"</p>
			<p><b>M250: Plast på hjørnet</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:39</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s</p> <p>Emne: Plast på hjørnet</p> <p>"Der sidder plast på hjørnet som ikke er blevet fjernet."</p>
			<p><b>M249: Skæring af tegl</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:38</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s</p> <p>Emne: Skæring af tegl</p> <p>"Hjørnet er ikke skåret som alle øvrige hjørner"</p>

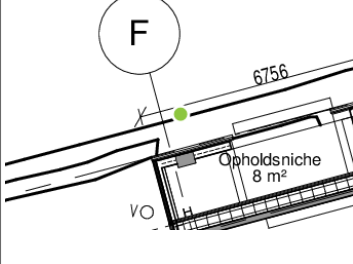

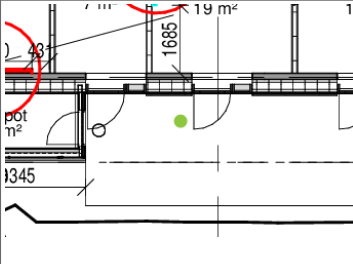




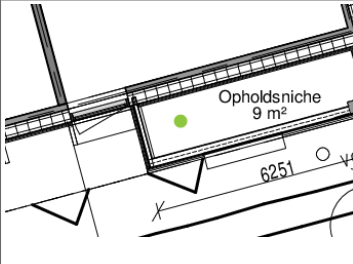


Placering		Forløb	
			<p><b>M248: Skæring af tegl</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:37</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Skæring af tegl "Hjørnet er skåret som alle øvrige hjørner"</p>
			<p><b>M247: Skæring af tegl</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:34</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Skæring af tegl "Hjørnet er ikke skåret som alle øvrige hjørner"</p>
			<p><b>M246: Skæring af tegl</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:31</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Skæring af tegl "Teglsten tander og er ikke skåret lige"</p>

Placering		Forløb		
		 <p>Terrasse vest 40 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M245: Mangel tømrer</b>  Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:29  Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s  Emne: Mangel tømrer  "Løsning i hjørnet er flækket."</p>	
<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk  Rum: Terrasse vest 7  Etage: E01</p>			 <p>Afsætning og opbevaring 11 m<sup>2</sup></p> <p>7131</p>	<p><b>M244: Mangel tømrer</b>  Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:25  Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s  Emne: Mangel tømrer  "Beklædning mangler"</p>
<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk  Rum: Afsætning og opbevaring 3.10  Etage: E00</p>			 <p>F</p> <p>6756</p> <p>VO</p> <p>Opholdsniche 8 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M243: Skæring af tegl</b>  Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:25  Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s  Emne: Skæring af tegl  "Hjørnet er ikke skåret som alle øvrige hjørner"</p>
<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk  Etage: E00</p>				

Placering		Forløb
		
<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00</p>	<p><b>M242: Mangel tømrer</b> Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:24 Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Mangel tømrer "Underbeklædning mangler"</p>	
		
<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00</p>	<p><b>M241: Mangel tømrer</b> Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:23 Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Mangel tømrer "Beklædning mangler"</p>	
		
<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Opholdsniche 3.13 Etage: E00</p>	<p><b>M240: Mangel tømrer</b> Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:23 Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Mangel tømrer "Beklædning mangler"</p>	


Placering		Forløb	
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00</p>	 <p>Depot 8 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M239: Skæring af tegl</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:22</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Skæring af tegl "Generelt ved næsten alle hjørner, døre og vinduer, tander teglsten og er ikke skåret lige"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00</p>	 <p>Depot 8 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M238: Skæring af tegl</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:21</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Skæring af tegl "Teglsten tander og er ikke skåret lige"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00</p>		<p><b>M237: Skæring af tegl</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:20</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Skæring af tegl "Teglsten tander og er ikke skåret lige"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00</p>	 <p>PPR 0.49 ernen 5 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M236: Skæring af tegl</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:18</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Skæring af tegl "Teglsten tander og er ikke skåret lige"</p>


	Placering		Forløb
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00</p>		<p><b>M235: Skæring af tegl</b> Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:17 Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Skæring af tegl "Teglsten tander og er ikke skåret lige"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00</p>		<p><b>M234: Mangel tømrer</b> Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:17 Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Mangel tømrer "Beklædning ødelagt ved montage."</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00</p>		<p><b>M233: Skæring af tegl</b> Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:17 Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Skæring af tegl "Teglsten tander, og er ikke skåret lige"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00</p>		<p><b>M232: Skæring af tegl</b> Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:16 Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Skæring af tegl "Tegl tander og er ikke skåret lige."</p>

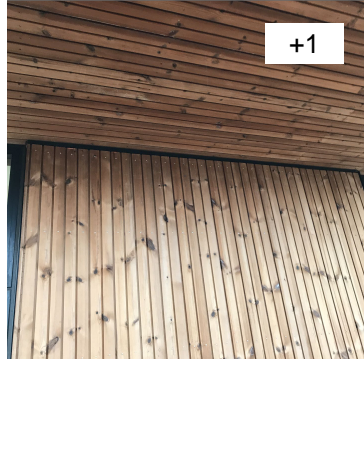Placering	Forløb	
		<p><b>M231: Mangel tømrer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:13                      Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s                      Emne: Mangel tømrer                      "Insektnet eftergås generelt"</p>
	 <p data-bbox="403 907 764 1099">Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00</p>	 <p data-bbox="764 907 1125 1099">6548 Aben int op Overdækket udeværksted</p> <p><b>M227: Mangel tømrer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:08                      Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s                      Emne: Mangel tømrer                      "Stop og fuge mangler"</p>
	 <p data-bbox="403 1355 764 1554">Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00</p>	 <p data-bbox="764 1355 1125 1554">F VO</p> <p><b>M226: Mangel tømrer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:07                      Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s                      Emne: Mangel tømrer                      "Beklædning mangler"</p>
	 <p data-bbox="403 1803 764 2002">Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00</p>	 <p data-bbox="764 1803 1125 2002">Terrasse Foldevær</p> <p><b>M224: Mangel tømrer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:05                      Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s                      Emne: Mangel tømrer                      "Insektet skubbes længere ind. Det er steder meget synlig og andre steder perfekt skjult. Ensartethed"</p>


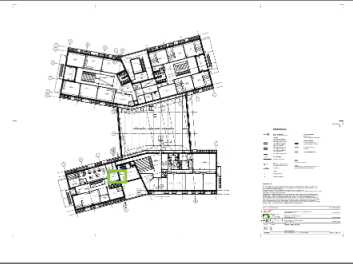
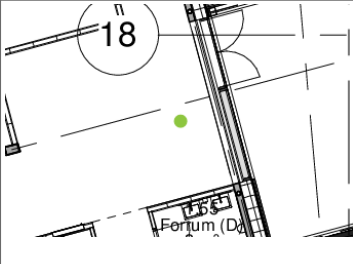

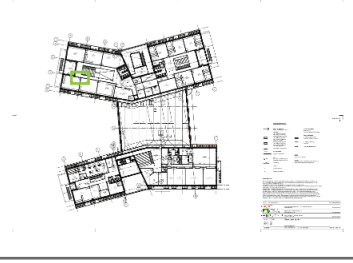
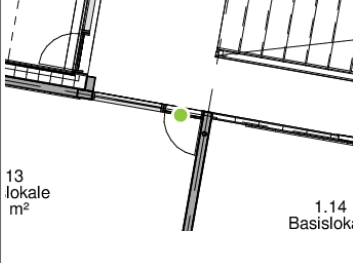
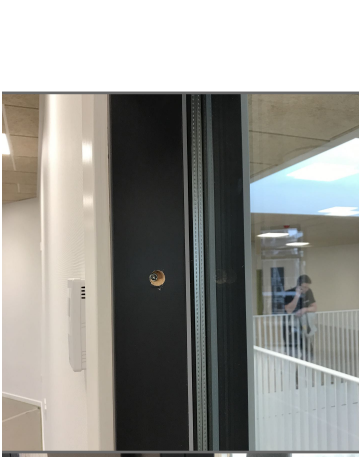

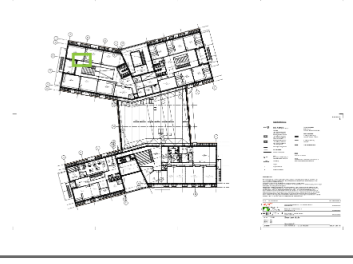
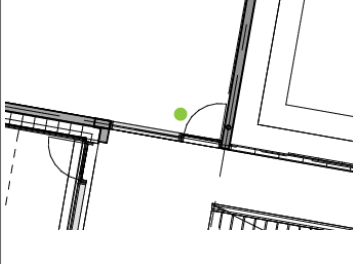
Placering		Forløb	
			<p><b>M223: Mangel tømrer</b>  Tildelt af: <a href="#">Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:02</a>  Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s  Emne: Mangel tømrer</p>
		 <p>Terrasse</p>	<p><b>M222: Mangel tømrer</b>  Tildelt af: <a href="#">Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:02</a>  Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s  Emne: Mangel tømrer  " Tape fjernes"  Opdateret af: <a href="#">Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:02</a></p>
			<p><b>M221: Mangel tømrer</b>  Tildelt af: <a href="#">Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 11:00</a>  Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s  Emne: Mangel tømrer  "Generel mangel. Rengøring af udvendig beklædning."</p>
			<p><b>M220: Mangel tømrer</b>  Tildelt af: <a href="#">Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 10:57</a>  Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s  Emne: Mangel tømrer  "Generel mangel. Blyant streger fjernes fra beklædning"</p>



Placering		Forløb	
		 <p>Terrasse</p>	<p><b>M219: Mangel tømrer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 10:56</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s</p> <p>Emne: Mangel tømrer</p> <p>"Underbeklædning mangler"</p>
		 <p>Terrasse</p> <p>0 115    0 116    0 117</p>	<p><b>M218: Mangel tømrer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 10:56</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s</p> <p>Emne: Mangel tømrer</p> <p>"Underbeklædning mangler"</p>
		 <p>0. Vente</p>	<p><b>M217: Mangel tømrer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 10:05</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s</p> <p>Emne: Mangel tømrer</p> <p>"Skrue stikker ud af beklædning"</p>

Placering		Forløb	
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Samlingsrum 0.64 Etage: E00</p>	<p>0.64 lingsrum 19 m<sup>2</sup></p> <p>Ovenlys med opluk</p> 	<p><b>M216: Mangel tømmer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 10. dec 2020, 09:46</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Mangel tømmer "Generel mangel. Rengøring af træbeklædning"</p> 
	<p>Placering: Generel</p>		<p><b>M215: Mangel tømmer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 13:45</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Mangel tømmer "Generel mangel. Flere steder mangler der montage af gerigter og fodlister. Nogle steder er det ikke muligt at montere fodlister, da der ikke er monteret gulv endnu."</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Forberedelse (indsk.) 1.76 Etage: E01</p>	<p>1.76 Forberedelse (indsk.) 54 m<sup>2</sup></p> 	<p><b>M214: Loftskinne</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 13:31</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Loftskinne "Loftskinne hænger igennem"</p> 
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Forberedelse (mellemttrin) 1.77 Etage: E01</p>	<p>1.77 Forberedelse (mellemttrin) 75 m<sup>2</sup></p> 	<p><b>M213: Loftskinne</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 13:30</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Loftskinne "Loftskinne hænger igennem"</p> <p>Fo</p> 

Placering			Forløb
	 <p data-bbox="403 548 762 741">Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Gang 1.23 Etage: E01</p>	 <p data-bbox="762 548 1126 741">1.18 Gruppeniche 18 m<sup>2</sup> kt. 13.000</p>	<p data-bbox="1126 286 1482 324"><b>M210: Mangel tømrer</b></p> <p data-bbox="1126 324 1482 362">Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 13:13</p> <p data-bbox="1126 362 1482 421">Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Mangel tømrer "Søm skudt igennem karmen."</p>
	 <p data-bbox="403 1003 762 1196">Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Gruppe/Research 1.45 Etage: E01</p>	 <p data-bbox="762 1003 1126 1196">1.40 UU Vejl. 14 m<sup>2</sup> 18</p>	<p data-bbox="1126 741 1482 779"><b>M209: Loftplader</b></p> <p data-bbox="1126 779 1482 817">Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 13:09</p> <p data-bbox="1126 817 1482 875">Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Loftplader "Loftskinne hænger igennem"</p>
			<p data-bbox="1126 1196 1482 1234"><b>M208: Mangel tømrer</b></p> <p data-bbox="1126 1234 1482 1272">Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 13:09</p> <p data-bbox="1126 1272 1482 1330">Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Mangel tømrer "Generel mangel. Afproprning af skrue huller"</p>
	 <p data-bbox="403 1816 762 2007">Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Grupperum 1.20 Etage: E01</p>	 <p data-bbox="762 1816 1126 2007">1.18 Gruppeniche 18 m<sup>2</sup> kt. 13.000 1.20 Grupperum 15 m<sup>2</sup> 1.21 Rengøring 14 m<sup>2</sup></p>	<p data-bbox="1126 1554 1482 1592"><b>M207: Mangel tømrer</b></p> <p data-bbox="1126 1592 1482 1630">Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 13:07</p> <p data-bbox="1126 1630 1482 1688">Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Mangel tømrer "Skramme i kanten dækkes med stift."</p>

Placering		Forløb	
			<p><b>M206: Loftplader</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 13:05</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s</p> <p>Emne: Loftplader</p> <p>"Loftsplade udskiftes pga vand"</p>
<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Gruppe/Research 1.45 Etage: E01</p>			<p><b>M205: Væsentlig mangel tømrer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 13:04</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s</p> <p>Emne: Væsentlig mangel tømrer</p> <p>"Brandpastaen brudt flere steder. Kan døren godkendes?"</p>
			<p><b>M204: Mangel tømrer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 13:01</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s</p> <p>Emne: Mangel tømrer</p> <p>"Generel mangel. Afproving af skrue huller. Alle sektioner"</p>
			<p><b>M203: Mangel tømrer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 12:56</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s</p> <p>Emne: Mangel tømrer</p> <p>"Dørkarm skræmmer."</p>
			
	<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Basislokale 1.01 Etage: E01</p>		

Placering		Forløb	
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Pers. vagt. 0.108 Etage: E00</p>	 <p>0.111 Depot 11 m<sup>2</sup> 0.10 Pers. vagt. 12 m<sup>2</sup> 0.12 Garder 5 m<sup>2</sup> 0.101 Fordeling 29 m<sup>2</sup> Cassiopeia</p>	<p><b>M201: Loftplader</b> Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 12:50 Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Loftplader "Loftplader ikke afsluttet korrekt ind mod væg"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Toi, (D) 0.87 Etage: E00</p>	 <p>0.88 Toi. forrum 4 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M200: Loftplader</b> Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 12:47 Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Loftplader "Loftplade udskiftes pga vand"</p>
 <p>+1</p>			<p><b>M199: Væsentlig mangel tømrer</b> Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 12:44 Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Væsentlig mangel tømrer "Generel mangel. Døre, karme og gerigter mangler i mellembygningen"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Samlingsrum 0.64 Etage: E00</p>	 <p>E1 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M198: Loftplader</b> Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 12:38 Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Loftplader "Skade på loftsplade"</p>

Placering		Forløb
 <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">+2</p>	<p>Placering: Stue, syd</p>	<p><b>M197: Væsentlig mangel tømrer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 12:36</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Væsentlig mangel tømrer "Generel mangel. Der mangler indvendigedøre, karme og gerigter i syd stueetagen"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Finværksted 0.29B Etage: E00</p>	 <p><b>M196: Plet på loft</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 12:30</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Plet på loft "Plet på loftsplade"</p>
 <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">+1</p>	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E01</p>	 <p><b>M193: Mangel tømrer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 12:23</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Mangel tømrer "Generel mangel. Skrammer i døre og karme dækkes med egnet stift fra leverandøren"</p> <p>Opdateret af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 12:27</p>
 <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">+1</p>	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E01</p>	 <p><b>M195: Væsentlig mangel tømrer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 12:24</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Væsentlig mangel tømrer "Brandpastaen i karmen er forskellige fra side til anden. Er dette godkendt?"</p>

Placering		Forløb	
			<p><b>M191: Mangel tømrer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 12:20</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s</p> <p>Emne: Mangel tømrer</p> <p>"Skramme i karmen"</p>
			<p><b>M190: Loftskinne</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 12:20</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s</p> <p>Emne: Loftskinne</p> <p>"Loftskinne hænger"</p>
			<p><b>M187: Væsentlig mangel tømrer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 12:14</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s</p> <p>Emne: Mangel tømrer</p> <p>"Døre, karme mv mangler monteret"</p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 12:16</p> <p>Titel ændret: Væsentlig mangel tømrer</p>

Placering		Forløb	
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E01</p>	 <p>1.40 UU Vej.</p>	<p><b>M188: Væsentlig mangel</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 12:16</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Væsentlig mangel "Abdl mangler montage og overlevering til el"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E01</p>	 <p>1.41 Formidling 37 m<sup>2</sup></p> <p>1.43 Rengøring 8 m<sup>2</sup></p> <p>kt. 13.000</p> <p>1.45 Gruppe/Res 100 m</p>	<p><b>M186: Mangel tømrer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 12:13</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Mangel tømrer "Brandpastaen er brudt."</p>
	<p>Placering: Generelt</p>		<p><b>M184: Mangel tømrer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 12:10</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Mangel tømrer "Må karme fastgøres i brandpastaen? Dokumentation fremsendes"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Basislokale 1.36 Etage: E01</p>	 <p>1.36 Basislokale 65 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M182: Plet på loft</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 12:04</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Plet på loft "Loftplade skiftes, rød plet på loftet"</p>




Placering		Forløb
		<p><b>M178: Mangel tømrer</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 11:21</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Mangel tømrer</p> <p>Opdateret af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 11:21</p>
<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Gruppe/Research 1.45 Etage: E01</p>		
		<p><b>M177: Loftplader</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 11:12</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Loftplader "Generelt mangler der enkelte loftplader at blive lagt på plads i hele bygningen"</p>
<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Basislokale 0.43 Etage: E00</p>		
		<p><b>M174: Montering af træbeton</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 11:05</p> <p>Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s Emne: Montering af træbeton "Der mangler en monterings vejledning fra Trottekt ang de klodser der er brugt ved alle skinner"</p>
<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: SFO lokale 0.42 Etage: E00</p>		

## Placering



Bygning: Ny Skole i Skærbæk  
Rum: AKT 0.05  
Etage: E00

## Forløb



### M81: Udsiftingning loftsplade

Tildelt af: Aron Jørgensen, Tønder Kommune, 7. dec 2020, 13:36

Tildelt: Henning Skriver, kraftman a/s  
Emne: Udsiftingning loftsplade

5898794#0 - Afleveringsprotokol - Sendt til gule

**Fra:** Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]  
**Til:** 'Lars Høi (lh@garant.nu)' [lh@garant.nu]  
**Sendt dato:** 16-12-2020 14:46  
**Modtaget Dato:** 16-12-2020 14:46  
**Vedrørende:** SSK - Afleveringsprotokol  
**Vedhæftninger:** Afleveringsprotokol - Entr. F Garant Haderslev.pdf  
Bilag 1. Mangelliste - Garant Haderslev.pdf

---

Hej Lars

Her er afleveringsprotokol med bilag. Vil du underskrive og sende retur.

Venlig hilsen

**Sune Bundesen**  
Bygningskonsulent  
Ejendomme  
Teknik & Plan

-----  
**Tønder Kommune**

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder  
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk



OL\_Logo



## Afleveringsprotokol

<b>Projekttitel</b>	<b>Skærbæk - Ny Skole</b> Skolegade 19. 6780 Skærbæk	
<b>Entreprise</b>	<b>Gulv entreprisen</b>	
<b>Bygherre</b>	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder	
<b>Entreprenør</b>	<b>Garant Gulve og Gardiner Haderslev A/S</b> <b>Christian X's Vej 6C</b> <b>6100 Haderslev</b> <b>CVR-Nr.: 21500135</b>	
<b>Afleveringstidspunkt</b>	Den <b>15.12.2020</b> er der foretaget aflevering af ovennævnte entreprise.	
<b>Deltagere i afleveringsforretning</b>	For bygherre:  Kim Kirkegaard Sørensen Wegners Plads 2 6270 Tønder  For entreprenør:  Lars Høi	
<b>Omfang</b>	<table border="1"> <tr> <td> <p>Entreprisens omfang fremgår af følgende dokumenter:</p> <p>Entreprisekontrakt underskrevet af bygherre d. 14.08.2020 samt, Ekstra arbejde mm. I henhold til aftalesedler 1 - 5</p> </td> </tr> </table>	<p>Entreprisens omfang fremgår af følgende dokumenter:</p> <p>Entreprisekontrakt underskrevet af bygherre d. 14.08.2020 samt, Ekstra arbejde mm. I henhold til aftalesedler 1 - 5</p>
<p>Entreprisens omfang fremgår af følgende dokumenter:</p> <p>Entreprisekontrakt underskrevet af bygherre d. 14.08.2020 samt, Ekstra arbejde mm. I henhold til aftalesedler 1 - 5</p>		
<b>Mangler</b>	<table border="1"> <tr> <td> <p>Arbejdet er afleveret med de fejl og mangler, der fremgår af mangelliste dateret:</p> <p>I henhold til Bilag 1. – Dalux</p> </td> </tr> </table>	<p>Arbejdet er afleveret med de fejl og mangler, der fremgår af mangelliste dateret:</p> <p>I henhold til Bilag 1. – Dalux</p>
<p>Arbejdet er afleveret med de fejl og mangler, der fremgår af mangelliste dateret:</p> <p>I henhold til Bilag 1. – Dalux</p>		

**Afhjælpning**

Afhjulpne fejl og mangler dokumenteres gennem entreprenørens underskrift på mangellister.

De oplyste mangler iht. overstående punkt afhjælpes senest:

Generelle mangler – d. 8.1.2021

Øvrige mangler jf. dalux m. anden afhjælpningsdato end generelle mangler.:

Måtte ved hovedindgang – 19.2.2021

Gulv i nedsunken trappe – 15.1.2021

Gulvskinner – 15.1.2021

**Økonomi**

Entreprenør fremsender stadeopgørelse på arbejde frem til aflevering.

**Bemærkninger**

Bygherre:

Entreprenør:

**Arbejdet anses for afleveret** Ja  Nej

**Er kvalitetssikringsmappen afleveret** Ja  Nej

**Ansvarsperiode** Ansvarsperioden er i henhold til AB 92, 5 år og løber herefter til den: **15.12.2020**

**Eftersyn** 1 års eftersyn skal udføres inden den: **14.12.2021**

5 års eftersyn skal udføres inden den: **14.11.2025**

**Garanti:** Indtil afhjælpning af overstående fejl og mangler er udført og godkendt, tilbageholdes kr. 415.590 ekskl. moms. Entreprenøren har stillet en garanti på 15% af den oprindelig entreprisum ekskl. moms.

Sikkerhedsstillelsen, kan først nedskrives til 10% af entreprisummen, når bygherre har godkendt mangelahjælpningen.










**Underskrift:**

For bygherre: Kim Kirkegaard Sørensen

\_\_\_\_\_  
Dato/Underskrift

For entreprenør:


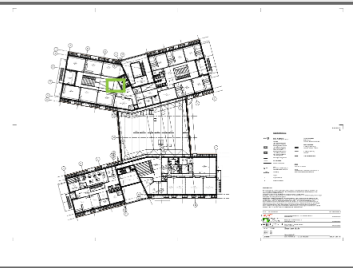


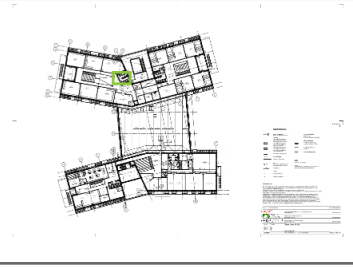




\_\_\_\_\_  
Dato/Underskrift


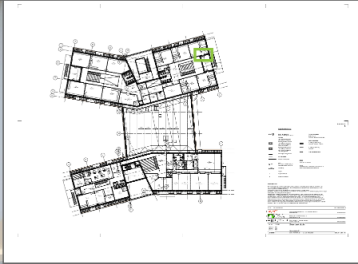





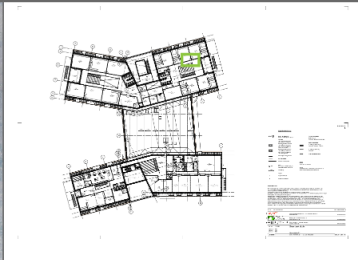

Placering		Forløb	
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E01</p>	 <p>1.41 Formidling 37 m<sup>2</sup></p> <p>1.43 Rengøring 8 m<sup>2</sup></p> <p>1.45 Gruppe/Res 100 m<sup>2</sup></p> <p>kt. 13.000</p>	<p><b>M100: Mangler gulvskinner</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 8. dec 2020, 12:10</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Mangler gulvskinner "Der mangler generelt gulvskinner ved døre" ... 1 mere</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 14:21</p> <p>Ny ansvarlig: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S</p> <p>Opdateret af: Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune, 16. dec 2020, 11:44</p> <p>"Følgende er aftalt: Montering afventer tilbage melding fra Brand og Redning. Iht. gulvskinnes tykkelse."</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Hjemområde - Mellemintrin 1.16 Etage: E01</p>	 <p>1.16 Mellemintrin 35 m<sup>2</sup></p> <p>kt. 13.000</p>	<p><b>M42: Støvsugning og afdækning</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 7. dec 2020, 11:42</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Støvsugning og afdækning "Der mangler støvsugning og afdækning skal fjernes."</p> <p>Opdateret af: Lars Høi, Garant Haderslev A/S, 9. dec 2020, 17:06</p> <p>"Hvornår ønsker i det? Aftalen var, at det skulle være efter aflevering....?"</p> <p>Opdateret af: Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune, 16. dec 2020, 10:44</p> <p>"Følgende er aftalt: Støvsugning og afdækning udføres sidst i uge 2. 2021."</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E01</p>	 <p>1.36 Basislokale 65 m<sup>2</sup></p> <p>64 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M301: Gulvbelægning buler</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 11. dec 2020, 11:42</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Gulvbelægning buler "Gulvbelægning buler ved dør mellem 2 basislokaler" ... 1 mere</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 14:28</p> <p>Ny ansvarlig: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S</p> <p>Opdateret af: Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune, 16. dec 2020, 10:17</p> <p>"Følgende er aftalt: Buler i belægningen afventer til uge 7. Lars Høi melder at der muligvis kommer flere buler, omfanget registreres i uge 7."</p>




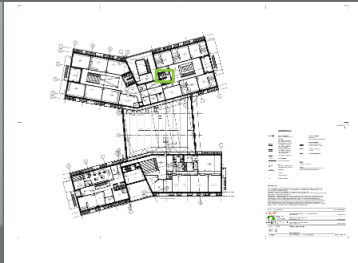
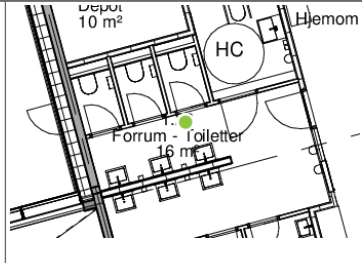

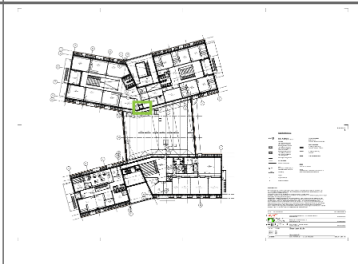
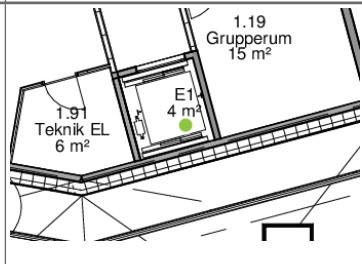
Placering		Forløb	
		 <p>1.58 Gruppe/Re 98 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M135: Mangler gulvbelægning</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 8. dec 2020, 14:36</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Mangler gulvbelægning "Mangler gulvbelægning omkring trappe"</p> <p>Afvist af: Lars Høi, Garant Haderslev A/S, 9. dec 2020, 16:46</p> <p>Ny ansvarlig: Sune Bundesen, Tønder Kommune "Ikke en mangel, men ekstra arbejde"</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 14:22</p> <p>Ny ansvarlig: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S</p>
		 <p>0.63 Musik 81 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M107: Mangler gulvbelægning</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 8. dec 2020, 12:21</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Mangler gulvbelægning "Mangler gulvbelægning i musik"</p> <p>Afvist af: Lars Høi, Garant Haderslev A/S, 9. dec 2020, 16:48</p> <p>Ny ansvarlig: Sune Bundesen, Tønder Kommune "Ikke en mangel i entreprisen Arbejdet er ekstra arbejde"</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 14:22</p> <p>Ny ansvarlig: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S</p>
		 <p>kt. 8,280</p>	<p><b>M105: Mangler gulvbelægning</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 8. dec 2020, 12:20</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Mangler gulvbelægning "Mangler gulvbelægning i trapeområde"</p> <p>Afvist af: Lars Høi, Garant Haderslev A/S, 9. dec 2020, 16:58</p> <p>Ny ansvarlig: Sune Bundesen, Tønder Kommune "Der mangler dilatationsskine, så vi kan lave vores arbejde. Og som der ses på billedet er området ikke ryddet."</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 14:22</p> <p>Ny ansvarlig: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S</p>

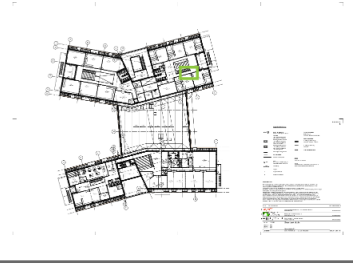

Placering		Forløb	
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Samlingsrum 0.64 Etage: E00</p>	 <p>Ovenlys 0.64 Samlingsrum 519 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M104: Mangler gulvbelægning</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 8. dec 2020, 12:19 Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Mangler gulvbelægning "Mangler gulvbelægning i samlingsrum" ... 1 mere</p> <p>Klarmeldt af: Lars Høi, Garant Haderslev A/S, 14. dec 2020, 07:31 Ny ansvarlig: Sune Bundesen, Tønder Kommune</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 14:21 Ny ansvarlig: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Gruppe/Research 1.45 Etage: E01</p>	 <p>1.48 Research 14 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M99: Mangler gulvbelægning</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 8. dec 2020, 12:09 Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Mangler gulvbelægning "Mangler gulvbelægning omkring trappe"</p> <p>Afvist af: Lars Høi, Garant Haderslev A/S, 9. dec 2020, 17:03 Ny ansvarlig: Sune Bundesen, Tønder Kommune "Ikke en mangel, men ekstra arbejde"</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 14:21 Ny ansvarlig: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Forrum - Toiletter 1.08 Etage: E01</p>	 <p>Forrum - Toiletter 13 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M39: Mangler svejsning</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 7. dec 2020, 11:40 Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Mangler svejsning "Der mangler svejsning af gulvbelægning i toiletrum."</p> <p>Klarmeldt af: Lars Høi, Garant Haderslev A/S, 9. dec 2020, 17:06 Ny ansvarlig: Sune Bundesen, Tønder Kommune</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 14:17 Ny ansvarlig: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S</p>

Placering		Forløb	
			<p><b>M34: Mangler gulvbelægning</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 7. dec 2020, 11:31</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Mangler gulvbelægning "Der mangler gulvbelægning omkring trappe"</p> <p>Afvist af: Lars Høi, Garant Haderslev A/S, 8. dec 2020, 07:38</p> <p>Ny ansvarlig: Sune Bundesen, Tønder Kommune "Det er ikke en mangel, men ekstra arbejde"</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 14:17</p> <p>Ny ansvarlig: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S</p>
			<p><b>M32: Manglende fodlister</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 7. dec 2020, 11:30</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Manglende fodlister "Der mangler fodlister i toilettrum"</p> <p>... 1 mere</p> <p>Afvist af: Lars Høi, Garant Haderslev A/S, 8. dec 2020, 07:37</p> <p>Ny ansvarlig: Sune Bundesen, Tønder Kommune "Det er ikke klar til os"</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 14:17</p> <p>Ny ansvarlig: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S</p>
			<p><b>M17: Mangler gulvbelægning</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 7. dec 2020, 11:16</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Mangler gulvbelægning "Gulvbelægning mangler omkring trappe."</p> <p>Afvist af: Lars Høi, Garant Haderslev A/S, 9. dec 2020, 17:10</p> <p>Ny ansvarlig: Sune Bundesen, Tønder Kommune "Ikke en mangel, men ekstra arbejde"</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 14:15</p> <p>Ny ansvarlig: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S</p>

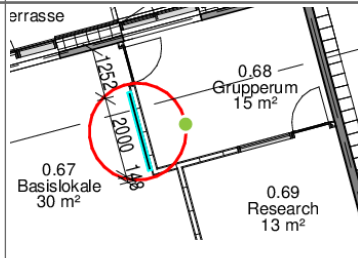Placering		Forløb			
			<p><b>M318: Mangler gulvbelægning</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 13:25</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S</p> <p>Emne: Mangler gulvbelægning</p> <p>"Der mangler gulvbelægning"</p>		
<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Basislokale 1.37 Etage: E01</p>	<p>Basislokale 64 m<sup>2</sup></p>				<p><b>M101: Mangler gulvskinner</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 8. dec 2020, 12:11</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S</p> <p>Emne: Mangler gulvskinner</p> <p>"Mangler generelt gulvskinner ved døre"</p> <p>Afvist af: Lars Høi, Garant Haderslev A/S, 9. dec 2020, 17:03</p> <p>Ny ansvarlig: Sune Bundesen, Tønder Kommune</p> <p>"Jeg mener ikke vi har nogen skinne med der."</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 12:14</p> <p>Ny ansvarlig: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S</p> <p>"Det er generelt skinner ved døre i stueplan."</p>
<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Grupperum 0.68 Etage: E00</p>	<p>Grupperum 15 m<sup>2</sup></p> <p>0.67 Basislokale 30 m<sup>2</sup></p> <p>0.69 Research 13 m<sup>2</sup></p>				<p><b>M302: Ridse i gulvbelægning</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 11. dec 2020, 11:45</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S</p> <p>Emne: Ridse i gulvbelægning</p> <p>"Ridse i gulvbelægning fra dørblad, da tømrer har glemt at fjerne masonit under dørbladet."</p>
<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Basislokale 1.36 Etage: E01</p>	<p>1.36 Basislokale 65 m<sup>2</sup></p>				

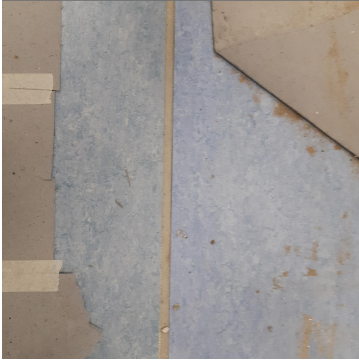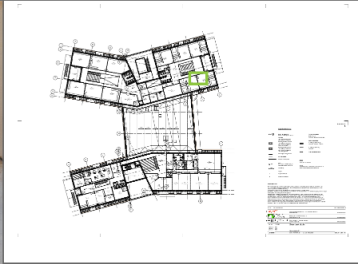Placering		Forløb	
		 <p>1.39 Basislokale</p> <p>1.38 Basislokale 64 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M20: Farveforskel</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 7. dec 2020, 11:21</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Farveforskel "Der er farveforskel på belægning i de 2 basislokaler og gangareal"</p> <p>Opdateret af: Lars Høi, Garant Haderslev A/S, 9. dec 2020, 17:10</p> <p>"Rummet er lavet væsentligt senere end de øvrige rum, da der ikke var klar til os. Vil udligne sig med tiden"</p>
		 <p>Depot 10 m<sup>2</sup></p> <p>Hjemom</p> <p>HC</p> <p>Forrum - toiletter 16 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M27: Mangler fodlister</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 7. dec 2020, 11:27</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Mangler fodlister "Der mangler fodlister i toilettrum"</p> <p>Opdateret af: Lars Høi, Garant Haderslev A/S, 9. dec 2020, 17:08</p> <p>"Vi afventer, at der er styr på væggen ."</p>
		 <p>1.19 Grupperum 15 m<sup>2</sup></p> <p>1.91 Teknik EL 6 m<sup>2</sup></p> <p>E1 4 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M30: Mangler gulvbelægning</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 7. dec 2020, 11:29</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Mangler gulvbelægning "Der mangler gulvbelægning i elevator."</p> <p>Opdateret af: Lars Høi, Garant Haderslev A/S, 9. dec 2020, 17:07</p> <p>"Kræver at vi kan komme ind i elevatoren."</p>

Placering		Forløb	
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: E2 0.127 Etage: E00</p>		<p><b>M106: Mangler gulvbelægning</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 8. dec 2020, 12:20</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Mangler gulvbelægning "Mangler gulvbelægning i elevator"</p> <p>Opdateret af: Lars Høi, Garant Haderslev A/S, 9. dec 2020, 16:57 "Så kræver det at døren bliver åbnet....."</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: PLC Base 0.54 Etage: E00</p>	 <p>0.54 PLC Base 35 m<sup>2</sup></p> <p>0.55 Mediatek / Udlån 18 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M108: Mangler gulvbelægning</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 8. dec 2020, 12:22</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Mangler gulvbelægning "Mangler gulvbelægning i plc"</p> <p>Opdateret af: Lars Høi, Garant Haderslev A/S, 9. dec 2020, 16:46 "Skyldes at området ikke var klar iht. tidsplan"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E01</p>		<p><b>M211: Mangler gulvbelægning</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 13:13</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Mangler gulvbelægning "Mangler gulvbelægning ved lysning"</p>

Placering		Forløb	
			<p><b>M103: Mangler gulvbelægning</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 8. dec 2020, 12:18</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S</p> <p>Emne: Mangler gulvbelægning "Mangler gulvbelægning i toiletrum"</p>
<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Toi. forrum 0.88 Etage: E00</p>			<p><b>M102: Mangler gulvbelægning</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 8. dec 2020, 12:18</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S</p> <p>Emne: Mangler gulvbelægning "Mangler gulvbelægning i gangareal"</p>
	<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Fordeling 0.90 Etage: E00</p>		<p><b>M96: Mangler gulvbelægning</b></p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune, 8. dec 2020, 12:02</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S</p> <p>Emne: Mangler gulvbelægning "Der mangler gulvbelægning i depot ved grovværksted"</p>
		<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Depot 0.27 Etage: E00</p>	

5898825#0 - Afleveringsprotokol - Sendt til Mads Vejrup

**Fra:** Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]  
**Til:** 'Torben Rasmussen (torben@madsvejrup.dk)' [torben@madsvejrup.dk]  
**Sendt dato:** 16-12-2020 15:03  
**Modtaget Dato:** 16-12-2020 15:03  
**Vedrørende:** SSK - Afleveringsprotokol  
**Vedhæftninger:** Afleveringsprotokol Entr. M Mads Vejrup.pdf  
Bilag 1. Mangelliste - Mads Vejrup.pdf

---

Hej Torben

Her er afleveringsprotokol med bilag. Vil du underskrive og sende retur.

Venlig hilsen

**Sune Bundesen**  
Bygningskonsulent  
Ejendomme  
Teknik & Plan

---

**Tønder Kommune**  
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder  
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk



OL\_Logo



## Afleveringsprotokol

<b>Projekttitle</b>	<b>Skærbæk - Ny Skole</b> Skolegade 19. 6780 Skærbæk
<b>Entreprise</b>	<b>Gartner og belægning entreprisen</b>
<b>Bygherre</b>	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
<b>Entreprenør</b>	<b>Vognmand og Entreprenør Mads Vejrup A/S</b> Algade 70 6780 Skærbæk CVR: 32271138
<b>Afleveringstidspunkt</b>	Den <b>15.12.2020</b> er der foretaget aflevering af ovennævnte entreprise.
<b>Deltagere i afleveringsforretning</b>	For bygherre:  Kim Kirkegaard Sørensen Wegners Plads 2 6270 Tønder  Aron Jørgensen Wegners Plads 2 6270 Tønder  For entreprenør:  Mads Vejrup
<b>Omfang</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Entreprisens omfang fremgår af følgende dokumenter:</p><p>Entreprisekontrakt underskrevet af bygherre d. 05.06.2019 samt, Ekstra arbejde mm. I henhold til aftalesedler ME 1 - 04</p></div>
<b>Mangler</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Arbejdet er afleveret med de fejl og mangler, der fremgår af mangelliste dateret:</p><p>I henhold til Bilag 1. – Dalux</p></div>



**Afhjælpning**

Afhjulpne fejl og mangler dokumenteres gennem entreprenørens underskrift på mangellister.

De oplyste mangler iht. overstående punkt afhjælpes senest:

Generelle mangler – d. 8.1.2021

Øvrige mangler jf. dalux m. anden afhjælpningsdato end generelle mangler.:

Særlige konstruktioner, Inventar, træarbejde og belægning – 12.2.2021

Planter, asfalt og afmærkning i termoplast – april 2021

**Økonomi**

Entreprenør fremsender studeopgørelse på arbejde frem til aflevering.

**Bemærkninger**

Bygherre:

Entreprenør:

**Arbejdet anses for afleveret** Ja  Nej

**Er kvalitetssikringsmappen afleveret** Ja  Nej

**Ansvarsperiode** Ansvarsperioden er i henhold til AB 92, 5 år og løber herefter til den: **15.12.2020**

**Eftersyn** 1 års eftersyn skal udføres inden den: **14.12.2021**

5 års eftersyn skal udføres inden den: **14.11.2025**

**Garanti:** Indtil afhjælpning af overstående fejl og mangler er udført og godkendt, tilbageholdes kr. 524.971 ekskl. moms. Entreprenøren har stillet en garanti på 15% af den oprindelig entreprisum ekskl. moms.

Sikkerhedsstillelsen, garanti nr. 6432513/1 dateret d. 08.09.2019, kan først nedskrives til 10% af entreprisummen, når bygherre har godkendt mangelahjælpningen

**Underskrift:**

For bygherre: Kim Kirkegaard Sørensen

\_\_\_\_\_

Dato/Underskrift

For entreprenør:




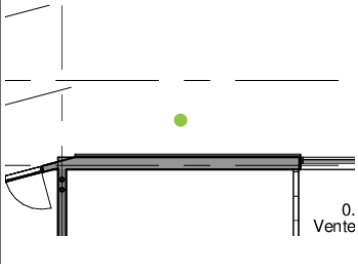




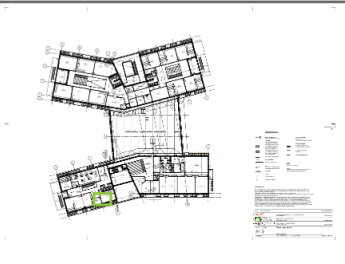
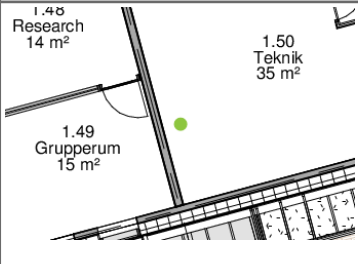
\_\_\_\_\_


Dato/Underskrift

Placering		Forløb
		<p><b>M316: Gartnararbejder: Planter i terræn</b></p> <p>Tildelt af: <a href="#">Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 11:55</a></p> <p>Tildelt: Mads Vejrup, Entreprenør Mads Vejrup A/S</p> <p>Emne: Gartnararbejder: Planter i terræn "Der mangler planter i terræn."</p> <p>Opdateret af: <a href="#">Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune, 16. dec 2020, 13:56</a></p> <p>"Følgende er aftalt. Planter i terræn udføres løbende, afleveringsfrist april 2021."</p>
		<p><b>M315: Anlægsarbejder: Særlige konstruktioner</b></p> <p>Tildelt af: <a href="#">Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 11:52</a></p> <p>Tildelt: Mads Vejrup, Entreprenør Mads Vejrup A/S</p> <p>Emne: Anlægsarbejder: Særlige konstruktioner "Der mangler science tribune, krea tribune, affaldsskur, Koldt lager, mooncarskur."</p>
		<p><b>M314: Anlægsarbejder: Afmærkningsarbejder i termoplast</b></p> <p>Tildelt af: <a href="#">Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 11:50</a></p> <p>Tildelt: Mads Vejrup, Entreprenør Mads Vejrup A/S</p> <p>Emne: Anlægsarbejder: Afmærkningsarbejder i termoplast "Der mangler opmærkning / opstregning"</p>
		<p><b>M309: Anlægsarbejder: Inventar, udstyr mv.</b></p> <p>Tildelt af: <a href="#">Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 11:00</a></p> <p>Tildelt: Mads Vejrup, Entreprenør Mads Vejrup A/S</p> <p>Emne: Anlægsarbejder: Inventar, udstyr mv. "Der mangler skilte, legeredskaber, trædesten."</p>
		<p><b>M308: Anlægsarbejder: Træarbejder</b></p> <p>Tildelt af: <a href="#">Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 10:37</a></p> <p>Tildelt: Mads Vejrup, Entreprenør Mads Vejrup A/S</p> <p>Emne: Anlægsarbejder: Træarbejder "Der mangler siddestube, siddeplinte samt boardwalk"</p>

Placering		Forløb
		<p><b>M307: Anlægsarbejder: Belægning</b></p> <p><u>Tildelt af: Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 10:35</u></p> <p>Tildelt: Mads Vejrup, Entreprenør Mads Vejrup A/S</p> <p>Emne: Anlægsarbejder: Belægning</p> <p>"Der mangler belægning rundt om bygningen"</p>
		<p><b>M306: Anlægsarbejder: Asfaltarbejder</b></p> <p><u>Tildelt af: Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune, 14. dec 2020, 10:34</u></p> <p>Tildelt: Mads Vejrup, Entreprenør Mads Vejrup A/S</p> <p>Emne: Anlægsarbejder: Asfaltarbejder</p> <p>"Der mangler asfalt på stier og brandvej"</p>

Igangværende • Type: Mangel • Ansvarlig: Daniel Madsen, GK Danmark

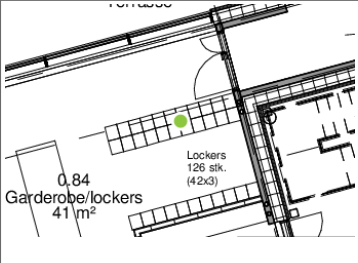Placering		Forløb	
			<p><b>M176: Generel ventilation</b></p> <p>Tildelt af: Aron Jørgensen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 11:12</p> <p>Tildelt: Daniel Madsen, GK Danmark</p> <p>Emne: Generel ventilation</p> <p>"Genmontering af loft og lamper hvor i har demonteret"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk                      Rum: Samlingsrum 0.64                      Etage: E00</p>	 <p>0.                      Vente</p>	<p><b>M172: Mangel ventilation</b></p> <p>Tildelt af: Aron Jørgensen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 11:02</p> <p>Tildelt: Daniel Madsen, GK Danmark</p> <p>Emne: Mangel ventilation</p> <p>"Maling af kanal og blaffer"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk                      Rum: Garderobe/lockers 0.84                      Etage: E00</p>	 <p>0.84                      Garderobe/lockers                      41 m<sup>2</sup></p> <p>Lockers                      126 stk.                      (42x3)</p>	<p><b>M156: Mangel, armatur</b></p> <p>Tildelt af: Aron Jørgensen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 09:28</p> <p>Tildelt: Daniel Madsen, GK Danmark</p> <p>Emne: Mangel, armatur</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk                      Rum: Teknik 1.50                      Etage: E01</p>	 <p>1.48                      Research                      14 m<sup>2</sup></p> <p>1.50                      Teknik                      35 m<sup>2</sup></p> <p>1.49                      Grupperum                      15 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M150: Mangler lukning af huller</b></p> <p>Tildelt af: Aron Jørgensen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 08:19</p> <p>Tildelt: Daniel Madsen, GK Danmark</p> <p>Emne: Mangler lukning af huller</p>

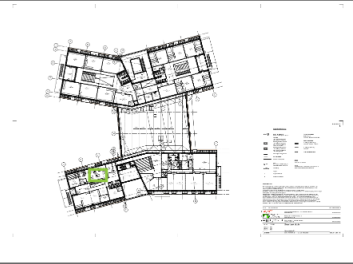Placering		Forløb	
		 <p>1.44 Science lab 80 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M147: Mangler udsugning</b></p> <p>Tildelt af: Aron Jørgensen, Tønder Kommune, 9. dec 2020, 07:33</p> <p>Tildelt: Daniel Madsen, GK Danmark Emne: Mangler udsugning "Udsugningsløsning over borde og kateter"</p>
<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Science lab 1.44 Etage: E01</p>		 <p>28 m<sup>2</sup></p> <p>1.22 Teknik - Ventilation 49 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M15: Manglende fuger</b></p> <p>Tildelt af: Aron Jørgensen, Tønder Kommune, 7. dec 2020, 10:08</p> <p>Tildelt: Daniel Madsen, GK Danmark Emne: Manglende fuger "Manglende fuger ved rørgennemføring i loft."</p>
		 <p>0.113 Kontor (Sekr.) 13 m<sup>2</sup></p> <p>0.114 Kontor (S 15 m<sup>2</sup></p>	<p><b>M14: Oprydning</b></p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune, 27. nov 2020, 12:43</p> <p>Tildelt: Daniel Madsen, GK Danmark Emne: Oprydning "Der skal ryddes op når man forlader området."</p>
	<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Kontor (Sekr.) 0.113 Etage: E00</p>		

5900042#0 - SV:SSK - Opfølgning på byggemøde, Branddøre ABDL

**Fra:** Morten Bramstrup Jakobsen [mailto:TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]  
**Til:** 'Christensen Thomas (Bravida)' [t.christensen@bravida.dk]  
**Cc:** Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]; flemming.kjems@bravida.dk [flemming.kjems@bravida.dk]  
**Sendt dato:** 17-12-2020 11:14  
**Modtaget Dato:** 17-12-2020 11:14  
**Vedrørende:** SV: SSK - Opfølgning på byggemøde, Branddøre ABDL  
**Vedhæftninger:** image001\_2477.png  
image002\_2566.png  
image003\_2540.png  
image004\_2544.png  
image005\_2550.png  
image006\_1976.jpg

Hej Thomas.

Jeg har lige været hele kraftman rundt for at finde ud af, hvad der sker. Jesper er ikke til at få fat i, men de har fået dem leveret på pladsen. Jesper skulle være på telefonen fra kl 12. så ringer jeg til ham beder dem monter ASAP.

Venlig hilsen

**Morten Bramstrup Jakobsen**

Bygningskonsulent  
Ejendomme  
Teknik & Plan

**Tønder Kommune**

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder  
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



**Fra:** Christensen Thomas (Bravida) [mailto:t.christensen@bravida.dk]  
**Sendt:** 17. december 2020 09:05  
**Til:** Morten Bramstrup Jakobsen  
**Cc:** Kim Kirkegaard Sørensen; Sune Bundesen; Kjems Flemming (Bravida)  
**Emne:** SV: SSK - Opfølgning på byggemøde, Branddøre ABDL

Hej Morten

Vi har stadig ingen ABDL skinner på nogle dørene i bygningen.

Det skal i gang siddes nu da vi kun har i dag og til kl 12 i morgen til det!

Jeg vil gerne have en tilbagemelding.

**Med venlig hilsen**  
**Bravida Danmark A/S**

**Thomas Christensen**  
Projektleder

Mobil 2525 3435  
E-mail [t.christensen@bravida.dk](mailto:t.christensen@bravida.dk)

Bravida Danmark A/S  
Jernet 4F  
6000 Kolding  
Bravida - vi kan el, vvs og ventilation  
[www.bravida.dk](http://www.bravida.dk)

**Fra:** Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>  
**Sendt:** 8. december 2020 14:57  
**Til:** 'Henning Skriver' <hs@kraftman.dk>; 'Esben Jessen' <beregner@kraftman.dk>; 'jh@kraftman.dk' <jh@kraftman.dk>  
**Cc:** Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Christensen Thomas (Bravida) <t.christensen@bravida.dk>  
**Emne:** SSK - Opfølgning på byggemøde, Branddøre ABDL  
15354

Hej Henning og Esben.

Jeg nævnte lige for Jesper, at vi gerne skal monteret ABDL dagsdato.

Jesper siger de er bestilt sammen med cylinderne til uge 52, men kan givetvis fremskaffes til starte uge 51. Vi ønsker selvfølgelig de kommer indeværende uge eller hurtigst mulig. Er det noget i vil se på, så elektriker kan få det færdiggjort, det er på den kritiske vej trods alt.

På forhånd tak.

Venlig hilsen

**Morten Bramstrup Jakobsen**

Bygningskonsulent  
Ejendomme  
Teknik & Plan

---

**Tønder Kommune**

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail [mobj2@toender.dk](mailto:mobj2@toender.dk)



---

Bravida – vi giver bygninger liv

Bravida er Nordens førende leverandør af installations- og serviceydelser med cirka 11.700 medarbejdere, heraf omkring 2.000 i Danmark. Bravida udfører såvel specialopgaver som helhedsløsninger indenfor el, vs og ventilation og tilbyder alt fra design og projektering til installation, drift og vedligehold. Bravida har afdelinger på omkring 190 lokationer i Sverige, Norge, Danmark og Finland. [www.bravida.dk](http://www.bravida.dk)

Følg linket for at se Bravidas persondatapolitik [www.bravida.dk/om-bravida/persondatapolitik](http://www.bravida.dk/om-bravida/persondatapolitik)















## RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR  
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR  
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5900272#0 - SV SSK - Opfølgning på byggemøde, Branddøre ABDL

**Fra:** Morten Bramstrup Jakobsen [mailto:TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]  
**Til:** 'Christensen Thomas (Bravida)' [t.christensen@bravida.dk]; 'jh@kraftman.dk' [jh@kraftman.dk]; 'ts@kraftman.dk' [ts@kraftman.dk]  
**Cc:** Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]; 'Kjems Flemming (Bravida)' [flemming.kjems@bravida.dk]; 'Henning Skriver' [hs@kraftman.dk]  
**Sendt dato:** 17-12-2020 11:49  
**Modtaget Dato:** 17-12-2020 11:49  
**Vedrørende:** SV: SSK - Opfølgning på byggemøde, Branddøre ABDL  
**Vedhæftninger:** image001\_2497.png  
image002\_2589.png  
image003\_2560.png  
image004\_2566.png  
image005\_2571.png  
image006\_1992.jpg

Hej Jesper.

Vil du sørge for ABDL skinner er det første i monterer i morgen. Det er kritisk, at arbejdet overdrages til Bravida hurtigst mulig. Bravida vil færdigmonter inden kl 12.00 i morgen.

Venlig hilsen

**Morten Bramstrup Jakobsen**  
Bygningskonsulent  
Ejendomme  
Teknik & Plan

**Tønder Kommune**

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder  
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



**Fra:** Christensen Thomas (Bravida) [mailto:t.christensen@bravida.dk]  
**Sendt:** 17. december 2020 09:05  
**Til:** Morten Bramstrup Jakobsen  
**Cc:** Kim Kirkegaard Sørensen; Sune Bundesen; Kjems Flemming (Bravida)  
**Emne:** SV: SSK - Opfølgning på byggemøde, Branddøre ABDL

Hej Morten

Vi har stadig ingen ABDL skinner på nogle dørene i bygningen.

Det skal i gang siddes nu da vi kun har i dag og til kl 12 i morgen til det!

Jeg vil gerne have en tilbagemelding.

**Med venlig hilsen**  
**Bravida Danmark A/S**

**Thomas Christensen**  
Projektleder

Mobil 2525 3435  
E-mail [t.christensen@bravida.dk](mailto:t.christensen@bravida.dk)

Bravida Danmark A/S  
Jernet 4F  
6000 Kolding  
Bravida - vi kan el, vvs og ventilation  
[www.bravida.dk](http://www.bravida.dk)

**Fra:** Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>  
**Sendt:** 8. december 2020 14:57  
**Til:** 'Henning Skriver' <hs@kraftman.dk>; 'Esben Jessen' <beregner@kraftman.dk>; 'jh@kraftman.dk' <jh@kraftman.dk>  
**Cc:** Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Christensen Thomas (Bravida)

<t.christensen@bravida.dk>

**Emne:** SSK - Opfølgning på byggemøde, Branddøre ABDL

Hej Henning og Esben.

Jeg nævnte lige for Jesper, at vi gerne skal monteret ABDL dagsdato.

Jesper siger de er bestilt sammen med cylinderne til uge 52, men kan givetvis fremskaffes til starte uge 51. Vi ønsker selvfølgelig de kommer indeværende uge eller hurtigst mulig. Er det noget i vil se på, så elektriker kan få det færdiggjort, det er på den kritiske vej trods alt.

På forhånd tak.

Venlig hilsen

**Morten Bramstrup Jakobsen**

Bygningskonsulent

Ejendomme

Teknik & Plan

---

**Tønder Kommune**

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail [mobj2@toender.dk](mailto:mobj2@toender.dk)



---

Bravida – vi giver bygninger liv

Bravida er Nordens førende leverandør af installations- og serviceydelser med cirka 11.700 medarbejdere, heraf omkring 2.000 i Danmark. Bravida udfører såvel specialopgaver som helheds løsninger indenfor el, vvs og ventilation og tilbyder alt fra design og projektering til installation, drift og vedligehold. Bravida har afdelinger på omkring 190 lokationer i Sverige, Norge, Danmark og Finland. [www.bravida.dk](http://www.bravida.dk)

Følg linket for at se Bravidas persondatapolitik: [www.bravida.dk/om-bravida/persondatapolitik](http://www.bravida.dk/om-bravida/persondatapolitik)















## RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR  
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR  
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5901541#0 - SSK - Afleveringsprotokoler

**Fra:** Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]  
**Til:** 'Christensen Thomas (Bravida)' [t.christensen@bravida.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]; 'flemming.kjems@bravida.dk' [flemming.kjems@bravida.dk]  
**Sendt dato:** 17-12-2020 15:01  
**Modtaget Dato:** 17-12-2020 15:01  
**Vedrørende:** SSK - Afleveringsprotokoler  
**Vedhæftninger:** Afleveringsprotokol - Entr. H Bravida.pdf  
Afleveringsprotokol - Entr. I Bravida.pdf  
Afleveringsprotokol - Entr. L Bravida.pdf  
image001\_2647.png  
image002\_2734.png  
image003\_2700.png  
image004\_2716.png  
image005\_2704.png  
image006\_2083.jpg

---

Hej Thomas.

Hermed med flyttet kryds.

Venlig hilsen

**Morten Bramstrup Jakobsen**

Bygningskonsulent  
Ejendomme  
Teknik & Plan

---

**Tønder Kommune**

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder  
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



## Afleveringsprotokol

<b>Projekttitlel</b>	<b>Skærbæk - Ny Skole</b> Skolegade 19. 6780 Skærbæk
<b>Entreprise</b>	<b>El entreprisen</b>
<b>Bygherre</b>	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
<b>Entreprenør</b>	<b>Bravida Danmark A/S</b> Svendborgvej 226 5260 Odense S CVR-nr.: 14769005
<b>Afleveringstidspunkt</b>	Den <b>15.12.2020</b> er der foretaget aflevering af ovennævnte entreprise.
<b>Deltagere i afleveringsforretning</b>	For bygherre:  Aron Jørgensen Wegners Plads 2 6270 Tønder  For entreprenør:  Thomas Christensen
<b>Omfang</b>	Entreprisens omfang fremgår af følgende dokumenter:  Entreprisekontrakt underskrevet af bygherre d. 30.04.2019 samt, Ekstra arbejde mm. I henhold til aftalesedler 1 - 28
<b>Mangler</b>	Arbejdet er afleveret med de fejl og mangler, der fremgår af mangelliste dateret:  I henhold til Bilag 1. – Dalux



**Afhjælpning**

Afhjulpne fejl og mangler dokumenteres gennem entreprenørens underskrift på mangellister.

De oplyste mangler iht. overstående punkt afhjælpes senest:

Generelle mangler – d. 08.01.2021

Øvrige mangler jf. dalux m. anden afhjælpningsdato end generelle mangler.:

DBI rapport – 5.2.2021

Udvendige mangler – 5.2.2021

**Økonomi**

Entreprenør fremsender stadeopgørelse på arbejde frem til aflevering.

**Bemærkninger**

Bygherre:

Entreprenør:

**Arbejdet anses for afleveret** Ja  Nej

**Er kvalitetssikringsmappen afleveret** Ja  Nej

**Ansvarsperiode** Ansvarsperioden er i henhold til AB 92, 5 år og løber herefter til den: **15.12.2025**

**Eftersyn** 1 års eftersyn skal udføres inden den: **14.12.2021**

5 års eftersyn skal udføres inden den: **14.11.2025**

**Garanti:** Indtil afhjælpning af overstående fejl og mangler er udført og godkendt, tilbageholdes kr. 945.679 ekskl. moms. Entreprenøren har stillet en garanti på 15% af den oprindelig entreprisensum ekskl. moms.

Sikkerhedsstillelsen, garanti nr. B405639 dateret d. 01.05.2019, kan først nedskrives til 10% af entreprisensummen, når bygherre har godkendt mangelahjælperingen

**Underskrift:**

For bygherre: Aron Jørgensen.

\_\_\_\_\_  
Dato/Underskrift

For entreprenør:

\_\_\_\_\_  
Dato/Underskrift

## Afleveringsprotokol

<b>Projekttitle</b>	<b>Skærbæk - Ny Skole</b> Skolegade 19. 6780 Skærbæk
<b>Entreprise</b>	<b>Elevatorentreprisen</b>
<b>Bygherre</b>	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
<b>Entreprenør</b>	<b>Bravida Danmark A/S</b> Svendborgvej 226 5260 Odense S CVR-nr.: 14769005
<b>Afleveringstidspunkt</b>	Den <b>15.12.2020</b> er der foretaget aflevering af ovennævnte entreprise.
<b>Deltagere i afleveringsforretning</b>	For bygherre:  Aron Jørgensen Wegners Plads 2 6270 Tønder  For entreprenør:  Thomas Christensen
<b>Omfang</b>	Entreprisens omfang fremgår af følgende dokumenter:  Entreprisekontrakt underskrevet af bygherre d. 01.07.2020 samt, Ekstra arbejde mm. I henhold til aftalesedler 1 – 28 jf. EI-entreprisen
<b>Mangler</b>	Arbejdet er afleveret med de fejl og mangler, der fremgår af mangelliste dateret:  I henhold til Bilag 1. – Dalux

**Afhjælpning**

Afhjulpne fejl og mangler dokumenteres gennem entreprenørens underskrift på mangellister.

De oplyste mangler iht. overstående punkt afhjælpes senest:

Generelle mangler – d. 8.1.2021

Øvrige mangler jf. dalux m. anden afhjælpningsdato end generelle mangler.:

Godkendelse af elevatorer – 5.2.2021

**Økonomi**

Entreprenør fremsender studeopgørelse på arbejde frem til aflevering.

**Bemærkninger**

Bygherre:

Entreprenør:



**Arbejdet anses for afleveret** Ja  **Nej**

**Er kvalitetssikringsmappen afleveret** Ja  **Nej**

**Ansvarsperiode** Ansvarsperioden er i henhold til AB 92, 5 år og løber herefter til den: **15.12.2025**

**Eftersyn** 1 års eftersyn skal udføres inden den: **14.12.2021**

5 års eftersyn skal udføres inden den: **14.11.2025**

**Garanti:** Der er ikke stillet garanti i forbindelse med arbejdet. Tønder Kommune udbetaler slutbeløb på 10% ved færdiggørelse af arbejdet og dets mangler.

**Underskrift:**

For bygherre: Aron Jørgensen.

\_\_\_\_\_  
Dato/Underskrift

For entreprenør:

\_\_\_\_\_  
Dato/Underskrift

## Afleveringsprotokol

<b>Projekttitle</b>	<b>Skærbæk - Ny Skole</b> Skolegade 19. 6780 Skærbæk
<b>Entreprise</b>	<b>CTS entreprisen</b>
<b>Bygherre</b>	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
<b>Entreprenør</b>	<b>Bravida Danmark A/S</b> Svendborgvej 226 5260 Odense S CVR-nr.: 14769005
<b>Afleveringstidspunkt</b>	Den <b>15.12.2020</b> er der foretaget aflevering af ovennævnte entreprise.
<b>Deltagere i afleveringsforretning</b>	For bygherre:  Aron Jørgensen Wegners Plads 2 6270 Tønder  For entreprenør:  Thomas Christensen
<b>Omfang</b>	Entreprisens omfang fremgår af følgende dokumenter:  Entreprisekontrakt underskrevet af bygherre d. 30.04.2019 samt, Ekstra arbejde mm. I henhold til aftalesedler 1 – 3 jf. CTS-entreprisen.
<b>Mangler</b>	Arbejdet er afleveret med de fejl og mangler, der fremgår af mangelliste dateret:  I henhold til Bilag 1. – Dalux



**Afhjælpning**

Afhjulpne fejl og mangler dokumenteres gennem entreprenørens underskrift på mangellister.

De oplyste mangler iht. overstående punkt afhjælpes senest:

Generelle mangler – d. 15.01.2021

Øvrige mangler jf. dalux m. anden afhjælpningsdato end generelle mangler.:

Indregulering – 15.1.2021

**Økonomi**

Entreprenør fremsender stadeopgørelse på arbejde frem til aflevering.

**Bemærkninger**

Bygherre:

Entreprenør:

**Arbejdet anses for afleveret** Ja  Nej

**Er kvalitetssikringsmappen afleveret** Ja  Nej

**Ansvarsperiode** Ansvarsperioden er i henhold til AB 92, 5 år og løber herefter til den: **15.12.2025**

**Eftersyn** 1 års eftersyn skal udføres inden den: **14.12.2021**

5 års eftersyn skal udføres inden den: **14.11.2025**

**Garanti:** Indtil afhjælpning af overstående fejl og mangler er udført og godkendt, tilbageholdes kr. 367.137,75 ekskl. moms. Entreprenøren har stillet en garanti på 15% af den oprindelig entreprisensum ekskl. moms.

Sikkerhedsstillelsen, garanti nr. B405639 dateret d. 01.05.2019, kan først nedskrives til 10% af entreprisensummen, når bygherre har godkendt mangelahjælperingen

**Underskrift:**

For bygherre: Aron Jørgensen.

\_\_\_\_\_  
Dato/Underskrift

For entreprenør:

\_\_\_\_\_  
Dato/Underskrift















## RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR  
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR  
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5905550#0 - Mobile trapper - dokumentation på et de er til Tøn

**Fra:** Peder Graversen [pgr@st-skoleinventar.dk]  
**Til:** Sune Bundesen [sb32@toender.dk]  
**Cc:** Elna Schou Andersen [esa@st-skoleinventar.dk]  
**Sendt dato:** 18-12-2020 11:20  
**Modtaget Dato:** 18-12-2020 11:20  
**Vedrørende:** VS: Tønder  
**Vedhæftninger:** IMG\_20201218\_111219\_resized\_20201218\_111654982.jpg  
IMG\_20201218\_111225\_resized\_20201218\_111654188.jpg  
IMG\_20201218\_111232\_resized\_20201218\_111653267.jpg

---

Hej Sune

Hermed billede dokumentation på de mobil elementer. Den tilrettet stadeopgørelse vil blive fremsendt senere


Med venlig hilsen / Kind regards

Peder Graversen  
Projektleder / Project Manager  
ST Skoleinventar A/S

+45 3078 7030 Mobile  
-----Oprindelig meddelelse-----  
Fra: Hans Jørgen Andersen  
Sendt: 18. december 2020 11:17  
Til: Peder Graversen  
Emne: Tønder

Hans Jørgen Andersen

Sendt fra min Huawei Mobil

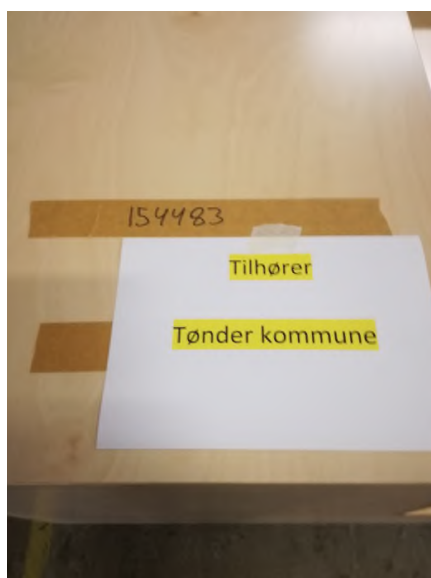



154483

Tilhører

Tønder kommune



Tilhører  
Tønder kommune

5906166#0 - Afleveringsprotokoller underskrevet Bravida  
**Fra:** Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]  
**Til:** 'Thomas Christensen (t.christensen@bravida.dk)' [t.christensen@bravida.dk]  
**Sendt dato:** 18-12-2020 12:34  
**Modtaget Dato:** 18-12-2020 12:34  
**Vedrørende:** SSK - Afleveringsprotokoller  
**Vedhæftninger:** SToePrt01420121809200.pdf

---

Hej Thomas

Her er protokollerne med vores underskrift.

Venlig hilsen

**Sune Bundesen**  
Bygningskonsulent  
Ejendomme  
Teknik & Plan

---

**Tønder Kommune**  
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder  
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk



OL\_Logo



## Afleveringsprotokol

<b>Projekttitel</b>	<b>Skærbæk - Ny Skole</b> Skolegade 19. 6780 Skærbæk
<b>Entreprise</b>	<b>El entreprisen</b>
<b>Bygherre</b>	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
<b>Entreprenør</b>	<b>Bravida Danmark A/S</b> Svendborgvej 226 5260 Odense S CVR-nr.: 14769005
<b>Afleveringstidspunkt</b>	Den <b>15.12.2020</b> er der foretaget aflevering af ovennævnte entreprise.
<b>Deltagere i afleveringsforretning</b>	For bygherre:  Aron Jørgensen Wegners Plads 2 6270 Tønder  For entreprenør:  Thomas Christensen
<b>Omfang</b>	Entreprisens omfang fremgår af følgende dokumenter:  Entreprisekontrakt underskrevet af bygherre d. 30.04.2019 samt, Ekstra arbejde mm. I henhold til aftalesedler 1 - 28
<b>Mangler</b>	Arbejdet er afleveret med de fejl og mangler, der fremgår af mangelliste dateret:  I henhold til Bilag 1. - Dalux



### Afhjælpning

Afhjulpne fejl og mangler dokumenteres gennem entreprenørens underskrift på mangellister.

De oplyste mangler iht. overstående punkt afhjælpes senest:

Generelle mangler – d. 08.01.2021

Øvrige mangler jf. dalux m. anden afhjælpningsdato end generelle mangler.:

DBI rapport – 5.2.2021

Udvendige mangler – 5.2.2021

### Økonomi

Entreprenør fremsender stadeopgørelse på arbejde frem til aflevering.

### Bemærkninger

Bygherre:

Entreprenør:



Arbejdet anses for afleveret

Ja  Nej

Er kvalitetssikringsmappen afleveret

Ja  Nej

**Ansvarsperiode**

Ansvarsperioden er i henhold til AB 92, 5 år og løber herefter til den: **15.12.2025**

**Eftersyn**

1 års eftersyn skal udføres inden den: **14.12.2021**

5 års eftersyn skal udføres inden den: **14.11.2025**


**Garanti:**

Indtil afhjælpning af overstående fejl og mangler er udført og godkendt, tilbageholdes kr. 945.679 ekskl. moms. Entreprenøren har stillet en garanti på 15% af den oprindelig entreprisensum ekskl. moms.


Sikkerhedsstillelsen, garanti nr. B405639 dateret d. 01.05.2019, kan først nedskrives til 10% af entreprisensummen, når bygherre har godkendt mangelahjælperingen

**Underskrift:**

For bygherre: **Tønder Kommune**  
Kron Jørgensen.

Wegners Plads 2  
6270 Tønder  
  
18/12-20  
Dato/Underskrift

For entreprenør: **brayida**

Fabriksvej 7-9 · DK-6000 Kolding  
Tlf. 76 30 19 92  
  
Dato/Underskrift 18-12-2020



## Afleveringsprotokol

<b>Projekttitel</b>	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
<b>Entreprise</b>	<b>Elevatorentreprisen</b>
<b>Bygherre</b>	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
<b>Entreprenør</b>	<b>Bravida Danmark A/S</b> Svendborgvej 226 5260 Odense S CVR-nr.: 14769005
<b>Afleveringstidspunkt</b>	Den <b>15.12.2020</b> er der foretaget aflevering af ovennævnte entreprise.
<b>Deltagere i afleveringsforretning</b>	For bygherre:  Aron Jørgensen Wegners Plads 2 6270 Tønder  For entreprenør:  Thomas Christensen
<b>Omfang</b>	Entreprisens omfang fremgår af følgende dokumenter:  Entreprisekontrakt underskrevet af bygherre d. 01.07.2020 samt, Ekstra arbejde mm. I henhold til aftalesedler 1 – 28 jf. EI-entreprisen
<b>Mangler</b>	Arbejdet er afleveret med de fejl og mangler, der fremgår af mangelliste dateret:  I henhold til Bilag 1. – Dalux



**Afhjælpning**

Afhjulpne fejl og mangler dokumenteres gennem entreprenørens underskrift på mangellister.

De oplyste mangler iht. overstående punkt afhjælpes senest:

Generelle mangler – d. 8.1.2021

Øvrige mangler jf. dalux m. anden afhjælpningsdato end generelle mangler.:

Godkendelse af elevatorer – 5.2.2021

**Økonomi**

Entreprenør fremsender stadeopgørelse på arbejde frem til aflevering.

**Bemærkninger**

Bygherre:

Entreprenør:





Arbejdet anses for afleveret Ja  Nej

Er kvalitetssikringsmappen afleveret Ja  Nej

**Ansvarsperiode** Ansvarsperioden er i henhold til AB 92, 5 år og løber herefter til den: **15.12.2025**

**Eftersyn** 1 års eftersyn skal udføres inden den: **14.12.2021**

5 års eftersyn skal udføres inden den: **14.11.2025**

**Garanti:** Der er ikke stillet garanti i forbindelse med arbejdet. Tønder Kommune udbetaler slutbeløb på 10% ved færdiggørelse af arbejdet og dets mangler.

**Underskrift:**

For bygherre: Aron Jørgensen  
Tønder Kommune  
Wegners Plads 2  
6270 Tønder  
18-12-2020  
Dato/Underskrift

For entreprenør: **bravida**  
Fabriksvej 7-9 · DK-6000 Kolding  
Tlf. 76 30 19 92  
18-12-2020  
Dato/Underskrift



## Afleveringsprotokol

<b>Projekttitlel</b>	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
<b>Entreprise</b>	<b>CTS entreprisen</b>
<b>Bygherre</b>	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
<b>Entreprenør</b>	<b>Bravida Danmark A/S</b> Svendborgvej 226 5260 Odense S CVR-nr.: 14769005
<b>Afleveringstidspunkt</b>	Den <b>15.12.2020</b> er der foretaget aflevering af ovennævnte entreprise.
<b>Deltagere i afleveringsforretning</b>	For bygherre:  Aron Jørgensen Wegners Plads 2 6270 Tønder  For entreprenør:  Thomas Christensen
<b>Omfang</b>	Entreprisens omfang fremgår af følgende dokumenter:  Entreprisekontrakt underskrevet af bygherre d. 30.04.2019 samt, Ekstra arbejde mm. I henhold til aftalesedler 1 – 3 jf. CTS-entreprisen.
<b>Mangler</b>	Arbejdet er afleveret med de fejl og mangler, der fremgår af mangelliste dateret:  I henhold til Bilag 1. – Dalux



**Afhjælpning**

Afhjulpne fejl og mangler dokumenteres gennem entreprenørens underskrift på mangellister.  
De oplyste mangler iht. overstående punkt afhjælpes senest:

Generelle mangler – d. 15.01.2021

Øvrige mangler jf. dalux m. anden afhjælpningsdato end generelle mangler.:

Indregulering – 15.1.2021

**Økonomi**

Entreprenør fremsender stadeopgørelse på arbejde frem til aflevering.

**Bemærkninger**

Bygherre:

Entreprenør:



Arbejdet anses for afleveret Ja  Nej

Er kvalitetssikringsmappen afleveret Ja  Nej

**Ansvarsperiode** Ansvarsperioden er i henhold til AB 92, 5 år og løber herefter til den: **15.12.2025**

**Eftersyn** 1 års eftersyn skal udføres inden den: **14.12.2021**

5 års eftersyn skal udføres inden den: **14.11.2025**

**Garanti:** Indtil afhjælpning af overstående fejl og mangler er udført og godkendt, tilbageholdes kr. 367.137,75 ekskl. moms. Entreprenøren har stillet en garanti på 15% af den oprindelig entreprisensum ekskl. moms.

Sikkerhedsstillelsen, garanti nr. B405639 dateret d. 01.05.2019, kan først nedskrives til 10% af entreprisensummen, når bygherre har godkendt mangelahjælperingen

**Underskrift:**

For bygherre: Aron Jørgensen.

Tønder Kommune  
Wegners Plads 2  
6270 Tønder  
Dato/Underskrift 18-12-20

For entreprenør: **bravida**  
Fabrikvej 79 · DK-6000 Kolding  
Tlf. 76 30 19 99

Dato/Underskrift 18-12-2020



5906195#0 - Afleveringsprotokol - Haderslevvej 20, Michelsen

**Fra:** Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]  
**Til:** 'Jeppe Markmann Olesen' [jol@bomichelsen.dk]  
**Cc:** 'Daniel Rohde Detlefsen' [dde@bomichelsen.dk]  
**Sendt dato:** 18-12-2020 12:38  
**Modtaget Dato:** 18-12-2020 12:38  
**Vedrørende:** SV: SSK - Afleveringsprotokol  
**Vedhæftninger:** SToePrt01420121809180.pdf

---

Hej Jeppe

Her er den retur med vores underskrift.

Tak og i lige måde.

Venlig hilsen

**Sune Bundesen**  
Bygningskonsulent  
Ejendomme  
Teknik & Plan


---

**Tønder Kommune**

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder  
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk



OL\_Logo



---

**Fra:** Jeppe Markmann Olesen [mailto:jol@bomichelsen.dk]  
**Sendt:** 18. december 2020 08:25  
**Til:** Sune Bundesen  
**Cc:** Daniel Rohde Detlefsen  
**Emne:** SV: SSK - Afleveringsprotokol

Hej Sune

Så kommer den bare retur igen.

God jul og tak for samarbejdet på sagen:-)

[Klik her for at se vores nye profilvideo](#)

Med venlig hilsen

**Jeppe Markmann Olesen**  
Direktør

Bo Michelsen A/S  
Hansborggade 30  
6100 Haderslev  
Mobil: 22603771

Logo aflang signatur



---

**Fra:** Sune Bundesen <sb32@toender.dk>  
**Sendt:** 17. december 2020 08:35  
**Til:** Jeppe Markmann Olesen <jol@bomichelsen.dk>  
**Cc:** Daniel Rohde Detlefsen <dde@bomichelsen.dk>  
**Emne:** SV: SSK - Afleveringsprotokol

Hej Jeppe

Tak for fremsendte.

Der havde indsneget sig en fejl i afleveringsprotokollen, så jeg er nødt til at bede dig om at underskrive igen. Det var ansvarsperioden der havde en forkert dato.

Venlig hilsen

15/10/1

**Sune Bundesen**  
Bygningskonsulent  
Ejendomme  
Teknik & Plan


---

**Tønder Kommune**

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder  
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail [sb32@toender.dk](mailto:sb32@toender.dk)



OL\_Logo



---

**Fra:** Jeppe Markmann Olesen [<mailto:jol@bomichelsen.dk>]

**Sendt:** 16. december 2020 16:59

**Til:** Sune Bundesen

**Cc:** Daniel Rohde Detlefsen

**Emne:** VS: SSK - Afleveringsprotokol

Hej Sune

Hermed retur med underskrift.

[Klik her for at se vores nye profilvideo](#)

Med venlig hilsen

**Jeppe Markmann Olesen**

Direktør

Bo Michelsen A/S

Hansborggade 30

6100 Haderslev

Mobil: 22603771

Logo aflag signatur



---

**Fra:** Daniel Rohde Detlefsen <[dde@bomichelsen.dk](mailto:dde@bomichelsen.dk)>

**Sendt:** 16. december 2020 14:51

**Til:** Jeppe Markmann Olesen <[jol@bomichelsen.dk](mailto:jol@bomichelsen.dk)>

**Emne:** VS: SSK - Afleveringsprotokol

Hej Jeppe

Se nedenstående og vedhæftede fra BH...

Vil du gennemse og underskrive?

Med venlig hilsen

**Daniel Rohde Detlefsen**

Projektleder

Mobil: 22603775

Bo Michelsen A/S

Hansborggade 30, 3. sal

6100 Haderslev

Logo aflag signatur



[Klik her for at se vores nye profilvideo](#)

---

**Fra:** Sune Bundesen <[sb32@toender.dk](mailto:sb32@toender.dk)>

**Sendt:** 16. december 2020 14:40

**Til:** Daniel Rohde Detlefsen <[dde@bomichelsen.dk](mailto:dde@bomichelsen.dk)>

**Emne:** SSK - Afleveringsprotokol

15402

Hej Daniel

Her er afleveringsprotokol og bilag.

Venlig hilsen

**Sune Bundesen**  
Bygningskonsulent  
Ejendomme  
Teknik & Plan

---


**Tønder Kommune**

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail [sb32@toender.dk](mailto:sb32@toender.dk)



OL\_Logo





## Afleveringsprotokol

<b>Projekttitle</b>	<b>Skærbæk - Ny Skole</b> Skolegade 19. 6780 Skærbæk
<b>Entreprise</b>	<b>Råhus entreprisen</b>
<b>Bygherre</b>	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
<b>Entreprenør</b>	<b>Bo Michelsen A/S</b> Hansborggade 30, 6100 Haderslev CVR-NR.: 83231815
<b>Afleveringstidspunkt</b>	Den <b>15.12.2020</b> er der foretaget aflevering af ovennævnte entreprise.
<b>Deltagere i afleveringsforretning</b>	For bygherre:  Kim Kirkegaard Sørensen Wegners Plads 2 6270 Tønder  For entreprenør:  Jeppe Mark Olesen Daniel Rohde Detlefsen
<b>Omfang</b>	Entreprisens omfang fremgår af følgende dokumenter:  Entreprisekontrakt underskrevet af bygherre d. 11.4.2019 samt, Ekstra arbejde mm. I henhold til aftalesedler AE. 1 - 56
<b>Mangler</b>	Arbejdet er afleveret med de fejl og mangler, der fremgår af mangelliste dateret: 15.12.2020  I henhold til Bilag 1. - Dalux



**Afhjælpning**

Afhjulpne fejl og mangler dokumenteres gennem entreprenørens underskrift på mangellister.  
De oplyste mangler iht. overstående punkt afhjælpes senest:

Generelle mangler – d. 8.1.2021

Øvrige mangler jf. dalux m. anden afhjælpningsdato end generelle mangler.:

Udvendige mangler – d. 15.1.2021

Indvendige mangler ved trapper og betonsøjler– d. 5.2.2021

**Økonomi**

Entreprenør fremsender stadeopgørelse på arbejde frem til aflevering.

**Bemærkninger**

Bygherre:
Entreprenør:



Arbejdet anses for afleveret

Ja  Nej

Er kvalitetssikringsmappen afleveret

Ja  Nej

Ansvarsperiode

Ansvarsperioden er i henhold til AB 92, 5 år og løber herefter til den: **15.12.2025**

Eftersyn

1 års eftersyn skal udføres inden den: **14.12.2021**

5 års eftersyn skal udføres inden den: **14.11.2025**

Udskudte arbejder

Garanti:

Indtil afhjælpning af overstående fejl og mangler er udført og godkendt, tilbageholdes kr. 2.609.191 ekskl. moms. Entreprenøren har stillet en garanti på 15% af den oprindelig enterprisesum ekskl. moms.

Sikkerhedsstillelsen, garanti nr. B406046 dateret d. 15.05.2019, kan først nedskrives til 10% af enterprisesummen, når bygherre har godkendt mangelaafhjælpningen.

Underskrift:

For bygherre: Kim Kirkegaard Sørensen

Tønder Kommune  
Wegners Plads 2  
Dato/Underskrift: 15/12-20  
6270 Tønder

For entreprenør: 18-12-2020

[Signature]  
Dato/Underskrift

 **BO MICHELSEN A/S**  
Ribelandevej 37 · 6270 Tønder  
Telefon 7472 3770 · Fax 7472 0602  
www.bomichelsen.dk

Dato/Underskrift



5906206#0 - afleveringsprotokol underskrevet - Kraftman  
**Fra:** Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]  
**Til:** 'Jan M. Løper' [adm@kraftman.dk]  
**Sendt dato:** 18-12-2020 12:40  
**Modtaget Dato:** 18-12-2020 12:40  
**Vedrørende:** SV: Vedr. afleveringsprotokol  
**Vedhæftninger:** SToePrt01420121809170.pdf

---

Hej Jan

Her er den med vores underskrift.

Venlig hilsen


**Sune Bundesen**  
Bygningskonsulent  
Ejendomme  
Teknik & Plan

---

**Tønder Kommune**  
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder  
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk



OL\_Logo




---

**Fra:** Jan M. Løper [mailto:adm@kraftman.dk]  
**Sendt:** 17. december 2020 15:30  
**Til:** Sune Bundesen  
**Emne:** Vedr. afleveringsprotokol

Hej Sune

Vedhæftet afleveringsprotokol i underskreven stand

Med venlig hilsen  
KRAFTMAN A/S  
Jan M. Løper  
Økonomichef  
Tlf. 7462 2060 – Mobil 2163 4070  
Fax. 7462 2080  
[www.kraftman.dk](http://www.kraftman.dk)



---

**Fra:** mailservice@digitalgroup.dk <mailservice@digitalgroup.dk>  
**Sendt:** 17. december 2020 15:36  
**Til:** Jan M. Løper <adm@kraftman.dk>  
**Emne:** Scan fra Kraftman A/S



## Afleveringsprotokol

<b>Projekttitle</b>	<b>Skærbæk - Ny Skole</b> Skolegade 19. 6780 Skærbæk
<b>Entreprise</b>	<b>Tømreerentreprisen</b>
<b>Bygherre</b>	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
<b>Entreprenør</b>	<b>Kraftman A/S</b> <b>Vestvejen 167</b> <b>6200 Aabenraa</b>
<b>Afleveringstidspunkt</b>	Den <b>15.12.2020</b> er der foretaget aflevering af ovennævnte entreprise.
<b>Deltagere i afleveringsforretning</b>	For bygherre:  Kim Kirkegaard Sørensen Wegners Plads 2 6270 Tønder  For entreprenør:  Henning Skriver
<b>Omfang</b>	Entreprisens omfang fremgår af følgende dokumenter:  Entreprisekontrakt underskrevet af bygherre d. 29.05.2019 samt, Ekstra arbejde mm. I henhold til godkendte aftalesedler CE 1 - 68
<b>Mangler</b>	Arbejdet er afleveret med de fejl og mangler, der fremgår af mangelliste dateret:  I henhold til Bilag 1. – Dalux



**Afhjælpning**

Afhjulpne fejl og mangler dokumenteres gennem entreprenørens underskrift på mangellister.

De oplyste mangler iht. overstående punkt afhjælpes senest:

Generelle mangler – d. 8.1.2021

Øvrige mangler jf. dalux m. anden afhjælpningsdato end generelle mangler.:

Lodret træbeklædning – 29.1.2021

Underbeklædning – 19.2.2021

**Økonomi**

Entreprenør fremsender stadeopgørelse på arbejde frem til aflevering.

**Bemærkninger**

Bygherre:

Entreprenør:



Arbejdet anses for afleveret Ja  Nej

Er kvalitetssikringsmappen afleveret Ja  Nej

**Ansvarsperiode** Ansvarsperioden er i henhold til AB 92, 5 år og løber herefter til den: **15.12.2025**

**Eftersyn** 1 års eftersyn skal udføres inden den: **14.12.2021**

5 års eftersyn skal udføres inden den: **14.11.2025**

**Garanti:** Indtil afhjælpning af overstående fejl og mangler er udført og godkendt, tilbageholdes kr. 2.239.782 ekskl. moms. Entreprenøren har stillet en garanti på 15% af den oprindelig entreprisum ekskl. moms.

Sikkerhedsstillelsen, garanti nr. 6422587/1 dateret d. 03.06.2019, kan først nedskrives til 10% af entreprisummen, når bygherre har godkendt mangelaafhjælpningen

**Underskrift:**

For bygherre: Kim Kirkegaard Sørensen  
Tønder Kommune

Wegners Plads 2  
6270 Tønder

Dato/Underskrift

For entreprenør:

Dato/Underskrift





5906224#0 - Afleveringsprotokol underskrevet - Jurgensen ws  
**Fra:** Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]  
**Til:** 'lj@jurgensen-ws.dk' [lj@jurgensen-ws.dk]  
**Sendt dato:** 18-12-2020 12:42  
**Modtaget Dato:** 18-12-2020 12:42  
**Vedrørende:** SSK - Afleveringsprotokol  
**Vedhæftninger:** SToePrt01420121809160.pdf

---

Hej Lars

Her er afleveringsprotokollen med vores underskrift.

Venlig hilsen

**Sune Bundesen**  
Bygningskonsulent  
Ejendomme  
Teknik & Plan

---

**Tønder Kommune**  
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder  
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk



OL\_Logo



## Afleveringsprotokol

<b>Projekttitle</b>	<b>Skærbæk - Ny Skole</b> Skolegade 19. 6780 Skærbæk
<b>Entreprise</b>	<b>VVS-entreprisen</b>
<b>Bygherre</b>	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
<b>Entreprenør</b>	<b>Jürgensen VVS ApS</b> Håndværkervej 9, 6270 Tønder CVR-nr.: 79472816
<b>Afleveringstidspunkt</b>	Den <b>15.12.2020</b> er der foretaget aflevering af ovennævnte entreprise.
<b>Deltagere i afleveringsforretning</b>	For bygherre:  Aron Jørgensen Wegners Plads 2 6270 Tønder  For entreprenør:  Søren Jacobsen
<b>Omfang</b>	Entreprisens omfang fremgår af følgende dokumenter: Entreprisekontrakt underskrevet af bygherre d. 25.04.2019 samt, Ekstra arbejde mm. I henhold til aftalesedler 1 - 15
<b>Mangler</b>	Arbejdet er afleveret med de fejl og mangler, der fremgår af mangelliste dateret: 15.12.2020  Udvendig vask i sydbygning. Udføres når TØ har monteret udvendig beklædning. Handicaptoliet i sydbygning, stueplan. Monteres efter gulvbelægning.



**Afhjælpning**

Afhjulpne fejl og mangler dokumenteres gennem entreprenørens underskrift på mangellister.

De oplyste mangler iht. overstående punkt afhjælpes senest:

Generelle mangler – d. 08.01.2020 el. så snart der er mulighed for det af hensyn til andre entreprenører.

Øvrige mangler jf. dalux m. anden afhjælpningsdato end generelle mangler.:

**Økonomi**

Entreprenør fremsender studeopgørelse på arbejde frem til aflevering.

**Bemærkninger**

Bygherre:

Entreprenør:



Arbejdet anses for afleveret Ja  Nej

Er kvalitetssikringsmappen afleveret Ja  Nej

**Ansvarsperiode** Ansvarsperioden er i henhold til AB 92, 5 år og løber herefter til den: **15.12.2025**

**Eftersyn** 1 års eftersyn skal udføres inden den: **14.12.2021**

5 års eftersyn skal udføres inden den: **14.11.2025**

**Garanti:** Indtil afhjælpning af overstående fejl og mangler er udført og godkendt, tilbageholdes kr. 432.290 ekskl. moms. Entreprenøren har stillet en garanti på 15% af den oprindelig entreprisesum ekskl. moms.

Sikkerhedsstillelsen, garanti nr. 97G1066592 dateret d. 25.04.2019, kan/kan ikke nedskrives til 10% af entreprisesummen, når bygherre har godkendt mangelahjælperingen

**Underskrift:**

For bygherre: Aron Jørgensen.  
Tønder Kommune  
Wegners Plads 2  
6270 Tønder  
18/12-20  
Dato/Underskrift

For entreprenør:  
**Jørgensen VVS ApS**  
Håndværkervej 9 - 6270 Tønder  
Tlf 74 72 22 10 Fax 74 72 22 12  
Dato/Underskrift



5906235#0 - Afleveringsprotokol underskrevet - Garant

**Fra:** Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]  
**Til:** 'Lars Høj' [lh@garant.nu]  
**Sendt dato:** 18-12-2020 12:44  
**Modtaget Dato:** 18-12-2020 12:44  
**Vedrørende:** SV: SSK - Afleveringsprotokol  
**Vedhæftninger:** SToePrt01420121809150.pdf

---

Hej Lars

Her er den med vores underskrift.

Venlig hilsen

**Sune Bundesen**  
Bygningskonsulent  
Ejendomme  
Teknik & Plan


---

**Tønder Kommune**

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder  
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk



OL\_Logo



---

**Fra:** Lars Høj [mailto:lh@garant.nu]  
**Sendt:** 17. december 2020 09:27  
**Til:** Sune Bundesen  
**Emne:** SV: SSK - Afleveringsprotokol

Hej Sune


Hermed underskrevet

Med venlig hilsen  
Lars Høj



Høj Tæpper A/S, Rødekrø

Tlf. 74 66 21 24  
Mobil 20 27 38 10



---

**Fra:** Sune Bundesen <sb32@toender.dk>  
**Sendt:** 17. december 2020 08:26  
**Til:** Lars Høj <lh@garant.nu>  
**Emne:** SV: SSK - Afleveringsprotokol

Hej Lars

Se nedenstående, og vedhæftede.

Venlig hilsen

**Sune Bundesen**  
Bygningskonsulent  
Ejendomme  
Teknik & Plan

---

**Tønder Kommune**



OL\_Logo



---

**Fra:** Lars Høi [<mailto:lh@garant.nu>]  
**Sendt:** 16. december 2020 15:47  
**Til:** Sune Bundesen  
**Emne:** SV: SSK - Afleveringsprotokol

Hej Sune

Lige et par kommentarer:


- Entreprisekontrakten er underskrevet d. 14/8-19 og ikke 14/8-20 – Enig er rettet
- Værdiansættelsen af mangler er alt for højt. Vi mangler ca. 600 m<sup>2</sup> á 320,- = 192.000 kr. Som i øvrigt ikke er en mangel men udskudt arbejde. [Det er ikke værdien af mangler, men beløbet på garantien. Det er rettet til 267.013 kr.](#)
- Punktet med gulvskinner kan vi af gode grunde ikke komme med nogen dato på, da vi er blevet bedt om at komme med en pris på at afmontere alle dem vi har monteret. Og vi kender ikke omfanget eller løsningen endnu. Eller skal vi bare fortsætte med at montere dem der er på pladsen?
- Der er en del punkter i Dalux vi ikke mener er mangler. Og nogle af dem giver ikke mening at lave nu. Så vi mener ikke i skal lave en tilbageholdelse indtil alle "mangler" i Dalux er lavet. Et punkt som M301 vil der komme en del af, grundet støbeskel og lydfuger der er fejlplaceret. Det er kommenteret inden vi gik i gang med vores arbejde og jeres holdning var at bygherre ville montere en ekstra skinne i dørfalser, hvis gulvet revner. Øvrige steder er bygherre og råhus ansvarlig. Vi skal nok lave det (som ekstra arbejde), men det er ikke en "mangel" fra vores side. [Det er udelukkende en tilbageholdelse iht. Garantien. Du fremsender aconto iht. Stade på arbejde, så der bliver ikke tilbageholdt noget ud over det arbejde som ikke er udført.](#)
- Aftaleseddel 1, kan jeg ikke finde, medmindre det er den, der er mærket FE02. Vil du evt. genfremsende. – [Du har ret den har nummer FE.02](#)

Med venlig hilsen  
Lars Høi



Høi Tæpper A/S, Rødekrø

Tlf. 74 66 21 24  
Mobil 20 27 38 10



---

**Fra:** Sune Bundesen <[sb32@toender.dk](mailto:sb32@toender.dk)>  
**Sendt:** 16. december 2020 14:46  
**Til:** Lars Høi <[lh@garant.nu](mailto:lh@garant.nu)>  
**Emne:** SSK - Afleveringsprotokol

Hej Lars

Her er afleveringsprotokol med bilag. Vil du underskrive og sende retur.

Venlig hilsen

**Sune Bundesen**  
Bygningskonsulent  
Ejendomme  
Teknik & Plan

---


**Tønder Kommune**  
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder  
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail [sb32@toender.dk](mailto:sb32@toender.dk)



15419



OL\_Logo





## Afleveringsprotokol

<b>Projekttitlel</b>	<b>Skærbæk - Ny Skole</b> Skolegade 19. 6780 Skærbæk
<b>Entreprise</b>	<b>Gulv entreprisen</b>
<b>Bygherre</b>	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
<b>Entreprenør</b>	<b>Garant Gulve og Gardiner Haderslev A/S</b> <b>Christian X's Vej 6C</b> <b>6100 Haderslev</b> <b>CVR-Nr.: 21500135</b>
<b>Afleveringstidspunkt</b>	Den <b>15.12.2020</b> er der foretaget aflevering af ovennævnte entreprise.
<b>Deltagere i afleveringsforretning</b>	For bygherre:  Kim Kirkegaard Sørensen Wegners Plads 2 6270 Tønder  For entreprenør:  Lars Høj

### Omfang

Entreprisens omfang fremgår af følgende dokumenter:  
Entreprisekontrakt underskrevet af bygherre d. 14.08.2019 samt,  
Ekstra arbejde mm. I henhold til aftalesedler 1 - 5

### Mangler

Arbejdet er afleveret med de fejl og mangler, der fremgår af mangelliste dateret:  
I henhold til Bilag 1. - Dalux



**Afhjælpning**

Afhjulpne fejl og mangler dokumenteres gennem entreprenørens underskrift på mangellister.

De oplyste mangler iht. overstående punkt afhjælpes senest:

Generelle mangler – d. 8.1.2021

Øvrige mangler jf. dalux m. anden afhjælpningsdato end generelle mangler.:

Måtte ved hovedindgang – 19.2.2021

Gulv i nedsunken trappe – 15.1.2021

Gulvskinner ved ABDL døre – 15.1.2021

**Økonomi**

Entreprenør fremsender stædeopgørelse på arbejde frem til aflevering.

**Bemærkninger**

Bygherre:

Entreprenør:



Arbejdet anses for afleveret Ja \_\_\_\_\_ Nej x\_\_\_\_\_

Er kvalitetssikringsmappen afleveret Ja \_\_\_\_\_ Nej \_\_\_\_\_

**Ansvarsperiode** Ansvarsperioden er i henhold til AB 92, 5 år og løber herefter til den: **15.12.2025**

**Eftersyn** 1 års eftersyn skal udføres inden den: **14.12.2021**

5 års eftersyn skal udføres inden den: **14.11.2025**

**Garanti:** Indtil afhjælpning af overstående fejl og mangler er udført og godkendt, tilbageholdes kr. 267.013 ekskl. moms. Entreprenøren har stillet en garanti på 15% af den oprindelig entreprisensum ekskl. moms.

Sikkerhedsstillelsen, kan først nedskrives til 10% af entreprisensummen, når bygherre har godkendt mangelahjælperingen.

**Underskrift:**

For bygherre: Kim Kirksgaard Sørensen

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Dato/Underskrift

For entreprenør:

Dato/Underskrift

 **Garant**  
Gulve og Gardiner A/S  
Chr. X's Vej 4, BK-6100, Bøgeslev  
Tlf. 74 52 62 01 • Fax 74 52 63 13




5906284#0 - SV: SSK - 18-537 topstål, Tidsplan

**Fra:** Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]  
**Til:** 'Daniel Rohde Detlefsen' [dde@bomichelsen.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]  
**Cc:** Sune Bundesen [sb32@toender.dk]  
**Sendt dato:** 18-12-2020 12:56  
**Modtaget Dato:** 18-12-2020 12:56  
**Vedrørende:** SV: SSK - 18-537 topstål, Tidsplan  
**Vedhæftninger:** image001\_1486.png  
image002\_1513.png  
image003\_1466.png  
image004\_1475.png  
image005\_1465.png  
image006\_1104.jpg  
image007\_396.jpg  
image008\_203.jpg  
image009\_173.jpg  
image010\_62.jpg  
image012\_63.jpg

Hej Daniel.

Det er korrekt, at kravet til indvendig værn er stillet med en korrektionsklasse C1.  
Overflade behandling med pulverlakering fremgår af A.X.641.EX - Materiale - & Farveskema.  
Se nedestående udsnit. Stålet er i første omgang også leveret pulverlakeret hvid jf. nedestående.

Værn Iht. ING	Indvendig værn ved betontrapper	Pulverlakeret 10x60 mm fladjern i top (1200 mm over FG) og bund med vertikale 10x40 mm balistre med centerafstand på 90 mm. Håndliste 500 mm over FG. Monteres i siden af betontrappen.	Pulverlakeret hvid RAL 9016		
Iht. ING	Indvendig værn ved atrier	Pulverlakeret 10x60 mm fladjern i top (1200 mm over FG) og lodret bund med vertikale 10x40 mm balistre med centerafstand på 90 mm. Monteres i siden af dæk eller bjælke.	Pulverlakeret hvid RAL 9016		
Håndlister Iht. ING	Hovedtrappe mellembygning	Pulverlakeret fladjern 10 x 60 mm Monteret på væg 900 mm over FG	Pulverlakeret hvid RAL 9016		

Vi er enig om, at malerarbejde skal fortsætte.

God jul. ☺

Venlig hilsen

**Morten Bramstrup Jakobsen**  
Bygningskonsulent  
Ejendomme  
Teknik & Plan

#### Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder  
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



**Fra:** Daniel Rohde Detlefsen [mailto:dde@bomichelsen.dk]  
**Sendt:** 18. december 2020 12:28  
**Til:** Kim Kirkegaard Sørensen  
**Cc:** Sune Bundesen; Morten Bramstrup Jakobsen  
**Emne:** SV: SSK - 18-537 topstål, Tidsplan  
**Prioritet:** Høj

Hej Kim

Nedenstående er videreformidlet til STÅL og de har lovet at vende tilbage så snart de kender de nøjagtige leveringstidspunkter.  
Jeg har efterfølgende også talt i telefon med Henrik (STÅL), der forventer at stålet kommer med til galvanisering på tirsdag i den kommende uge – så altså umiddelbart er det klar til montering lige efter ferien.  
Ristene vidste han ikke noget om endnu.

Da vi talte sammen, nævnte Henrik i samme ombæring, at han havde undersøgt nærmere vedr. malingen på de indvendige værn – og at malingen slet ikke er nævnt i stålbeskrivelsen!

Som han siger så skal overfladen blot leve op til C1 – hvilket blot svarer til en almindelig grundmaling.

Såfremt det er korrekt og der ikke er andre henvisninger til beskrivelse af hvordan overfladen skal leveres, så må det forventes, at der kommer noget økonomi på malingen – og ydermere betyder det således også, at den ene mangel i bilaget til afleveringsprotokollen således alligevel ikke er en mangel.

Er der indeholdt maling af værnet i projektet under malerbeskrivelsen oprindeligt?

Vi er enige om at malerarbejdet skal fortsætte, og gennemføres som ved den første trappe i NORD, ikke?  
(Ellers er vi nødt til at stoppe arbejdet nu, indtil vi har en afklaring)

Lad høre...

Med venlig hilsen

**Daniel Rohde Detlefsen**

Projektleder

Mobil: 22603775

Bo Michelsen A/S

Hansborggade 30, 3. sal

6100 Haderslev



[Klik her for at se vores nye profilvideo](#)

---

**Fra:** Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

**Sendt:** 17. december 2020 12:09

**Til:** Daniel Rohde Detlefsen <dde@bomichelsen.dk>

**Cc:** Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

**Emne:** SSK - 18-537 topstål, Tidsplan

Hej Daniel

Har du modtaget en leverings og monterings dato fra stål.

Venlig hilsen

**Kim Kirkegaard Sørensen**

Bygningskonsulent

Ejendomme

Teknik & Plan

---

**Tønder Kommune**

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail [kimkir@toender.dk](mailto:kimkir@toender.dk)

















## RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR  
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR  
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR











<b>Værn</b> Iht. ING	Indvendig værn ved betontrapper	Pulverlakeret 10x60 mm fladjern i top (1200 mm over FG) og bund med vertikale 10x40 mm balistre med centerafstand på 90 mm. Håndliste 900 mm over FG. Monteres i siden af betontrappen.	Pulverlakeret hvid RAL 9016		
Iht. ING	Indvendig værn ved atrier	Pulverlakeret 10x60 mm fladjern i top (1200 mm over FG) og lodret bund med vertikale 10x40 mm balistre med centerafstand på 90 mm. Monteres i siden af dæk eller bjælke.	Pulverlakeret hvid RAL 9016		
<b>Håndlister</b> Iht. ING	Hovedtrappe mellembygning	Pulverlakeret fladjern 10 x 60 mm Monteret på væg 900 mm over FG	Pulverlakeret hvid RAL 9016		
