









[View image](#)

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning













5727251#0 - 06 Bemærkninger til faktura vedrørende honorar til

Fra: Ditte Lundgaard Jakobsen [dilja@toender.dk]
Til: Mogens Husted Kristensen [mhk@friis-moltke.dk]
Cc: Klaus Liestmann [KlausLiestmann@toender.dk]; Jan Præstholt [japra@toender.dk]; Lars-Erik Skydsbjerg [les@toender.dk]; Palle Kudsk [PKU@toender.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 16-07-2020 13:40
Modtaget Dato: 16-07-2020 13:40
Vedrørende: Re: Bemærkninger til faktura vedrørende honorar

Kære Mogens

Jeg forventer naturligvis i kan uddybe ressourceforbruget yderligere, herunder den del der gør, at det er så markant højere end forventelig og oprindeligt aftalt rådgivning.

Men som nævnt tidligere, kan det vente til efter ferien.

Jeg håber at vi til den tid fortsat har en fælles forståelse af, at omkostningerne skal holdes nede, under henvisning til jeres rådgivning om at vælge betaling af honorar efter regning.

Noget vi alene har accepteret med loft, for de ekstraudgifter tidsfristforlængelsen har medført.

Jeg ser frem til et møde primo august.

Vh

Ditte

Sendt fra min iPhone

Den 16. jul. 2020 kl. 11.00 skrev Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>:

Kære Ditte

Tak for dit hurtige svar.

Vi kan måske uddybe ressourceforbruget yderligere, og gør det gerne efter ferien. Det ændrer imidlertid ikke på krav og betalingsfrist.

Jeg har ikke afvist en acontobetaling, så den må I gerne gennemføre.

Jeg vender desuden tilbage til din mail, hvor du skriver, at forbruget ligger markant over tidligere: Vores ressourceforbrug i udførelsesfasen, forud for den forlængede byggetid har desværre ligget langt højere end raterne afspejlede. Det kan vi ikke fortsætte med, eller tage ansvaret for.

Med venlig hilsen

Mogens Husted Kristensen

Friis & Moltke

Den 16. jul. 2020 kl. 10.42 skrev Ditte Lundgaard Jakobsen <dilja@toender.dk>:

Kære Mogens

Jeg er ikke uenig med dig i, at fakturaer generelt skal betales rettidigt, jeg har blot anmodet om en kvalificering via jer, og en udspecificering førend jer er i stand til at udbetale.

4820

Og da jeg er med på vi er i sommerperioden, var mit forslag blot indtil udspecificering foreligger, at udbetale

et a conto beløb. Har noteret mig, at du ikke ønsker dette.

At du nu anfører, at ansvaret for rammen alene er bygherres er jeg uenig i.

Det har været hele forudsætningen for aftalen, at vi havde et fælles ansvar for denne ramme.

Ser frem til et møde til august.

Venlig hilsen

Ditte Lundgaard Jakobsen
Direktør
Teknik og Miljø
Tønder Kommune

Den 16. jul. 2020 kl. 09.14 skrev Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>:

□ Kære Ditte

Tror også at et møde i august vil være nyttigt, så det er jeg med på.

Jeg har tidligere understreget, at ressource forbruget må forventes at variere over den forlængede byggetid. Forbruget i juni viser bl.a. at der fortsat bruges mange ressourcer på at varetage bygherrens sag overfor udførende, der fortsat giver udfordringer.

Ansvaret for en ramme på kr. 1,4 er, som jeg tidligere har skrevet bygherrens, og vores fakturaer skal betales rettidigt.

Vi vil naturligvis medvirke til at begrænse ressourceforbruget. Det kan vi evt. drøfte en plan for til august.

Med venlig hilsen

Mogens Husted Kristensen

Friis & Moltke

Den 16. jul. 2020 kl. 08.25 skrev Ditte Lundgaard Jakobsen <dilja@toender.dk>:

□ Kære Mogens

Jeg kan ikke genkende udlægningen af, at min mail ikke stemmer overens med det tilsagn Tønder Kommune har givet.

Tilsagnet har hele tiden været under den forudsætning, at det var efter regning med loft og at vi i fællesskab skulle medvirke til at nedbringe udgifterne.

Rådgiver har ved flere lejligheder anbefalet kommunen, at betale efter forbrug, idet det var rådgivers klare opfattelse, at dette ville minimere udgifterne.

Og når du skriver det skaber bekymring for jer og jeres underrådgivere, så er det naturligvis det samme der får mig til at reagere, når vi modtager et stort antal regninger på et samlet beløb, der ligger markant over tidligere forbrug.

Hertil skal bemærkes at vi har overtaget flere opgaver. Og vi kan ikke af de modtagne faktura se, hvilke ydelser regningerne dækker over.

Jeg skal derfor igen anmode om, at vi modtager en samlet regning fra jer, vores totalrådgiver, som er kvalificeret og udspecificeret.

I det omfang du ønsker det, vil jeg gerne sikre udbetaling af 150.000 kr. a conto for juni måned.

Synes vi skal mødes i august måned, så vi kan få aftalt hvordan vi bedst håndterer dette fremadrettet.

Venlig hilsen

Ditte Lundgaard Jakobsen
Direktør

Den 14. jul. 2020 kl. 14.20 skrev Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>:

□ Kære Ditte

Tak for din mail.

Dit svar stemmer ikke overens med Tønder kommunes tilsagn til at betale efter forbrug, og jeg må fastholde, at faktura skal betales rettidigt. Din mail skaber stor bekymring hos os og vores underrådgivere mht videre samarbejde med Tønder kommune.

Grundet sommerferie, er det særdeles svært at gøre yderligere lige nu, men jeg præciserer, at vores ydelser udføres efter aftale om honorering efter forbrug. Er dette tilsagn imod forventning ikke længere gældende, beder jeg dig skrive det omgående, så vi i givet fald kan reagere.

Med venlig hilsen

Mogens Husted Kristensen

Friis & Moltke

Den 10. jul. 2020 kl. 09.39 skrev Ditte Lundgaard Jakobsen <dilja@toender.dk>:

□

Kære Mogens

Jeg kan nu konstatere fra juni måned, at der er indsendt 13 faktura med et samlet honorar på 316.000 kr., til blandt andet hotel, timer og kørsel. Vi kan ikke på nogen faktura se, hvad timerne reelt er anvendt til.

Jeg skal anmode om, at i samler timeregistreringen hos jer, så vi får en samlet faktura hver måned, med en udspecificering af hvad timerne er anvendt til.

Jeg henviser til, at der alene kan faktureres for ekstratimer ud over det der må forventes at være indeholdt i totalhonoraret, og vores aftale om, at honoraret maksimalt udgør 1,4 mio. kr.

Med det høje beløb der er fremsendt for juni måned, skal jeg igen understrege, at rådgiver ad flere omgange overfor Tønder Kommune har gjort opmærksom på, at time-registrering var en løsning for at nedbringe den samlede omkostning for byggeriet. Og at rådgiver accepterer, at kommunen har et honorarloft på 1,4 mio. kr., hvilket også ligger indenfor det estimat rådgiver selv var med til at sætte for udgift efter timeafregning.

Herudover vil jeg fremhæve, at Tønder Kommune har overtaget en række opgaver fra rådgiver, eksempelvis forhandling med entreprenørerne i forbindelse med tidfristforlængelsen, hvor rådgiver ikke bidrog ud over deltagelse ved to møder. Det betyder naturligvis også, at vi er meget undrende overfor, hvordan udgiften i juni måned med timeafregning, kan ligge så meget højere, end de 0,175 mio. kr. der har været udbetalt månedligt frem til juni måned. Med de opgaver kommunen har overtaget, at der alene kan betales for ekstraarbejder og med rådgivers anbefaling om timeafregning, burde den forventelig være lavere end 0,175 mio. kr.

Kommunen betaler ingen faktura førend ovenstående er uddybet.

Venlig hilsen

Ditte Lundgaard Jakobsen

Direktør
Teknik & Miljø

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 92 - Mobil +45 22 15 41 04 - E-mail
dilja@toender.dk

<image001.png>

[<image002.png>](#)

[<image003.png>](#)

[<image004.png>](#)

[<image005.png>](#)

[<image006.jpg>](#)

<image002.png>

<image001.png>

<image006.jpg>

<image003.png>

<image004.png>

<image005.png>

5726105#0 - SV: SSK - Fortrådning af Procesudsugning, CTS

Fra: Kasper Bornstein Larsen [kbl@taekker.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Cc: Morten Høier [moh@taekker.dk]; Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk]
Sendt dato: 21-07-2020 12:15
Modtaget Dato: 21-07-2020 12:15
Vedrørende: SV: SSK - Fortrådning af Procesudsugning, CTS
Vedhæftninger: image001_2.gif
image002_0.gif
image003_0.gif
image011_7.png
image012_6.png
image013_2.png
image014_0.png
image015_0.png
image016.jpg
image017_1.png

Hej Morten.

Jeg kan se at de tidligere mail gik til Kasper Fonnesbæk og ikke til mig.

Hvad præcis er det du gerne vil have på skrift og er det stadig aktuelt nu hvor der er indkaldt til møde vedr. CTS fortrådningen?

De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Kasper Bornstein Larsen
Civilingeniør i energi, indeklima, VVS og ventilation
kbl@taekker.dk

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M +45 41711328
T +45 8619 1844

www.taekker.dk



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 13. juli 2020 14:08

Til: 'Arne Borum Linnet' <al@fmbygningsdrift.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>; Kasper Bornstein Larsen <kbl@taekker.dk>

Cc: hv@friis-moltke.dk; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>

Emne: SV: SSK - Fortrådning af Procesudsugning, CTS

Hej Alle.

Nu var Bravida mv. ikke med på pladsen v. sidste byggemøde.
Kan vi få fremsendt noget på skrift med henvisning, så den ikke lander imellem to stole.

På forhånd tak.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk





Fra: Arne Borum Linnet [<mailto:al@fmbyggningsdrift.dk>]
Sendt: 3. juli 2020 08:08
Til: Morten Højer (moh@taekker.dk); Kasper Born Larsen
Cc: hv@friis-moltke.dk; Morten Bramstrup Jakobsen
Emne: VS: SSK - Forrådnng af Procesudsugning, CTS

Hej Morten

Se nedenstående fra TK ift. CTS. Har du et tilbagemelding til Morten eller har I det med tirsdag?

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet
Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbyggningsdrift.dk
Web: www.fmbyggningsdrift.dk



Hovedkontor: Afdeling Sverige:
FM Byggningsdrift ApS FM Management AB
Bryggergade 6A, 1. Bergaliden 11
7400 Herning 252 23 Helsingborg

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Sendt: 3. juli 2020 08:03
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; 'kf@taekker.dk' <kf@taekker.dk>
Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; 'hv@friis-moltke.dk' <hv@friis-moltke.dk>
Emne: SV: SSK - Forrådnng af Procesudsugning, CTS

Hej Arne.

Har Tækker vendt tilbage på denne eller skal den afklares på næste tirsdag?

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Arne Borum Linnet [<mailto:al@fmbyggningsdrift.dk>]
Sendt: 22. maj 2020 14:55
Til: Morten Bramstrup Jakobsen; 'kf@taekker.dk'
Cc: Sune Bundesen; Kim Kirkegaard Sørensen; Palle Kudsk; 'hv@friis-moltke.dk'
Emne: SV: SSK - Forrådnng af Procesudsugning, CTS

Hej Morten

Jeg har sendt denne mail til Michael fra CTS, har ikke fået et retursvar fra ham.

Så det selvfølgelig rigtig fint hvis Kasper lige følger op på det.

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbygningsdrift.dk
Web: www.fmbygningsdrift.dk



Hovedkontor: FM Bygningsdrift ApS Bryggergade 6A, 1. 7400 Herning	Afdeling Sverige: FM Management AB Bergaliden 11 252 23 Helsingborg
---	---

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 22. maj 2020 11:31

Til: 'kf@taekker.dk' <kf@taekker.dk>

Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; 'hv@friis-moltke.dk' <hv@friis-moltke.dk>

Emne: SSK - Fortrådning af Procesudsugning, CTS

Hej Kasper.

Jeg skriver angående de uoverensstemmelser, der har været angående fortrådning til procesudsugning og hvor arbejdsgangen har været placeret. Jeg kan forstå opgørelsen ud fra opgørelse fremsendt af Arne d. 18.05, at I har afklaret at det er CTS, der skal levere ydelsen. Jeg vil derfor gerne høre om de er informeret omkring dette? - Er de informeret, så fremsend gerne mailen til mig og ellers sættes Kim Kirkegaard Sørensen og jeg gerne CC på mailen, hvor de informeres.

På forhånd tak.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk





















RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

5721193#0 - SSK - Lysning v. ovenlys

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]
Til: 'Ingri B. Løvsbogen' [ibl@friis-moltke.dk]
Cc: 'hv@friis-moltke.dk' [hv@friis-moltke.dk]; 'Arne Borum Linnet' [al@fmbyggningsdrift.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Sendt dato: 22-07-2020 13:41
Modtaget Dato: 22-07-2020 13:41
Vedrørende: SSK - Lysning v. ovenlys.
Vedhæftninger: image001_474.png
image002_475.png
image003_458.png
image004_462.png
image005_466.png
image006_343.jpg

Hej Ingri.

Ved koordineringsmøde i går på pladsen var vi ved at se på gipsarbejdet ved ovenlys. Der er en del, der er blevet kasseret af maler i nordvestlig del. I den nordøstlig del så Søren Aaby og jeg også, at der var nogle plader der springer. Her nævnte Rikke fra Kraftman, at det var accepteret af dig på pladsen og der var fremsendt noget på skrift? Hvis det er tilfældet, vil du så ikke fremsende det til mig? ☺

Det skal lige siges, at der var noget med nogle beton elementer, der vist ikke var efter tegningerne og det var på den baggrund godkendelsen er givet, men jeg vil gerne lige sikre mig at det også passer, hvad vi fik at vide på pladsen. Om pladerne er inden for Q2 tolerance på gips kunne jeg ikke lige se på øjemål.

På forhånd tak.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk















RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5726111#0 - SV: SSK - Dialogmøde omkring leveringer fra Kraftma

Fra: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Cc: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 23-07-2020 15:42
Modtaget Dato: 23-07-2020 15:42
Vedrørende: SV: SSK - Dialogmøde omkring leveringer fra Kraftman
Vedhæftninger: image001_103.png
image008_11.png
image009_7.png
image010_8.png
image011_8.png
image012_7.png
image013_4.jpg

Hej Morten

Lyder som en god ide. Jeg tænker at jeg må forholde ham til en ressourceplan ift. de forskellige område de har i gang, såsom lofter, udvendig beklædning, hvor når der bliver indsat døre m.m. Ressourceplanen har jeg rykket for et par gange, HS tager forsat forbehold for tidsplanen.

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet
Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbygningsdrift.dk
Web: www.fmbygningsdrift.dk

FM Bygningsdrift

Logistik & Rådgivning

Hovedkontor:	Afdeling Sverige:
FM Bygningsdrift ApS	FM Management AB
Bryggergade 6A, 1.	Bergaliden 11
7400 Herning	252 23 Helsingborg

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Sendt: 23. juli 2020 14:07
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Emne: SSK - Dialogmøde omkring leveringer fra Kraftman

Hej Arne og Kim.

Skal vi lige bruge 5 min. ved næste givende møde på, at snakke om de gentagende gange, hvor Kraftman ikke leverer til tiden. Jeg ved en del af det henskyder han til rådgiver og bygherre, selvom vi ikke er enig, men det rammer jo projektet gevaldigt ift. tidsstyringen.

Jeg kan ikke se, at vi kan blive ved med at accepterer det. – Skal der evt. varsles? Tænker vi gerne vil have din mening Arne inden vi går videre med det.

Jeg tør ikke tænke på, hvad der er blevet brugt af timer ved os og det samlet rådgiver team på efterkomme Hennings krav.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



4844

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning













RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5723658#0 - SSK - Agenda til opstartsmøde efter sommerferien

Fra: Arne Borum Linnet [al@fmbyggningsdrift.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Cc: Søren Aaby [saa@fmbyggningsdrift.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]; hv@friis-moltke.dk [hv@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 25-07-2020 16:32
Modtaget Dato: 25-07-2020 16:32
Vedrørende: SSK - Agenda til opstartsmøde efter sommerferien
Vedhæftninger: image001_675.png

Hej Morten og Kim

Hermed som aftalt over telefonen i fredags mit oplæg til en agenda til mødet mandag på pladsen.

Økonomien
Tidsplanen generelt
Fremdriften fra Kraftman side
Udvendige arealer – opstart Mads V. og Bo M. – opstartsmøde med de 2 entreprenører
Udfordringen med vandindtrængning i hulmuren samt huldækket
Sikkerhedsglas – udførelse?

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet
Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbyggningsdrift.dk
Web: www.fmbyggningsdrift.dk



Hovedkontor:	Afdeling Sverige:
FM Bygningsdrift ApS	FM Management AB
Bryggergade 6A, 1.	Bergaliden 11
7400 Herning	252 23 Helsingborg

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

5722804#0 - SV: SSK - Forrådnng af Procesudsugning, CTS

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]
Til: 'Kasper Bornstein Larsen' [kbl@taekker.dk]
Cc: 'Morten Høier' [moh@taekker.dk]; 'Arne Borum Linnet' [al@fmbyggningsdrift.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 27-07-2020 08:37
Modtaget Dato: 27-07-2020 08:37
Vedrørende: SV: SSK - Forrådnng af Procesudsugning, CTS
Vedhæftninger: image004_583.png
image005_587.png
image006_80.png
image007_49.png
image008_37.png
image009_25.jpg
image010.gif
image011.gif
image012.gif
image013_13.png

Hej Kasper.

Tak for din mail.

Ud fra den opgørelse, der var fremsendt tilbage i maj, fremgik det at I havde afklaret, at forrådnng til procesudsugning var beskrevet under CTS. Det jeg efterspurgte var om det også var meldt videre til CTS, da det lød til på pladsen at de ikke var informeret om dette. Så jeg efterspørger lige igen om der en mail korrespondance på dette? Eller har I meldt det på Dalux?

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Kasper Bornstein Larsen [mailto:kbl@taekker.dk]
Sendt: 21. juli 2020 12:15
Til: Morten Bramstrup Jakobsen
Cc: Morten Høier; Arne Borum Linnet
Emne: SV: SSK - Forrådnng af Procesudsugning, CTS

Hej Morten.

Jeg kan se at de tidligere mail gik til Kasper Fonnesbæk og ikke til mig.

Hvad præcis er det du gerne vil have på skrift og er det stadig aktuelt nu hvor der er indkaldt til møde vedr. CTS forrådnngen?

De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Kasper Bornstein Larsen
Civilingeniør i energi, indeklma, VVS og ventilation
kbl@taekker.dk

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M +45 41711328
T +45 8619 1844

www.taekker.dk

4655



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 13. juli 2020 14:08

Til: 'Arne Borum Linnet' <al@fmbygningsdrift.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>; Kasper Bornstein Larsen <kbl@taekker.dk>

Cc: hv@friis-moltke.dk; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>

Emne: SV: SSK - Forråkning af Procesudsgning, CTS

Hej Alle.

Nu var Bravida mv. ikke med på pladsen v. sidste byggemøde.
Kan vi få fremsendt noget på skrift med henvisning, så den ikke lander imellem to stole.

På forhånd tak.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Arne Borum Linnet [<mailto:al@fmbygningsdrift.dk>]

Sendt: 3. juli 2020 08:08

Til: Morten Højer (moh@taekker.dk); Kasper Born Larsen

Cc: hv@friis-moltke.dk; Morten Bramstrup Jakobsen

Emne: VS: SSK - Forråkning af Procesudsgning, CTS

Hej Morten

Se nedenstående fra TK ift. CTS. Har du et tilbagemelding til Morten eller har I det med tirsdag?

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923

Mail: al@fmbygningsdrift.dk

Web: www.fmbygningsdrift.dk



Hovedkontor:

FM Bygningsdrift ApS

Bryggergade 6A, 1.

7400 Herning

Afdeling Sverige:

FM Management AB

Bergaliden 11

252 23 Helsingborg

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 3. juli 2020 08:03

Til: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; 'kf@taekker.dk' <kf@taekker.dk>

Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; 'hv@friis-moltke.dk' <hv@friis-moltke.dk>

Emne: SV: SSK - Forråkning af Procesudsgning, CTS

Hej Arne.

Har I ækker vendt tilbage på denne eller skal den afklares på næste tirsdag?

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Arne Borum Linnet [<mailto:al@fmbyggningsdrift.dk>]

Sendt: 22. maj 2020 14:55

Til: Morten Bramstrup Jakobsen; 'kf@taekker.dk'

Cc: Sune Bundesen; Kim Kirkegaard Sørensen; Palle Kudsk; 'hv@friis-moltke.dk'

Emne: SV: SSK - Fortrådning af Procesudsugning, CTS

Hej Morten

Jeg har sendt denne mail til Michael fra CTS, har ikke fået et retursvar fra ham.

Så det selvfølgelig rigtig fint hvis Kasper lige følger op på det.

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbyggningsdrift.dk
Web: www.fmbyggningsdrift.dk



Hovedkontor:	Afdeling Sverige:
FM Bygningsdrift ApS	FM Management AB
Bryggergade 6A, 1.	Bergaliden 11
7400 Herning	252 23 Helsingborg

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 22. maj 2020 11:31

Til: 'kf@taekker.dk' <kf@taekker.dk>

Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; 'hv@friis-moltke.dk' <hv@friis-moltke.dk>

Emne: SSK - Fortrådning af Procesudsugning, CTS

Hej Kasper.

Jeg skriver angående de uoverensstemmelser, der har været angående fortrådning til procesudsugning og hvor arbejdsgangen har været placeret. Jeg kan forstå opgørelsen ud fra opgørelse fremsendt af Arne d. 18.05, at I har afklaret at det er CTS, der skal levere ydelsen. Jeg vil derfor gerne høre om de er informeret omkring dette? - Er de informeret, så fremsend gerne mailen til mig og ellers sættes Kim Kirkegaard Sørensen og jeg gerne CC på mailen, hvor de informeres.

På forhånd tak.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk





RIG PÅ TUR
NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR













RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR







FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

5725049#0 - SSK - Ovenlysvinduerne - Tilbage melding til BH

Fra: Arne Borum Linnet [al@fmbyggningsdrift.dk]
Til: Morthensen Michael Kenneth (Bravida) [Michael.k.Morthensen@bravida.dk]
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Kasper Born Larsen [kbl@taekker.dk]
Sendt dato: 28-07-2020 07:09
Modtaget Dato: 28-07-2020 07:09
Vedrørende: SSK - Ovenlysvinduerne - Tilbage melding til BH

Hej Michael

BH hører indtil om du har været i kontakt med CL Alu ift. sammenkobling af ovenlysvinduerne med CTS som du nævnte på mødet på pladsen? Det drejer sig om røgmelder, vindstationen udvendig så vinduerne overstyrer jer (CTS) ift. for meget vind på vinduerne.

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923

Mail: al@fmbyggningsdrift.dk

Web: www.fmbyggningsdrift.dk



Hovedkontor:

FM Bygningsdrift ApS

Bryggergade 6A, 1.

7400 Herning

Afdeling Sverige:

FM Management AB

Bergaliden 11

252 23 Helsingborg

5725043#0 - SSK - Vandudfordring på skolen

Fra: Arne Borum Linnét [al@fmbygningsdrift.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Cc: hv@friis-moltke.dk [hv@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 28-07-2020 13:34
Modtaget Dato: 28-07-2020 13:34
Vedrørende: SSK - Vandudfordring på skolen
Vedhæftninger: image001_31.png

Hej Kim og Morten

Jeg har som aftalt igangsat følgende ift. vandindrængen, skadeservice kigger huldækket igennem med deres kameraer i morgen og opsætter 6 stk. blæser til at skabe noget ventilation i luft i nordbygningen.

Opsætning og nedtagning af blæserne koster pr. uge 5000,00 kr.

Gennemgang efter vandindrængningen er på med gået tid.

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnét
Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbygningsdrift.dk
Web: www.fmbygningsdrift.dk



Hovedkontor:	Afdeling Sverige:
FM Bygningsdrift ApS	FM Management AB
Bryggergade 6A, 1.	Bergaliden 11
7400 Herning	252 23 Helsingborg

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

5725042#0 - VS SSK - Underentreprenører på pladsen

Fra: Arne Borum Linnét [al@fmbyggningsdrift.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Sendt dato: 28-07-2020 15:09
Modtaget Dato: 28-07-2020 15:09
Vedrørende: VS: SSK - Underentreprenører på pladsen
Vedhæftninger: image001_30.png
image003_0.jpg
image004_29.png

Hej Morten

Rikke tilretter deres apv og pss med de forskellig cvr nr.

Men dem som ligger tegl for Henning har følgende cvr. nr.

lværkere/GY0SUW107TR/

Mureren og Håndlangeren IVS

CVR-nr 40431888 CVRP-nr 1024603160 – Normal

Lindegade 7, 1., 6070 Christiansfeld


Sammenlign [Find lignende](#) Udskriv Del firmaprofil

OVERSIGT REGNSKAB NØGLETAL ROLLER MEDIER

Kontaktinformation

Besøgsadresse: Lindegade 7, 1., 6070 Christiansfeld
Postadresse: Lindegade 7 1, 6070 Christiansfeld

Kilde: Proff



Er dette dit firma?
Proff™ kan hjælpe dig med at finde nye kunder og forretninger. Prøv gratis og uforpligtende i en måned. [Læs mere](#)

Officiel virksomhedsinformation

Juridisk navn:	mureren og håndlangeren IVS	Adresse:	Lindegade 7 1, 6070 Christiansfeld
CVR-nr:	40431888	Postadresse:	Lindegade 7 1, 6070 Christiansfeld
CVRP-nr:	1024603160	Startdato:	09-04-2019
Selskabsform:	Iværksætterselskab	Selskabskapital:	1
NACE-branche:	439910 Murere		

CVR/Virk

Koncern

mureren og håndlangeren IVS er en del af et koncern med totalt 2 selskaber.

Moderselskab: [brøndumdd holding IVS](#)

[Se koncernrelationer](#)

Ledelse/Administration

Adm. direktør: [Daniel Brøndum Bjørkquist Dahl](#)

CVR/Virk

[Vis alle roller](#)

Brancher/søgeord

Brancher: [Bygningshåndværkere](#)

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnét
Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbyggningsdrift.dk
Web: www.fmbyggningsdrift.dk

Hovedkontor:

FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:

FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Sendt: 28. juli 2020 14:06

Til: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>

Cc: Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Emne: Re: SSK - Underentreprenører på pladsen

Jeg har et eksternt hold der laver skiffer
Ud over dette er det mine ansatte /nogle vikar

Med venlig hilsen

HENNING SKRIVER

KRAFTMAN A/S
T: 7462 2060

Se meget mere på www.kraftman.dk

Den 28. jul. 2020 kl. 13.43 skrev Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>:

Hej Rikke

BH spørger indtil hvor mange underentreprenører I har på pladsen? Samt hvilken firma de er ansat af?

Vil du vende tilbage på dette.

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet

Bygge- og projektleder

Mobilnr.:

+45 2677 8923

Mail:

al@fmbygningsdrift.dk

Web:

www.fmbygningsdrift.dk

<image001.png>

Hovedkontor:

FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:

FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

Mureren og Håndlangeren IVS CVR-nr 40431888 CVRP-nr 1024603160 – Normal

Lindegade 7, 1., 6070 Christiansfeld

Sammenlign [↶ Find lignende](#)

Udskriv Del firmaprofil

OVERSIGT

REGNSKAB

NØGLETAL

ROLLER

MEDIER

Kontaktinformation

Besøgsadresse: [Lindegade 7, 1., 6070 Christiansfeld](#)
 Postadresse: [Lindegade 7 1, 6070 Christiansfeld](#)



Kilde: Proff



Er dette dit firma?

Proff™ kan hjælpe dig med at finde nye kunder og forretninger. Prøv **gratis og uforpligtende** i en måned. [Læs mere](#)

Officiel virksomhedsinformation

Juridisk navn:	mureren og håndlangeren IVS	Adresse:	Lindegade 7 1, 6070 Christiansfeld
CVR-nr:	40431888	Postadresse:	Lindegade 7 1, 6070 Christiansfeld
CVRP-nr:	1024603160	Startdato:	09-04-2019
Selskabsform:	Iværksætterelskab	Selskabskapital:	1
NACE-branche:	439910 Murere		

CVR/Virk

Koncern

mureren og håndlangeren IVS er en del af et koncern med totalt 2 selskaber.

Moderselskab: [brøndumdd holding IVS](#)

Se koncernrelationer

Ledelse/Administration

Adm. direktør [Daniel Brøndum Bjørkquist Dahl](#)

CVR/Virk

Vis alle roller

Brancher/søgeord

Brancher: [Bygningshåndværkere](#)

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

5725017#0 - VS SSK - aftaleseddel til Råhus på lukning af hull

Fra: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Cc: Lars Mathiesen [lm@fmbygningsdrift.dk]; Daniel Rohde Detlefsen [dde@bomichelsen.dk]
Sendt dato: 29-07-2020 10:44
Modtaget Dato: 29-07-2020 10:44
Vedrørende: VS: SSK - aftaleseddel til Råhus på lukning af huller
Vedhæftninger: Aft. AE46 , 29-07-2020.pdf
image001_29.png

Hej Morten

Hermed en aftaleseddel på lukning af hullerne ved gulvet i nordbygningen

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet
Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbygningsdrift.dk
Web: www.fmbygningsdrift.dk



Hovedkontor: FM Bygningsdrift ApS Bryggergade 6A, 1. 7400 Herning	Afdeling Sverige: FM Management AB Bergaliden 11 252 23 Helsingborg
---	---

Fra: Lars Mathiesen <lm@fmbygningsdrift.dk>
Sendt: 29. juli 2020 10:43
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>
Emne: SV: SSK - aftaleseddel til Råhus på lukning af huller

Værsgod , AE46..

Med venlig hilsen

Lars Mathiesen
Bygge- og Projektleder

Mobilnr.: +45 4029 9587
Mail: lm@fmbygningsdrift.dk
Web: www.fmbygningsdrift.dk



Hovedkontor: FM Bygningsdrift ApS Bryggergade 6A, 1. 7400 Herning	Afdeling Sverige: FM Management AB Bergaliden 11 252 23 Helsingborg
---	---

Fra: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>
Sendt: 29. juli 2020 09:52
Til: Lars Mathiesen <lm@fmbygningsdrift.dk>
Emne: SSK - aftaleseddel til Råhus på lukning af huller

Hej Lars

Aftaleseddel til Bo M. på følgende

Lukning af huller i vægelementerne ved gulv i alt 135 huller.

4877

Pris 8500,-

Mandetimer og materialer.

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923

Mail: al@fmbyggningsdrift.dk

Web: www.fmbyggningsdrift.dk



Hovedkontor:

FM Byggningsdrift ApS

Bryggergade 6A, 1.

7400 Herning

Afdeling Sverige:

FM Management AB

Bergaliden 11

252 23 Helsingborg

AFTALESEDDEL

NR: AE.46

Byggesag: Ny skole i Skærbæk
Bygherre: Tønder Kommune
Wegners Plads 2, 6270 Tønder
Entreprise: Råhus entreprisen
Entreprenør: Bo Michelsen a/s
Sagsnr.: 82.06.00-G01-1-16
Aft: Sune Bundesen
EAN: 5798 0050 31734



TØNDER KOMMUNE

Note: Alle beløb er excl. moms

Arbejde	Enh.	Mængde	a' kr.	I alt kr.
Lukning af huller i vægelementer v/gulv, i alt 135 stk	stk	135	62,96	8.500,00
I alt excl. moms kr.				8.500,00
Moms, 25 %				2.125,00
I alt incl. moms kr.				10.625,00

Arbejdet og/eller leverancen udføres til en aftalt pris på i alt incl. moms kr. **10.625,00**

Arbejdet og/eller leverancen udføres som regningsarbejde på grundlag af de i tilbuddet fastsatte betingelser for arbejder og leverancer til en ca. pris, der er aftalt til i alt incl. moms kr.

Bygherren har adgang til at føre kontrol med timesedler, følgesedler og regnskabsbilag.
Den aftalte cirkapris kan ikke overskrides med mere end 10 %.

Dato: _____

Dato: _____

Dato: _____

For bygherren _____

For byggeledelsen _____

For entreprenøren _____

Ved min underskrift bekræfter jeg/vi, at jeg/vi er indforstået med aftalens indhold, at jeg/vi kan indgå bindende aftaler, samt at der for denne aftale gælder samme betingelser, som anført på den tilhørende entrepriseaftale.

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

5725148#0 - VS SSK - Fortrådning af Procesudbygning, CTS

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]
Til: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Cc: 'Arne Borum Linnet' [al@fmbyggningsdrift.dk]
Sendt dato: 29-07-2020 13:00
Modtaget Dato: 29-07-2020 13:00
Vedrørende: VS: SSK - Fortrådning af Procesudbygning, CTS
Vedhæftninger: image001.gif
image002.gif
image003.gif
image004_38.png
image005_38.png
image006_5.png
image007_5.png
image008_3.png
image009_1.jpg
image010_3.png

T.O.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Kasper Bornstein Larsen [mailto:kbl@taekker.dk]
Sendt: 29. juli 2020 12:56
Til: Morten Bramstrup Jakobsen
Emne: SV: SSK - Fortrådning af Procesudbygning, CTS

Hej Morten.

Jeg er faktisk ikke sikker på hvor den landede. Det var i sin tid Arne der efterspurgte hvem der havde ydelsen med. Jeg svarede ham, og han svarede jer – det er så muligt at CTS faktisk slet ikke har været en del af denne kommunikation. Om ikke andet bliver det forhåbentligt afklaret tirsdag.

Iht. til det udbudsmateriale som vi har udført, har det hele tiden fremgået af CTS skulle have ydelsen med fortrådning af procesventilation.

De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Kasper Bornstein Larsen
Civilingeniør i energi, indeklimateknik, VVS og ventilation
kbl@taekker.dk

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M +45 41711328
T +45 8619 1844

www.taekker.dk



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Sendt: 27. juli 2020 08:37

Til: Kasper Bornstein Larsen <kbl@taekker.dk>

Cc: Morten Høier <moh@taekker.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>

Emne: SV: SSK - Forrådnning af Procesudsugning, CTS

Hej Kasper.

Tak for din mail.

Ud fra den opgørelse, der var fremsendt tilbage i maj, fremgik det at I havde afklaret, at forrådnning til procesudsugning var beskrevet under CTS.

Det jeg efterspurgte var om det også var meldt videre til CTS, da det lød til på pladsen at de ikke var informeret om dette. Så jeg efterspørger lige igen om der en mail korrespondance på dette? Eller har I meldt det på Dalux?

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Kasper Bornstein Larsen [<mailto:kbl@taekker.dk>]

Sendt: 21. juli 2020 12:15

Til: Morten Bramstrup Jakobsen

Cc: Morten Høier; Arne Borum Linnet

Emne: SV: SSK - Forrådnning af Procesudsugning, CTS

Hej Morten.

Jeg kan se at de tidligere mail gik til Kasper Fonnesbæk og ikke til mig.

Hvad præcis er det du gerne vil have på skrift og er det stadig aktuelt nu hvor der er indkaldt til møde vedr. CTS forrådnningen?

De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Kasper Bornstein Larsen

Civilingeniør i energi, indeklimateknik, VVS og ventilation
kbl@taekker.dk

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M +45 41711328
T +45 8619 1844

www.taekker.dk



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 13. juli 2020 14:08

Til: 'Arne Borum Linnet' <al@fmbygningsdrift.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>; Kasper Bornstein Larsen <kbl@taekker.dk>

Cc: hv@friis-moltke.dk; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>

Emne: SV: SSK - Forrådnning af Procesudsugning, CTS

Hej Alle.

Nu var Bravida mv. ikke med på pladsen v. sidste byggemøde.
Kan vi få fremsendt noget på skrift med henvisning, så den ikke lander imellem to stole.

På forhånd tak.

Venlig hilsen

4882

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Arne Borum Linnet [<mailto:al@fmbyggningsdrift.dk>]**Sendt:** 3. juli 2020 08:08**Til:** Morten Højer (moh@taekker.dk); Kasper Born Larsen**Cc:** hv@friis-moltke.dk; Morten Bramstrup Jakobsen**Emne:** VS: SSK - Forrådnig af Procesudsugning, CTS

Hej Morten

Se nedenstående fra TK ift. CTS. Har du et tilbagemelding til Morten eller har I det med tirsdag?

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbyggningsdrift.dk
Web: www.fmbyggningsdrift.dk



Hovedkontor:	Afdeling Sverige:
FM Bygningsdrift ApS	FM Management AB
Bryggergade 6A, 1.	Bergaliden 11
7400 Herning	252 23 Helsingborg

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>**Sendt:** 3. juli 2020 08:03**Til:** Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; 'kf@taekker.dk' <kf@taekker.dk>**Cc:** Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; 'hv@friis-moltke.dk' <hv@friis-moltke.dk>**Emne:** SV: SSK - Forrådnig af Procesudsugning, CTS

Hej Arne.

Har Tækker vendt tilbage på denne eller skal den afklares på næste tirsdag?

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Arne Borum Linnet [<mailto:al@fmbyggningsdrift.dk>]

Sendt: 22. maj 2020 14:55

Til: Morten Bramstrup Jakobsen; 'kf@taekker.dk'

Cc: Sune Bundesen; Kim Kirkegaard Sørensen; Palle Kudsk; 'hv@friis-moltke.dk'

Emne: SV: SSK - Fortrådning af Procesudsugning, CTS

Hej Morten

Jeg har sendt denne mail til Michael fra CTS, har ikke fået et retursvar fra ham.

Så det selvfølgelig rigtig fint hvis Kasper lige følger op på det.

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923

Mail: al@fmbyggningsdrift.dk

Web: www.fmbyggningsdrift.dk



Hovedkontor:

FM Byggningsdrift ApS

Bryggergade 6A, 1.

7400 Herning

Afdeling Sverige:

FM Management AB

Bergaliden 11

252 23 Helsingborg

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 22. maj 2020 11:31

Til: 'kf@taekker.dk' <kf@taekker.dk>

Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; 'hv@friis-moltke.dk' <hv@friis-moltke.dk>

Emne: SSK - Fortrådning af Procesudsugning, CTS

Hej Kasper.

Jeg skriver angående de uoverensstemmelser, der har været angående fortrådning til procesudsugning og hvor arbejdsgangen har været placeret. Jeg kan forstå opgørelsen ud fra opgørelse fremsendt af Arne d. 18.05, at I har afklaret at det er CTS, der skal levere ydelsen. Jeg vil derfor gerne høre om de er informeret omkring dette? - Er de informeret, så fremsend gerne mailen til mig og ellers sættes Kim Kirkegaard Sørensen og jeg gerne CC på mailen, hvor de informeres.

På forhånd tak.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent

Ejendomme

Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk





















RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

Fra: Arne Borum Linnet [al@fmbyggningsdrift.dk]
Daniel Detlefsen [dde@bomichelsen.dk]; Daniel Madsen [daniel.madsen@gk.dk]; Thomas Christensen [t.christensen@bravida.dk]; Kjems Flemming [flemming.kjems@bravida.dk]; Thomas Kawaler [tk@jurgensen-ws.dk]; Søren Jacobsen [sj@jurgensen-ws.dk]; Sune Hofsted [mhofsted@hotmail.com]; Rikke Hansen [ts@kraftman.dk]; Hennig Skriver [hs@kraftman.dk]
Til:
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 29-07-2020 13:06
Modtaget Dato: 29-07-2020 13:06
Vedrørende: SSK luft/ ventilation i bygning nord
Vedhæftninger: image0_0.jpeg

Hej alle

Vi har opsat luftblæser 6 stk i bygning nord pga. vi skal have det sidste fugt presset ud af væggene inden maler begynder med filt. I bedes ikke at slukke for dem i og med det vil bremse udtørring og fremdriften.

På forhånd tak.

□

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet
Bygge- og projektleder

Mobilnr.: 2677 8923
Mail: al@fmbyggningsdrift.dk

Sendt fra min iPhone



5727882#0 - 06 tilladelse til afledning af tag-/overfladevand
Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Kasper Bornstein Larsen (kbl@taekker.dk)' [kbl@taekker.dk]
Cc: 'Henrik Villefrance' [hv@friis-moltke.dk]; 'Morten Høier' [moh@taekker.dk]
Sendt dato: 03-08-2020 12:27
Modtaget Dato: 03-08-2020 12:27
Vedrørende: SV: Skærbæk Skole - tilladelse til afledning af tag-/overfladevand
Vedhæftninger: SToePrt01420080311570.pdf

Hej Kasper

Her er spildevandsansøgningen udfyldt og underskrevet.
Jeg har forsøgt at få den endelige adresse og matrikelnummer på tilladelsen, men det har ikke kunnet lade sig gøre endnu.
Derfor ansøger vi på det der er nu, og så eftersender jeg matrikel og adresse, når det er blevet rettet, og vi har det endelige.


Venlig hilsen

Sune Bundesen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk



OL_Logo



Fra: Kasper Fønnesbæk [mailto:kf@taekker.dk]
Sendt: 24. marts 2020 22:41
Til: Sune Bundesen
Cc: Henrik Villefrance; Morten Høier
Emne: VS: Skærbæk Skole - tilladelse til afledning af tag-/overfladevand

Hej Sune

Jeg vil blot høre efter om du har haft tid til at se på vedhæftede ansøgning?

De bedste hilsener
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Kasper Fønnesbæk
Civilingeniør, VVS, Energi og Indeklima
kf@taekker.dk

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M +45 26759542
T +45 8619 1844

www.taekker.dk



Fra: Kasper Fønnesbæk
Sendt: 17. marts 2020 16:10
Til: 'Sune Bundesen' <sb32@toender.dk>
Cc: Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk) <hv@friis-moltke.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>
Emne: SV: Skærbæk Skole - tilladelse til afledning af tag-/overfladevand

Hej Sune

Jeg har vedhæftet vores ansøgningsmateriale i forbindelse med udledning af regnvand til Skifle.

Vil du udfylde de manglende oplysninger på side 1 i vedhæftede dokument *ansoegning_tag_og_overfladevand_0* og returnere, så jeg kan sende det

1097

samlende materiale til Lise Sivesgaard?

På forhånd tak.

De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Kasper Fønnesbæk
Civilingeniør, VVS, Energi og Indeklima
kf@taekker.dk

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M +45 26759542
T +45 8619 1844

www.taekker.dk



Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Sendt: 4. februar 2020 08:00
Til: Kasper Fønnesbæk <kf@taekker.dk>
Cc: Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk) <hv@friis-moltke.dk>
Emne: VS: Skærbæk Skole - tilladelse til afledning af tag-/overfladevand

Hej Kasper

Se nedenstående.
Vil du sørge for at der bliver søgt om spildevandstilladelse.

Venlig hilsen

Sune Bundesen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk



OL_Logo



Fra: Lise Sivesgaard
Sendt: 3. februar 2020 13:35
Til: Sune Bundesen
Emne: Skærbæk Skole - tilladelse til afledning af tag-/overfladevand

Hej Sune

Husker du lige, at I skal søge om spildevandstilladelse, hvis der skal afledes tag-/overfladevand fra den nye skole til vandløb eller nedsvivning ?

Venlig hilsen

Lise Sivesgaard
Miljømedarbejder
Industri og Vandmiljø
Miljø & Natur

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 42 - Mobil +45 20 35 46 63 - E-mail lbs@toender.dk

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. Læs mere her

4898

Ansøgningen sendes til:

**Tønder Kommune
Teknik og Miljø
Wegners Plads 2
6270 Tønder**



TØNDER KOMMUNE

Modtaget dato.

Ansøgning om tilladelse til nedsivning/udledning af tag- og overfladevand.

Ejendommens matrikelbetegnelse og nummer: <i>Skærbæk Ejerlav 2526</i>			
Ejendommens adresse: <i>Kagebøl 54</i>		Post nummer: <i>6780</i>	By: <i>Skærbæk</i>
Ansøgers navn og adresse: <i>Tønder Kommune</i>		Post nummer: <i>6270</i>	By: <i>Tønder</i>
Ansøgers e-mail adresse: <i>teknisk@toender.dk</i>		Telefon nummer: <i>74 92 92 92</i>	
<u>Veiledning – om udfyldelse af ansøgningskemaet.</u>			
Vandindvinding Hvis der findes drikkevandsboringer/brønde, vandløb, søer eller hav indenfor en afstand af 25 m. fra det planlagte anlæg, kontaktes kommunen.			
Kontakt kloakmesteren Visse punkter i ansøgningskemaet kan først udfyldes, når placeringen af anlægget ligger fast, og når forundersøgelserne er gennemført. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at kontakte en kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del. Kloakmesteren kan ligeledes oplyse om anlæggets dimensioner, samt udarbejde kloak- og oversigtsplan. Ved nedsivningsfaskiner er det ikke nødvendig at en autoriseret kloakmester udfører arbejdet. Alt andet arbejde på kloaksystemet, herunder tilslutning og afprovpning, skal udføres af en autoriseret kloakmester. Anlægget skal udføres efter Dansk Standard DS 432 og DS 440.			
Kortmateriale Der skal vedlægges et kortbilag, i form af en målsat skitse over afløbsforholdene på ejendommen, herunder placeringen af anlægget. Er der ikke vedlagt kortbilag til ansøgning kan kommune ikke færdiggøre ansøgningen.			
Forundersøgelse Punkt 13 og 14 på ansøgningskemaet udfyldes kun, hvis det ansøgte areal er større end 150 m ² , eller hvis der er tvivl om jordens evne til at nedsive. I andre tilfælde vil det være tilstrækkeligt at oplyse om jorden er ler eller sand.			
Befæstede arealer Skal der anlægges/renoveres et større befæstet areal kontaktes kommunen. Dette gælder for P-pladser, hvor der er plads til mere end 20 biler, samt befæstede arealer omkring virksomheder.			
Sagsbehandler For at opnå en hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at samtlige oplysninger afgives, og at kloak- og oversigtsplaner udarbejdes korrekt. Det er vigtigt, at der i de tilfælde, hvor ejeren og ansøgeren ikke er den samme, er underskrifter fra begge parter på ansøgningen.			
Færdigmelding af anlægget. Tilladelsen er betinget af at anlægget er udført inden 1 år fra den dato hvor tilladelsen er udstedt. Det er ejerens egen pligt at sørge for at kommunen bliver orienteret om dette. Hvis der ikke inden 1 år fra udstedelsesdatoen er indsendt en færdigmelding, er tilladelsen ikke gældende. Kontakt kommunen hvis datoen ikke kan overholdes.			
Dato <i>3/8-2020</i>	Ansøgers underskrift <i>Seer</i>	Dato	Kloakmesters underskrift
Kloakmesters navn og adresse		Telefonnummer	
		e-mail	

Udfyldes af ansøgeren

1. Benyttes ejendommen som	<input type="checkbox"/> Helårsbeboelse	<input type="checkbox"/> Fritidsbeboelse	<input checked="" type="checkbox"/> Erhverv
2. Ejendommens vandforsyning	<input type="checkbox"/> Egen boring	<input type="checkbox"/> Egen brønd	<input checked="" type="checkbox"/> Fælles vandværk
3. Skal der indgå flere husstande til anlægget	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Hvis ja, hvor mange _____
4. Størrelsen af arealer, der skal afledes	44.828 _____ m ²		
Befæstede arealer	Veje	4.600 _____	m ²
	Parkeringspladser	_____	m ²
Tagarealer	3.815 _____ m ²		
Anden overflade	36.413 _____ m ²		
5. Skal der føres rør under vej eller jernbane	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Se Regn- og spildevandsplan
6. Placeres hele anlægget på egen grund	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
7. Hvis dele af anlægget placeres på anden persons ejendom – oplyses ejeres navn og adresse (Vedlagt kopi af accept)			
Navn og adresse.			Telefon nr.
Udfyldes kun ved nedsivningsansøgninger.			
8. Afstand til nærmeste vandløb/sø/hav	_____ m		
9. Afstand til nærmeste vandforsyningsboring	_____ m		
10. Er der indenfor 5 m. fra faskine	<input type="checkbox"/> Kælder _____ m	<input type="checkbox"/> Beboet bygning _____ m	
11. Er der indenfor 2 m. fra faskine	Anden bebyggelse _____ m		
12. Afstand til nærmeste skel	_____ m		
13. Er der lavet forundersøgelse af jorden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Jordtype _____ Kornstørrelse _____ µm K-værdi _____ m/s
14. Afstand fra terræn til grundvand	_____ m	Pejlet den ____/____ - 20__	
15. Opbygges anlægget som faskine	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
16. Bliver anlægget opbygget af	<input type="checkbox"/> Singles <input type="checkbox"/> Lerlinker <input type="checkbox"/> Plastkassetter <input type="checkbox"/> Andet		
17. Hulrumsprocenter i faskinen	___ %		
18. Størrelsen på faskine	_____ m ²		

Udfyldes kun ved ansøgning om udledning

19. Navn på vandløb/sø/hav Skifle

20. Er der tilknyttet olieudskiller ja Nej

21. Specifikationer olieudskiller Koalicensfilter Ja Nej
Kapacitet _____ l/s Opsamlingsvolumen _____ m²

22. Nedenstående kan bruges til at skitsere anlægget og bruges som bilag i ansøgningen

5731500#0 - SV: Skærbæk skole - besparelser

Fra: Karen Marie Fisker Langkjer [kml@lytt.dk]
Til: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Cc: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk]; Mogens Husted Kristensen [mhk@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 03-08-2020 13:22
Modtaget Dato: 03-08-2020 13:22
Vedrørende: SV: Skærbæk skole - besparelser
Vedhæftninger: image008_52.png
image009_49.png
image010_46.png
image011_45.png
image012_36.png
image013_18.png
image014_3.jpg
image015_13.png

Hej Kim,

Det er desværre ikke muligt for mig at deltage i møde nu på onsdag.

Hvad med mandag eller tirsdag i uge 33 i stedet?

Mød venlig hilsen / Best Regards

Karen Marie Fisker Langkjer
Arkitekt maa mdl
+45 2265 8902

www.lytt.dk / Aarhus / København

LYTT Urban & Landscape
Architecture

> [Schyyy ... Arkitektfaglig fusion lytter til fremtiden](#)

Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk]
Sendt: 3. august 2020 11:59
Til: Kim Kirkegaard Sørensen; Morten Bramstrup Jakobsen
Cc: Arne Borum Linnet; Mogens Husted Kristensen; Karen Marie Fisker Langkjer
Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Hej Kim

Alt det indvendige har vi jo løbende om projekteret (Det har i også fået faktura på) Der er overhoved ikke rettet noget på alt det udvendige mht. Besparelser i landskabsprojekt.

Alle de besparelser i har lavet på det udvendige skal jo indarbejdes i tegningsarbejdet af landskabsarkitekten.

Jeg vil forslå at vi holder et møde med landskabsarkitekten hvor vi gennemgår alle besparelserne, så de kan indarbejde det i projektet.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Sendt: 3. august 2020 11:06
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Cc: Karen Marie Fisker Langkjer (kml@mgarkitekter.dk) <kml@mgarkitekter.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Hej Henrik

Vi har lige drøftet og vendt den på kontoret.
Du er nød til at uddybe hvad det er i mener der skal indarbejdes?
Er det hele besparelserlisten, indvendig og udvendig eller er det enkelte punkter fra listen?

Venlig hilsen

4902
Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Fra: Henrik Villefrance [<mailto:hv@friis-moltke.dk>]

Sendt: 3. august 2020 10:40

Til: Kim Kirkegaard Sørensen; Morten Bramstrup Jakobsen

Cc: Karen Marie Fisker Langkjer (kml@mgarkitekter.dk); Arne Borum Linnet; Mogens Husted Kristensen; Morten Høier

Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Hej Kim

Alle de besparelser i har lavet skal indarbejdes i projektet så projektet tilsvaret det aftalte med Ent.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Sendt: 3. august 2020 10:13

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Cc: Karen Marie Fisker Langkjer (kml@mgarkitekter.dk) <kml@mgarkitekter.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>

Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Hej Henrik

Kan jeg ikke få dig til at beskrive, hvad det er du mener der skal om projekteres?

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Fra: Henrik Villefrance [<mailto:hv@friis-moltke.dk>]

Sendt: 3. august 2020 10:02

Til: Kim Kirkegaard Sørensen; Morten Bramstrup Jakobsen

Cc: Karen Marie Fisker Langkjer (kml@mgarkitekter.dk); Arne Borum Linnet; Mogens Husted Kristensen; Morten Høier

Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Hej Kim

Hvis landskabsarkitekten ikke får mulighed/honorar for at om projektere hele landskabsprojektet efter besparelser, så overtager Tønderkommune projekterings ansvaret for projekteringen og opfølgning.

Skal jeg igangsætte om projektering af landskabsprojektet på medgået tid ?

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

4903

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Sendt: 29. juli 2020 11:03

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Karen Marie Fisker Langkjer (<kml@mgarkitekter.dk> <kml@mgarkitekter.dk>); Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>

Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Hej Henrik

Tønder Kommune ønsker ikke at overtage rådgivningsarbejdet i forbindelse med besparelsesrunden, derfor har Friis og Moltke også være inviteret til de afholdte besparelsemøder på byggepladsen.

Vedr. Landskabsprojektet se Tønder kommune ikke at besparelserne ændre projektet i en sådan grad, at dette kræver en opretning eller omprojektering.

Hertil forventer Tønder Kommune at Friis og Moltke informere, såfremt besparelserne kræve opretning eller ikke kan godkendes.

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent

Ejendomme

Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Fra: Henrik Villefrance [<mailto:hv@friis-moltke.dk>]

Sendt: 9. juli 2020 08:57

Til: Kim Kirkegaard Sørensen; Morten Bramstrup Jakobsen

Cc: Arne Borum Linnet; Karen Marie Fisker Langkjer (<kml@mgarkitekter.dk>); Mogens Husted Kristensen

Emne: Skærbæk skole - besparelser

Hej Kim

Som opfølgning på besparelser runden har vi forståelse for at kommunen gerne selv vil forestå dele af rådgiverarbejdet, og såfremt de selv forestår rådgivningsydelser vedr. ændringer, herunder ændringer i projekt, tilsyn m.v. påtager de sig samtidig rådgiveransvaret.

Hvis vi skal lave en opretning af eks. Landskabsprojektet vil vi gerne høre herom, dette vil være ekstra og honoreret på medgået tid.

Med venlig hilsen | Kind regards

FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 57

hv@friis-moltke.dk



Aaboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk

Facebook · LinkedIn

LYTT Urban & Landscape
Architecture













RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

 FRIIS & MOLTKE
ARCHITECTS

5728205#0 - SSK - Detalje ved ovenlys

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]
Til: 'Arne Borum Linnet' [al@fmbyggningsdrift.dk]
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Sendt dato: 03-08-2020 14:20
Modtaget Dato: 03-08-2020 14:20
Vedrørende: SSK - Detalje ved ovenlys
Vedhæftninger: image001_121.png
image002_121.png
image003_122.png
image004_123.png
image005_122.png
image006_85.jpg

Hej Arne.

Det er den eneste detalje jeg lige falder over ved ovenlys. Umiddelbart vil man jo tro det udført som tegnet. Jeg tænker vi tager spørgsmålet med i morgen. Forhåbentlig er der en reel detalje.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk















RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5730809#0 - SV:SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsu

Fra: Henning Skriver [hs@kraftman.dk]
Til: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]; Arne Borum Linnet [al@fmbyggningsdrift.dk]; Palle Kudsk [PKU@toender.dk]; Kraftman Tømrer og Snedker [ts@kraftman.dk]
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Arne Borum Linnet (al@fmbyggningsdrift.dk) [al@fmbyggningsdrift.dk]; Esben Jessen [beregner@kraftman.dk]
Sendt dato: 03-08-2020 14:36
Modtaget Dato: 03-08-2020 14:36
Vedrørende: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?
Vedhæftninger: image001_127.jpg
image002_391.png

Hej henrik

Går ud fra at du har det endelige med i morgen – inkl farver og glas/lyd etc... VI kan ikke vente mere
Vi må og skal have det endelige materiale NU

Mødet er i morgen kl 13

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T: 74622060
F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henning Skriver
Sendt: 3. august 2020 08:59
Til: Henrik Villefrance; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Der er møde kl 13 i morgen som tidligere aftalt

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T: 74622060
F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk]
Sendt: 3. august 2020 08:58
Til: Henning Skriver; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Som jeg har sagt før så deltager jeg gerne i et møde med din dør producent hvis der er spørgsmål.

Den hvide er samme farve som i udbud
Den sorte er på ønske fra bygherre lavet om til mørk grå, som vi snakkede om på sidste byggemøde.

4920
Med venlig hilsen | Kind regards

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Sendt: 10. juli 2020 12:23

Til: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Arne

Hele verden er forvirret i det nye dørschema er alle farver rettet til 9016
Nu skal I lige passe på for så passer ståldøre ikke til idealcombi og ej heller til alu/alu døre
Udhusedøre og er også rettet selv om de er leveret og monteret i ral 9004

Jeg ser mig ikke i stand til at bestille inden jeg har et retvisende udbud – herunder
Hvis jeg har noget i dag – kan jeg sikkert leverer uge 38 (døre) og glaspartier uge 40

Jeg rykker og rykker – siden januar og vi er ikke i mål endnu

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S

T: 74622060

F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>

Sendt: 10. juli 2020 08:25

Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Cc: hv@friis-moltke.dk; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Emne: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Jeg vil blot lige høre nærmere ind til leveringstiden på dørene som vi snakkede om efter byggemødet i tirsdags.

Er dørene bestilt + indvendige glaspartier?

Jeg forstod på mødet at Bygma kunne reducerer de 10-12 uger. Men var siger ordrebekræftelsen ift. leveringsuge som jeg kan tilrette tidsplanen efter?

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet
Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923

Mail: al@fmbygningsdrift.dk

Web: www.fmbygningsdrift.dk



Hovedkontor:
FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:
FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg



Solidt byggeri ...

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

5730802#0 - VS Multitek-Skærbæk Skole

Fra: Henning Skriver [hs@kraftman.dk]
Til: Esben Jessen [beregner@kraftman.dk]; Jan M. Løper [adm@kraftman.dk]
Cc: Arne Borum Linnet (al@fmbyggningsdrift.dk) [al@fmbyggningsdrift.dk]; Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk) [hv@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 03-08-2020 14:53
Modtaget Dato: 03-08-2020 14:53
Vedrørende: VS: Multitek-Skærbæk Skole
Vedhæftninger: 3727_001.pdf
image001_126.jpg

Rykker i for svar på aftaleseddel så disse kan bestilles – det var de aftalesedler vi lavede med besætning på udv. ståldøre

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T: 74622060
F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Ulrik Petersen [mailto:upe@davidsen.as]
Sendt: 16. juli 2020 09:52
Til: Esben Jessen
Cc: Claus Lassen; Henning Skriver
Emne: Multitek-Skærbæk Skole

Hej Esben

Sender Korrektion 3 vedr. Skærbæk Skole

Bemærk Sidste rettefrist 31/7 2020

Har sat Claus på CC, da jeg er på ferie i uge 31-32☺

Med venlig hilsen

Ulrik Petersen
Sælger

Direkte +45 73666683
Mobil +45 20806733

Davidsens Tømmerhandel A/S
Brunde Vest 12
6230 Rødekro
□□□□

Fra: scanner_roedekro@davidsen.as <scanner_roedekro@davidsen.as>
Sendt: 16. juli 2020 09:44
Til: Ulrik Petersen <upe@davidsen.as>
Emne: Attached Image

Davidsen Tømmerhandel A/S
Brunde Vest 12
6230 Rødekro

Att.: Ulrik Petersen , upe@davidsen.as

Kundenr.: 73666699

16-07-2020

Korrektion 3: Rettefrist flyttet til 31-7-20 , lev.tid uge 38

Ordrebekræftelse nr.: 94408 Rekvnr.: 3035760 - Vedr.: Skærbæk Skole

Hermed bekræftes modtagelsen af Deres ordre. De bedes omgående kontakte os såfremt nedennævnte specifikationer ikke stemmer overens med det bestilte. Ordren betragtes som godkendt og produktionen påbegyndes, hvis vi ikke har hørt fra dem inden 31-7-20

Venligst kontroller hulmål igen


Venligst tilret karmdybder efter projekt

Ikke kontrolleret med beslagssæt der er kun ref.til beslagssæt på 2 af dørene

Pos.:1 311011 (UD.0.12)
1 stk. 2-fløjet sidehængt isoleret ståldør, ligedelt, uden brandkrav.
Døren er udvendig, udadgående og hængslet i højre side.
Udføres i Aluzink belagt stålplade.
Murhulsmål BxH: 1810 x 2195 mm.
Udv karmsmål BxH: 1790 x 2185 mm.
Dørblad: Dørbladstykkelse 65 mm x pladetykkelse 1.25 mm.
Overfalset på 3 sider og med flad bund.
Karmtype: 8214, med integreret tætning, til fugning fra begge sider.
Pladetykkelse 2 mm. Dybde: 170 mm.
Vandnæse i top af karm.
Bundtype: Anslagstærskel, med tætning under dørblad.
Låsekasse: Ruko 565 / Dorma DL 712.
Greb: Excl.
Paskvil: Stangpaskvil monteret modsat hængselssiden. Excl. dørvälger.
Excl.: Cylinder, cylindertilbehør, dørpumpe og andet beslag.
Nettopris excl. montage: Kr. pr. stk.
Tillæg for færdigmaling i vor standard RAL 9004 Signalsort svarende til korrosionsklasse 2
Nettopris excl. montage: Kr. pr. stk.
Fortsættes...


Multi-Tek A/S
Holger Danskes Vej 17
DK-8960 Randers SO
www.multitek.dk
Tlf: +45 8711 0090
Fax: +45 8641 0682
CVR/Nr. DK11573975

Bemærk venligst at kontoret er lukket fredag d. 22. maj ifm Kr.Himmelfartsdag

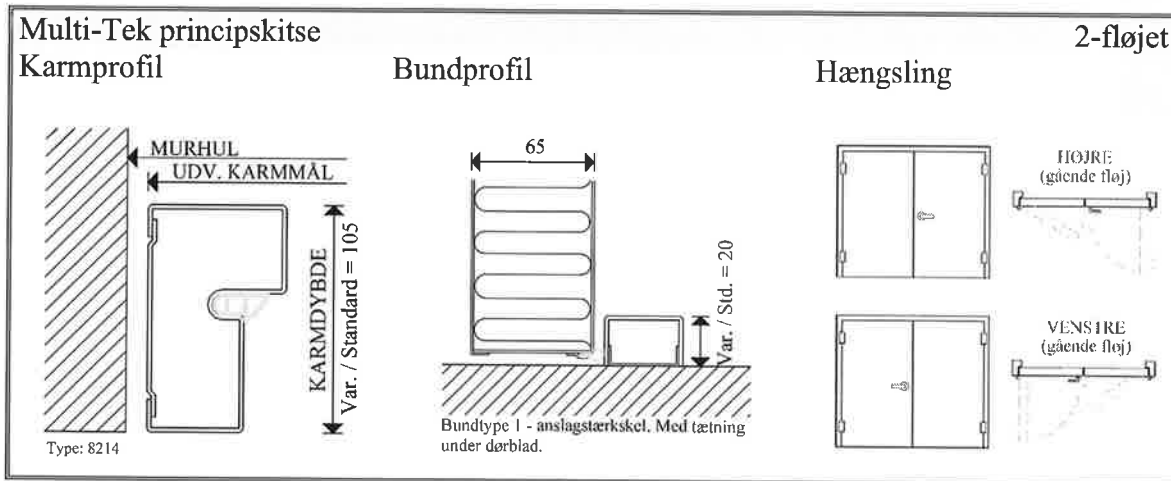


Fortsættes...

- Pos.:2 311012 (UD.0.011)**
1 stk. 2-fløjet sidehængt BS60 ståldør, ligedelt, fremstillet i henhold til DS 1052.2.
Døren er udvendig, udadgående og hængslet i højre side.
Udføres i Aluzink belagt stålplade.
- Murhulsmål BxH: 1810 x 2185 mm.
Udv karmsmål BxH: 1790 x 2175 mm.
Dørblad: Dørbladstykkelse 65 mm x pladetykkelse 1.25 mm.
Overfalset på 3 sider og med flad bund.
- Karmtype: 8214, med integreret tætning, til fugning fra begge sider.
Pladetykkelse 2 mm. Dybde: 170 mm.
Vandnæse i top af karm.
- Bundtype: Anslagstærskel, med tætning under dørblad
Låsekasse: Ruko 560 / Dorma DL 710
Dørpumpe: Dorma TS93G til montage modsat hængselsiden
Dørvælger: Multi-Tek standard
Greb: Excl. (smalprofil)
Paskvil: Automatisk smækpaskvil med paskvilgreb monteret modsat hængselsside
Excl.: Cylinder, cylindertilbehør (NB Smalprofil) og andet beslag.
- Nettopris excl. montage: Kr. pr. stk.
Tillæg for færdigmaling i vor standard RAL 9004 Signalsort svarende til korrosionsklasse 2
Nettopris excl. montage: Kr. pr. stk.

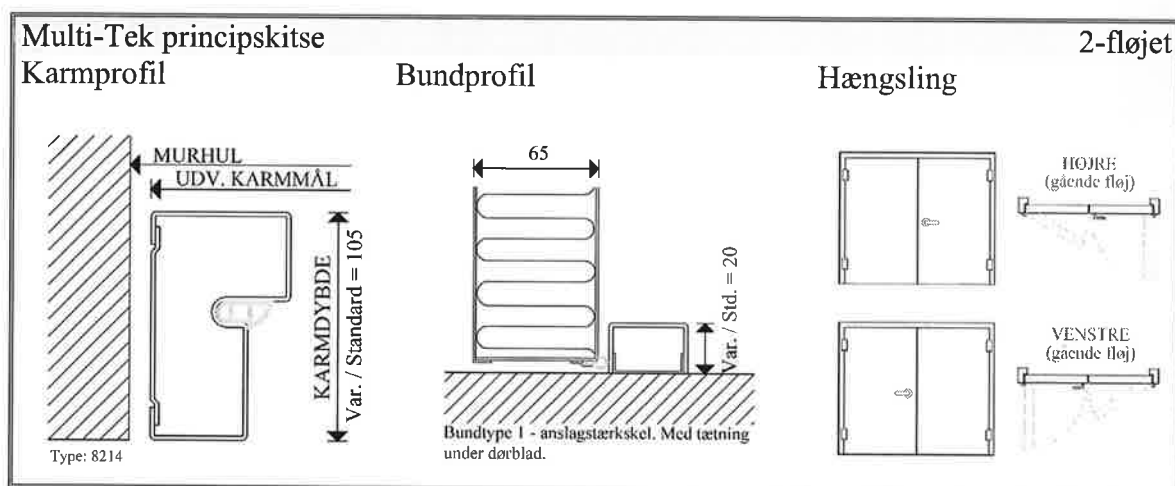


Fortsættes...

- Pos.:2A 311012 (UD.0.061)**
1 stk. 2-fløjet sidehængt BS60 ståldør, ligedelt, fremstillet i henhold til DS 1052.2.
Døren er udvendig, udadgående og hængslet i højre side.
Udføres i Aluzink belagt stålplade.
- Murhulsmål BxH: 1810 x 2190 mm.
Udv karmsmål BxH: 1790 x 2180 mm.
- Dørblad: Dørbladstykkelser 65 mm x pladetykkelse 1.25 mm.
Overfalsset på 3 sider og med flad bund.
- Rør i dørblad samt karmoverføring**
- Karmtype: 8214, med integreret tætning, til fugning fra begge sider.
Pladetykkelse 2 mm. Dybde: 115 mm.
Vandnæse i top af karm.
- Bundtype: Anslagstærskel, med tætning under dørblad
- Låsekasse: **Ruko EL580 magnetlås med 6 mtr.kabel**
- Dørpumpe: Dorma TS93G til montage modsat hængselsiden
- Dørvælger: Multi-Tek standard
- Greb: Excl. (smalprofil)
- Paskvil: Automatisk smækpaskvil med paskvilgreb monteret modsat hængselsside
- Excl.: Cylinder, cylindertilbehør (NB Smalprofil) og andet beslag.
- Nettopris excl. montage: Kr. pr. stk.
- Tillæg for færdigmaling i vor standard RAL 9004 Signalsort svarende til korrosionsklasse 2
- Nettopris excl. montage: Kr. pr. stk.

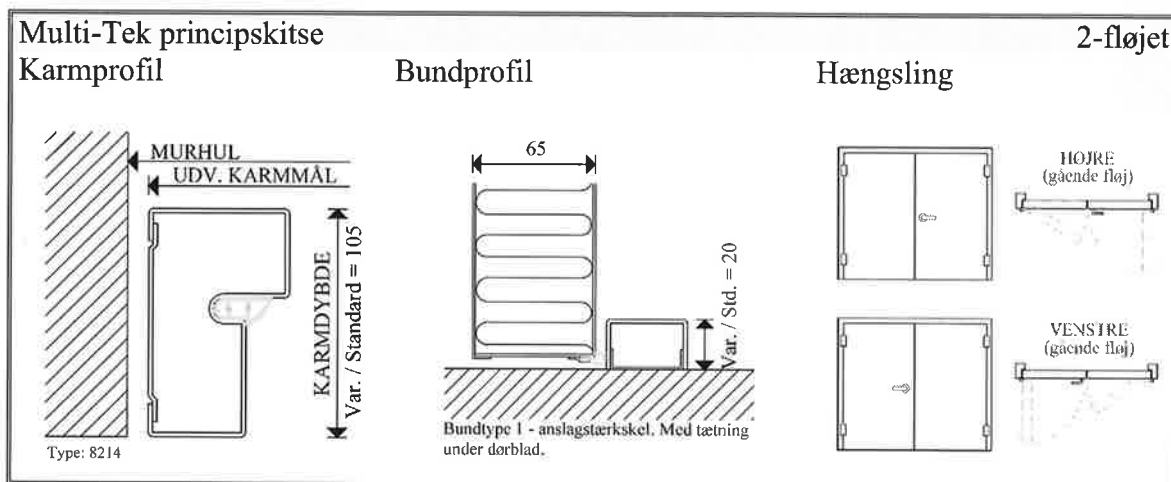

Fortsættes...

- Pos.:3** **311013 ADK (UD.0.026)**
1 stk. 2-fløjet sidehængt isoleret ståldør, ligedelt, uden brandkrav.
Døren er udvendig, udadgående og hængslet i højre side.
Udføres i Aluzink belagt stålplade.
- Murhulsmål BxH: 2030 x 2198 mm.
Udv karmsmål BxH: 2010 x 2188 mm.
Dørblad: Dørbladstykkelser 65 mm x pladetykkelse 1.25 mm.
Overfalset på 3 sider og med flad bund.
Rør i dør blad samt karmoverføring
- Karmtype: 8214, med integreret tætning, til fugning fra begge sider.
Pladetykkelse 2 mm. Dybde: 200 mm.
Vandnæse i top af karm.
- Bundtype: Anslagstærskel, med tætning under dørblad
Låsekasse: Ruko EL580 magnetlås med 6 mtr.kabel
Dørpumpe: Dorma TS93G til montage modsat hængselsiden (kum på gående fløj)
Greb: Excl.
Paskvil: Stangpaskvil monteret modsat hængselside. Excl. dør vælger.
Excl.: Cylinder, cylindertilbehør, og andet beslag.
- Nettopris excl. montage: Kr. pr. stk.
Tillæg for færdigmaling i vor standard RAL 9004 Signalsort svarende til korrosionsklasse 2
Nettopris excl. montage: Kr. pr. stk.

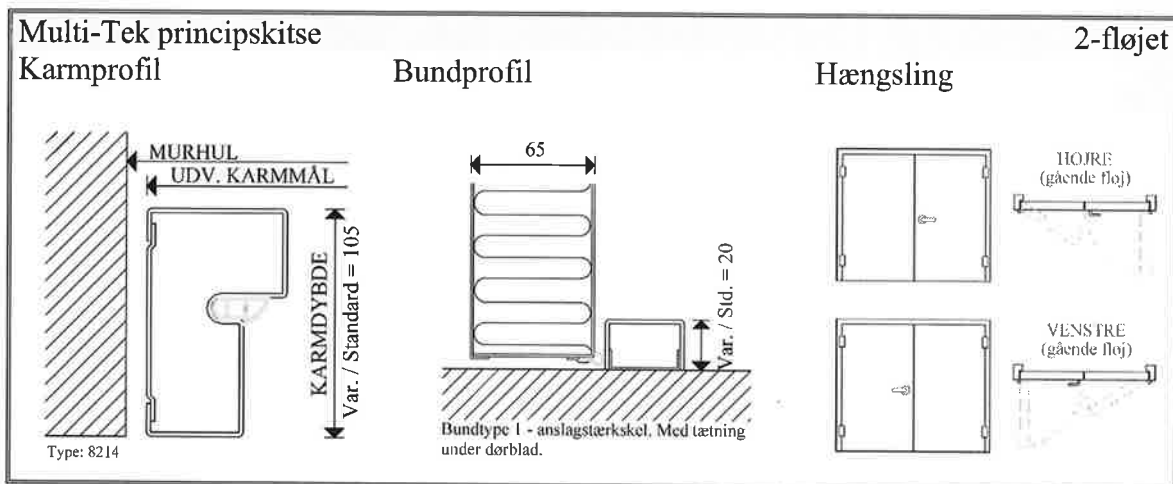

Fortsættes...

Pos.:4 **311014 (UD.0.005 , UD.0.006)**
2 stk. 1-fløjet sidehængt isoleret ståldør uden brandkrav.
Døren er udvendig, udadgående og hængslet i 2 stk.højre side.
Udføres i Aluzink belagt stålplade.

Murhulsmål BxH: 1010 x 2195 mm.

Udv karmsmål BxH: 990 x 2185 mm.

Dørblad: Dørbladstykkelse 65 mm x pladetykkelse 1.25 mm.
Overfalset på 3 sider og med flad bund.

Karmtype: 8214, med integreret tætning, til fugning fra begge sider.
Pladetykkelse 2 mm. Dybde: 200 mm.
Vandnæse i top af karm.

Bundtype: Anslagstærskel, med tætning under dørblad

Låsekasse: Ruko 565 / Dorma DL 712


Greb: Excl.

Excl.: Cylinder, cylindertilbehør, dørpumpe og andet beslag.

Nettopris excl. montage: Kr. pr. stk.


Tillæg for færdigmaling i vor standard RAL 9004 Signalsort svarende til korrosionsklasse 2

Nettopris excl. montage: Kr. pr. stk.

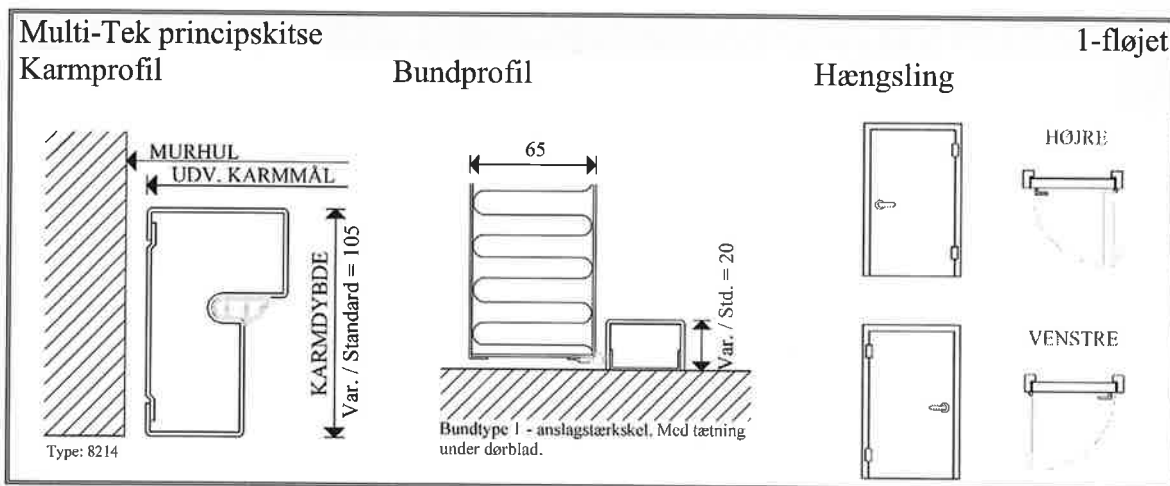

Fortsættes...

- Pos.:5 311012 (UD.0.037)**
1 stk. 2-fløjet sidehængt BS60 ståldør, ligedelt, fremstillet i henhold til DS 1052.2.
Døren er udvendig, udadgående og hængslet i højre side.
Udføres i Aluzink belagt stålplade.
- Murhulsmål BxH: 1845 x 2215 mm.
Udv karmsmål BxH: 1825 x 2205 mm.
Dørblad: Dørbladstykkelse 65 mm x pladetykkelse 1.25 mm.
Overfalset på 3 sider og med flad bund.
Karmtype: 8214, med integreret tætning, til fugning fra begge sider.
Pladetykkelse 2 mm. Dybde: 170 mm.
Vandnæse i top af karm.
- Bundtype: Anslagstærskel, med tætning under dørblad
Låsekasse: Ruko 560 / Dorma DL 710
Dørpumpe: Dorma TS93G til montage modsat hængselsiden
Dørvælger: Multi-Tek standard
Greb: Excl. (smalprofil)
Paskvil: Automatisk smækpaskvil med paskvilgreb monteret modsat hængselsside
Excl.: Cylinder, cylindertilbehør (NB Smalprofil) og andet beslag.
- Nettopris excl. montage: Kr. pr. stk.
Tillæg for færdigmaling i vor standard RAL 9004 Signalsort svarende til korrosionsklasse 2
Nettopris excl. montage: Kr. pr. stk.

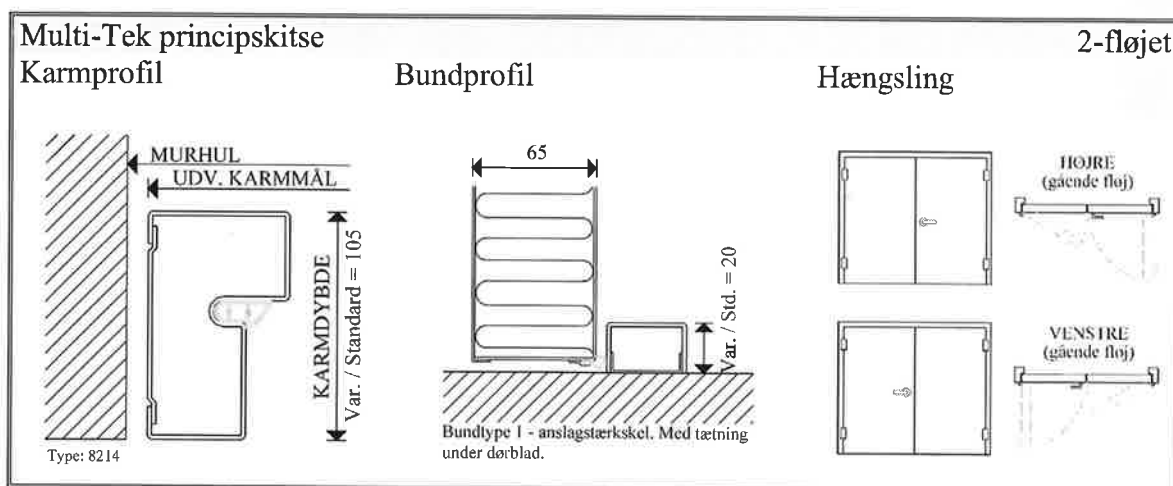

Fortsættes...

Pos.:6 Omfatter montage i Skærbæk

Fugning er excl.

7 stk.

Montageprisen er forudsat, at byggepladsen er af en sådan beskaffenhed, at MULTI-TEKs montører kan foretage montagen i en arbejdsgang og at der stilles løftegrej (kran ell. truck) til rådighed for både aflæsning og montage, hvis påkrævet. Såfremt vor montørbil ikke kan køre direkte til montagestedet, bedes De give MULTI-TEK oplysning om adgangsforholdene.

Ved levering af ABDL-anlæg, udleveres komponenterne til en på byggepladsen forud aftalt person, ingen af komponenterne monteres af MULTI-TEKs montører. Vores karme leveres som standard uisolerede, og isolering af karmene foretages af montøren på pladsen. Såfremt karmene efterfølgende skal udstøbes med beton, SKAL besked om dette gives inden vor montør påbegynder arbejdet. Montagen er excl. bagstopning, fugning og tilstøbning hvis ikke andet er angivet. Såfremt der måtte opstå uforudsete problemer i forbindelse med montagen, forbeholder vi os ret til at viderefakturere eventuelle meromkostninger.

Nettopris

Fortsættes...

Leveringsadresse: Skærbæk Skole, Hjemstedvej 35-37, Kraftman A/S,
6780 Skærbæk
Att.: Rikke 31747800

Levering sker fragtfrit,
med samlet afsendelse i: **Uge 38**

Levering ved kunde forudsætter, at der er farbar vej til aflæsningssted og om nødvendigt løftegrej. I modsat fald leveres varerne til nærmeste fragtcntral, hvilket medfører ekstraudgifter for køber.

Det er købers ansvar at sikre sig, at emner ordres i en korrosionsklasse passende til miljøet på montagedstedet.

Priserne er excl. moms og i øvrigt i henhold til salgs- og leveringsbetingelser for danske leverandører af stålbranddøre.

Med venlig hilsen
Multi-Tek A/S

Jørgen Østergård Jensen
Direkte tel.: 31180971



Solidt byggeri ...

5730696#0 - SV: Løfter

Fra: Ingri B. Løvsbogen [ibl@friis-moltke.dk]
Til: Esben Jessen [beregner@kraftman.dk]; Arne Borum Linnet [al@fmbyggningsdrift.dk]; Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Palle Kudsk [PKU@toender.dk]; Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Cc: Jesper S. Hansen [jh@kraftman.dk]; Henning Skriver [hs@kraftman.dk]
Sendt dato: 03-08-2020 15:04
Modtaget Dato: 03-08-2020 15:04
Vedrørende: SV: Løfter
Vedhæftninger: image003_16.jpg
image004_5.jpg
image005_3.jpg

Hej Esben,

I køkkenet skal der være mineraluldsloft hygiejne som beskrevet, 600x600 synlig skinnessystem.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvsbogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ibl@friis-moltke.dk



 **Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail**
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!

Fra: Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>
Sendt: 10. juli 2020 13:36
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>
Cc: Jesper S. Hansen <jh@kraftman.dk>; Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Emne: Løfter

Hej Arne.

Iht til samtale lige nu, jf udbudstegninger og beskrivelse, så er dette tegnet som mineraluld lofter - dette arbejder vi videre med. – revision 13, skriver de pludseligt gipslofter med huller og film. Dette er bygningsdel 351001.

Jeg går ud fra at toiletkerner også er mineraluld lofter for lethedens til adgang til servicefag. – hører vi ikke andet, bestilles dette d.d. Dog tager vi en prøve med efter sommerferie.

GOD FERIE 😊

Esben M. Jessen
Beregner / KS

KRAFTMAN A/S
Dir: 6023 1825



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk



 FRIIS & MOLTKE
ARCHITECTS



Solidt byggeri ...



5732155#0 - SSK - Møde vedr. CTS til procesudbygning

Fra: Kasper Bornstein Larsen [kbl@taekker.dk]
al@fmbygningsdrift.dk [al@fmbygningsdrift.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Morten Bramstrup
Til: Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]; Michael.k.morthensen@bravida.dk
[Michael.k.morthensen@bravida.dk]; Morten Høier [moh@taekker.dk]
Sendt dato: 03-08-2020 21:42
Modtaget Dato: 03-08-2020 21:42
Vedrørende: SSK - Møde vedr. CTS til procesudbygning

Hej Alle.

Michael fra Bravida er kommet til skade. Så vi er nødsaget til at udskyde mødet. Michael og jeg har aftalt at vi tager en snak i telefon, så vi kan holde gang i emnet.

Vh
Kasper

SSK - Møde vedr. CTS til procesudbygning

Planlagt: tirsdag den 4. aug. 2020 fra 09.00 til 11.00

Lokalitet: SSK mødevogn

Gæster: Arne Borum Linnet, kimkir@toender.dk, mobj2@toender.dk, sb32@toender.dk, Michael.k.morthensen@bravida.dk, Morten Høier

Sendt fra min iPhone

5730724#0 - SV:SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsu

Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Henning Skriver [hs@kraftman.dk]; Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk]; Palle Kudsk [PKU@toender.dk]; Kraftman Tømrer og Snedker [ts@kraftman.dk]
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk) [al@fmbygningsdrift.dk]; Esben Jessen [beregner@kraftman.dk]
Sendt dato: 04-08-2020 07:49
Modtaget Dato: 04-08-2020 07:49
Vedrørende: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?
Vedhæftninger: image001_120.jpg
image002_379.png

Hej Henning

Jeg forstår ikke hvad i nu mangler

Er det hele ikke noteret på belåning / dørskema ?

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Sendt: 3. august 2020 14:36
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk) <al@fmbygningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej henrik

Går ud fra at du har det endelige med i morgen – inkl farver og glas/lyd etc... VI kan ikke vente mere
Vi må og skal have det endelige materiale NU

Mødet er i morgen kl 13

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T:74622060
F:7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henning Skriver
Sendt: 3. august 2020 08:59
Til: Henrik Villefrance; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Der er møde kl 13 i morgen som tidligere aftalt

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T:74622060
F:7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henrik Villefrance [<mailto:hv@friis-moltke.dk>]
Sendt: 3. august 2020 08:58
Til: Henning Skriver; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Som jeg har sagt før så deltager jeg gerne i et møde med din dør producent hvis der er spørgsmål.

Den hvide er samme farve som i udbud
Den sorte er på ønske fra bygherre lavet om til mørk grå, som vi snakkede om på sidste byggemøde.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Sendt: 10. juli 2020 12:23
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>
Cc: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Arne

Hele verden er forvirret i det nye dørschema er alle farver rettet til 9016
Nu skal I lige passe på for så passer ståldøre ikke til idealcombi og ej heller til alu/alu døre
Udhusedøre og er også rettet selv om de er leveret og monteret i ral 9004

Jeg ser mig ikke i stand til at bestille inden jeg har et retvisende udbud – herunder
Hvis jeg har noget i dag – kan jeg sikkert leverer uge 38 (døre) og glaspartier uge 40

Jeg rykker og rykker – siden januar og vi er ikke i mål endnu

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T: 74622060
F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Sendt: 10. juli 2020 08:25
Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Cc: hv@friis-moltke.dk; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Emne: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Jeg vil blot lige høre nærmere ind til leveringstiden på dørene som vi snakkede om efter byggemødet i tirsdags.
Er dørene bestilt + indvendige glaspartier?
Jeg forstod på mødet at Bygma kunne reducerer de 10-12 uger. Men var siger ordrebekræftelsen ift. leveringsuge som jeg kan tilrette tidsplanen efter?

4941
Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923

Mail: al@fmbyggningsdrift.dk

Web: www.fmbyggningsdrift.dk

FM Bygningsdrift

Logistik & Rådgivning

Hovedkontor:

FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:

FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg



Solidt byggeri ...

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

5730727#0 - SV:SSK - Indvendige døre, glaspartier - Leveringsu

Fra: Henning Skriver [hs@kraftman.dk]
Til: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]; Arne Borum Linnet [al@fmbyggningsdrift.dk]; Palle Kudsk [PKU@toender.dk]; Kraftman Tømrer og Snedker [ts@kraftman.dk]
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Arne Borum Linnet (al@fmbyggningsdrift.dk) [al@fmbyggningsdrift.dk]; Esben Jessen [beregner@kraftman.dk]
Sendt dato: 04-08-2020 07:56
Modtaget Dato: 04-08-2020 07:56
Vedrørende: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?
Vedhæftninger: image001_122.jpg
image002_382.png

Godmorgen Henrik

Hvis du læser tråden herunder – er farver vel forkerte og det rigtige ral nummer skal fremgå _ vi snakker varer til +2,8 mio – jeg vil ikke gætte mig til sagen

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T: 74622060
F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Sendt: 4. august 2020 07:49

Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet (al@fmbyggningsdrift.dk) <al@fmbyggningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Jeg forstår ikke hvad i nu mangler

Er det hele ikke noteret på belåning / dørskema ?

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Sendt: 3. august 2020 14:36

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet (al@fmbyggningsdrift.dk) <al@fmbyggningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej henrik

Går ud fra at du har det endelige med i morgen – inkl farver og glas/lyd etc... VI kan ikke vente mere
Vi må og skal have det endelige materiale NU

Mødet er i morgen kl 13

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S

T:74622060

F:7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henning Skriver

Sendt: 3. august 2020 08:59

Til: Henrik Villefrance; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Der er møde kl 13 i morgen som tidligere aftalt

Med venlig hilsen

Henning Skriver

BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S

T:74622060

F:7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henrik Villefrance [<mailto:hv@friis-moltke.dk>]

Sendt: 3. august 2020 08:58

Til: Henning Skriver; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Som jeg har sagt før så deltager jeg gerne i et møde med din dør producent hvis der er spørgsmål.

Den hvide er samme farve som i udbud

Den sorte er på ønske fra bygherre lavet om til mørk grå, som vi snakkede om på sidste byggemøde.

Med venlig hilsen | Kind regards

FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Sendt: 10. juli 2020 12:23

Til: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Arne

Hele verden er forvirret i det nye dørschema er alle farver rettet til 9016

Nu skal I lige passe på for så passer ståldøre ikke til idealcombi og ej heller til alu/alu døre

Udhusedøre og er også rettet selv om de er leveret og monteret i ral 9004

Jeg ser mig ikke i stand til at bestille inden jeg har et retvisende udbud – herunder

Hvis jeg har noget i dag – kan jeg sikkert leverer uge 38 (døre) og glaspartier uge 40

Jeg rykker og rykker – siden januar og vi er ikke i mål endnu

Med venlig hilsen

Henning Skriver

KRAFTMAN A/S

T: 74622060

F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Sendt: 10. juli 2020 08:25

Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Cc: hv@friis-moltke.dk; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Emne: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Jeg vil blot lige høre nærmere ind til leveringstiden på dørene som vi snakkede om efter byggemødet i tirsdags.

Er dørene bestilt + indvendige glaspartier?

Jeg forstod på mødet at Bygma kunne reducerer de 10-12 uger. Men var siger ordrebekræftelsen ift. leveringsuge som jeg kan tilrette tidsplanen efter?

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923

Mail: al@fmbyggningsdrift.dk

Web: www.fmbyggningsdrift.dk



Hovedkontor:

FM Byggningsdrift ApS

Bryggergade 6A, 1.

7400 Herning

Afdeling Sverige:

FM Management AB

Bergaliden 11

252 23 Helsingborg



Solidt byggeri ...

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

5730725#0 - SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsu

Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Henning Skriver [hs@kraftman.dk]; Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk]; Palle Kudsk [PKU@toender.dk]; Kraftman Tømrer og Snedker [ts@kraftman.dk]
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk) [al@fmbygningsdrift.dk]; Esben Jessen [beregner@kraftman.dk]
Sendt dato: 04-08-2020 08:18
Modtaget Dato: 04-08-2020 08:18
Vedrørende: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?
Vedhæftninger: 12150-2_Skærbæk_skole_Beslagsæt.doc
Dørskema.pdf
image001_121.jpg
image002_380.png

Hej Morten

Jeg ved ikke om i har aftalt andet nede på byggepladsen, men aftalen på sidste byggemøde jeg var med til var at dørene skulle males i ral 7016 og 9016 som det fremgår af dørskemaet.

Ahh Henning du skal vel ikke gætte. Du er vist mere Rasmus modsat i stedet for at få det til at glide. 😊

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Sendt: 4. august 2020 07:57
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk) <al@fmbygningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Godmorgen Henrik

Hvis du læser tråden herunder – er farver vel forkerte og det rigtige ral nummer skal fremgå _ vi snakker varer til +2,8 mio – jeg vil ikke gætte mig til sagen

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T: 74622060
F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Sendt: 4. august 2020 07:49
Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk) <al@fmbygningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Jeg forstår ikke hvad i nu mangler

Er det hele ikke noteret på belåning / dørskema ?

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

4950

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Sendt: 3. august 2020 14:36

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej henrik

Går ud fra at du har det endelige med i morgen – inkl farver og glas/lyd etc... VI kan ikke vente mere Vi må og skal have det endelige materiale NU

Mødet er i morgen kl 13

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S

T: 74622060

F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henning Skriver

Sendt: 3. august 2020 08:59

Til: Henrik Villefrance; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Der er møde kl 13 i morgen som tidligere aftalt

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S

T: 74622060

F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henrik Villefrance [<mailto:hv@friis-moltke.dk>]

Sendt: 3. august 2020 08:58

Til: Henning Skriver; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Som jeg har sagt før så deltager jeg gerne i et møde med din dør producent hvis der er spørgsmål.

Den hvide er samme farve som i udbud

Den sorte er på ønske fra bygherre lavet om til mørk grå, som vi snakkede om på sidste byggemøde.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Sendt: 10. juli 2020 12:23

Til: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Arne

Hele verden er forvirret i det nye dørschema er alle farver rettet til 9016
Nu skal I lige passe på for så passer ståldøre ikke til idealcombi og ej heller til alu/alu døre
Udhudsdøre og er også rettet selv om de er leveret og monteret i ral 9004

Jeg ser mig ikke i stand til at bestille inden jeg har et retvisende udbud – herunder
Hvis jeg har noget i dag – kan jeg sikkert leverer uge 38 (døre) og glaspartier uge 40

Jeg rykker og rykker – siden januar og vi er ikke i mål endnu

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S

T: 74622060

F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Sendt: 10. juli 2020 08:25

Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Cc: hv@friis-moltke.dk; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Emne: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Jeg vil blot lige høre nærmere ind til leveringstiden på dørene som vi snakkede om efter byggemødet i tirsdags.

Er dørene bestilt + indvendige glaspartier?

Jeg forstod på mødet at Bygma kunne reducerer de 10-12 uger. Men var siger ordrebekræftelsen ift. leveringsuge som jeg kan tilrette tidsplanen efter?

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923

Mail: al@fmbyggningsdrift.dk

Web: www.fmbyggningsdrift.dk



Hovedkontor:

FM Byggningsdrift ApS

Bryggergade 6A, 1.

7400 Herning

Afdeling Sverige:

FM Management AB

Bergaliden 11

252 23 Helsingborg

Beslagsæt

Revision nr.	2	Consultant	Jan Røssner
Dato	01/07/2020	E-mail	jan.roessner@assaabloy.com
Oprettet dato	26/05/2020	Prisliste ID	01/05/2020

SET 1.1 EI2 30/60-C, dørlukker, aflåselig. cy/vr

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle t	3	stk
ASSA ABLOY	920007	Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. slutblik,	mat forzink et	1	stk
ASSA ABLOY	197506	Triton 401 ovalcylinder, TS1660	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951405	Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv højde cyl. ring AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	930859	DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 sølv (2018)		1	stk

Total antal døre 3

Dør-nr. ID.0.057, ID.0.082, ID.1.065

Noter

Hængsler evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre.

Højde på cylinderring skal angives.

Alt beslag skal leveres komplet med skruer.

SET 2.0 Toilettdør med toiletbesætning

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle t	3	stk
ASSA ABLOY	920078	Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. slutblik	mat forzink et	1	stk
ASSA ABLOY	954545	ScanFlex dørstop 85 mm	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951542	Ruko-Line toiletmarkering 3002 AISI 316L	rustfrit stål	1	stk

Total antal døre 44

Dør-nr. ID.0.013, ID.0.014, ID.0.015, ID.0.016, ID.0.017, ID.0.018, ID.0.034, ID.0.035, ID.0.036, ID.0.037, ID.0.038, ID.0.039, ID.0.040, ID.0.063, ID.0.064, ID.0.065, ID.0.067, ID.0.068, ID.0.077, ID.0.078, ID.0.095, ID.1.010, ID.1.011, ID.1.012, ID.1.013, ID.1.014, ID.1.015, ID.1.016, ID.1.017, ID.1.026, ID.1.027, ID.1.028, ID.1.029, ID.1.030, ID.1.031, ID.1.032, ID.1.055, ID.1.056, ID.1.057, ID.1.059, ID.1.060, ID.1.067, ID.1.068, ID.1.075

Noter

*) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

SET 3.0 EI2 30/60-C, dørlukker, aflåselig. cy/cy

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle	3	stk
ASSA ABLOY	920007	Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. slutblik,	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	197512	Triton 401 rokoko cylinder TS2602	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951435	3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm indv. og udv. cyl ring	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	930859	DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 sølv (2018)		1	stk

Total antal døre 4

Dør-nr. ID.0.019, ID.0.021, ID.0.047, ID.0.052

Noter

Fasthold må ikke monteres på branddøre

Alt beslag skal leveres med skruer

Fasthold må ikke monteres på branddøre.

Højde på cylinderring skal angives.

SET 4.0 Uklas, uaflåselig. Bl.

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle	3	stk
ASSA ABLOY	927000	Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl. slutblik	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951531	Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk

Total antal døre 25

Dør-nr. ID.0.049, ID.0.062, ID.0.066, ID.0.075, ID.0.079, ID.0.084, ID.0.088, ID.0.090, ID.0.092, ID.0.094, ID.0.097, ID.0.106, ID.0.107, ID.0.116, ID.1.009, ID.1.033, ID.1.044, ID.1.058, ID.1.076, ID.1.077, ID.1.078, ID.1.079, ID.1.093, ID.1.094, ID.1.101

Noter

*) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

SET 5.0 Ukla./EI2 30, dørlukker, uafåselig. Bl.

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle	3	stk
ASSA ABLOY	927000	Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl. slutblik	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951531	Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	930859	DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 sølv (2018)		1	stk

Total antal døre 5

Dør-nr. ID.0.033, ID.0.076, ID.1.025, ID.1.054, ID.1.074

Noter

*) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

SET 6.0 Ukla./EI2 30, aflåselig. cych

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle t	3	stk
ASSA ABLOY	920078	Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. slutblik	mat forzink et	1	stk
ASSA ABLOY	197512	Triton 401 rokoko cylinder TS2602	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951435	3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm indv. og udv. cyl ring	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
Total antal døre	17				

Dør-nr. ID.0.001, ID.0.010, ID.0.042, ID.0.043, ID.0.044, ID.0.050, ID.0.074, ID.0.098, ID.0.112, ID.1.061, ID.1.070, ID.1.072, ID.1.104, ID.1.105, ID.1.106, ID.1.107, ID.1.110

Noter

*) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 7.0 Ukas./EI2 30, aflåselig. cy/vr

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle t	3	stk
ASSA ABLOY	920078	Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. slutblik	mat forzink et	1	stk
ASSA ABLOY	197506	Triton 401 ovalcylinder, TS1660	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951405	Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv højde cyl. ring AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
Total antal døre	57				

Dør-nr. 152, 155, 165, 613, 616, ID.0.002, ID.0.003, ID.0.005, ID.0.006, ID.0.011, ID.0.041, ID.0.045, ID.0.046, ID.0.048, ID.0.071, ID.0.083, ID.0.085, ID.0.086, ID.0.089, ID.0.091, ID.0.093, ID.0.103, ID.0.115, ID.1.001, ID.1.003, ID.1.004, ID.1.007, ID.1.008, ID.1.020, ID.1.021, ID.1.035, ID.1.036, ID.1.037, ID.1.038, ID.1.039, ID.1.040, ID.1.041, ID.1.042, ID.1.043, ID.1.047, ID.1.048, ID.1.051, ID.1.052, ID.1.069, ID.1.071, ID.1.073, ID.1.082, ID.1.084, ID.1.087, ID.1.091, ID.1.092, ID.1.097, ID.1.098, ID.1.099, ID.1.100, ID.1.103, ID.1.108

Noter

*) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 8.1 EI2 30/60-C, dørlukker, 2-fl., aflåselig. cy/vr

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle t	6	stk
ASSA ABLOY	920007	Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. slutblik,	mat forzink et	1	stk
ASSA ABLOY	197506	Triton 401 ovalcylinder, TS1660	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951405	Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv højde cyl. ring AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	2	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	936572	Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik og styrerør	glansfo rzinket	2	stk
ASSA ABLOY	930943	Dørlukkersystem G461 m/DC700 2-fl. Sølv (2018)		1	stk

Total antal døre 6

Dør-nr. ID.0.022, ID.0.024, ID.0.025, ID.0.031, ID.0.051, ID.0.110

Noter

Hængsler evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre.

Højde på cylinderring skal angives.

Alt beslag skal leveres komplet med skruer.

SET 9.0 Udv. dør, dørlukker, 2-fl., ADK-T, aflåselig.

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936836	Kabel EA220 til elektromekanisk lås EL580 m.fl., 10 meter		1	stk
ASSA ABLOY	971621	Karmoverføring, EA281, 519 mm	blank krom	1	stk
ASSA ABLOY	982002	Sikkerhedslutblik 4630 til Abloy magnetlås		1	stk
ASSA ABLOY	971905	Magnetlås enkeltfalle m/2-delt fallerør 12-24 VDC EL580L	blank krom	1	stk
ASSA ABLOY	196506	Triton 501 ovalcylinder, TH1660	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951421	Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring m/blindroset AISI316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	954544	ScanFlex gulvdørstop, 45 mm.	rustfrit stål	2	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951313	Pinol skrue til dørgrebspind		2	stk
ASSA ABLOY	935197	Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik	glansfo rzinket	2	stk
ASSA ABLOY	930859	DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 sølv (2018)		1	stk

Total antal døre 5

Dør-nr. UD.0.010, UD.0.023, UD.0.026, UD.0.040, UD.1.011

Noter

Hængsler leveres af dørfabrikanten

Alt beslag skal leveres med skruer

Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise.

Væglæser leveres i anden entreprise.

Højde på cylinderring skal angives.

SET 10.0 Ukla./EI2 30, 2-fl., aflåselig. cy/vr

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle	6	stk
ASSA ABLOY	920078	Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. slutblik	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	197506	Triton 401 ovalcylinder, TS1660	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951405	Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv højde cyl. ring AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	2	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	935197	Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik	glansforzinket	2	stk

Total antal døre 9

Dør-nr. ID.0.069, ID.0.070, ID.0.072, ID.0.073, ID.1.002, ID.1.006, ID.1.049, ID.1.050, ID.1.102

Noter

*) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 11.0 EI2 30/60-C, dørlukker, aflåselig, cy/vr

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle	3	stk
ASSA ABLOY	920007	Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. slutblik,	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	197506	Triton 401 ovalcylinder, TS1660	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951405	Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv højde cyl. ring AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	930859	DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 sølv (2018)		1	stk

Total antal døre 15

Dør-nr. ID.0.004, ID.0.007, ID.0.009, ID.0.053, ID.0.109, ID.1.018, ID.1.022, ID.1.023, ID.1.034, ID.1.053, ID.1.064, ID.1.088, ID.1.089, ID.1.095, ID.1.096

Noter

Hængsler evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre.

Højde på cylinderring skal angives.

Alt beslag skal leveres komplet med skruer.

SET 12.0 EI2 30/60-C, dørlukker, 2-fl., aflåselig. cy/vr

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle t	6	stk
ASSA ABLOY	920007	Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. slutblik,	mat forzink et	1	stk
ASSA ABLOY	197506	Triton 401 ovalcylinder, TS1660	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951405	Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv højde cyl. ring AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	2	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	936572	Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik og styrerør	glansfo rzinket	2	stk
ASSA ABLOY	930943	Dørlukkersystem G461 m/DC700 2-fl. Sølv (2018)		1	stk

Total antal døre 3

Dør-nr. ID.0.081, ID.0.099, UD.0.011

Noter

Hængsler evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre.

Højde på cylinderring skal angives.

Alt beslag skal leveres komplet med skruer.

SET 13.1 Ukla./EI2 30, 2-fl., aflåselig. cy/cy

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle	6	stk
ASSA ABLOY	920078	Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. slutblik	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	197512	Triton 401 rokoko cylinder TS2602	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951435	3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm indv. og udv. cyl ring	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	2	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	935197	Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik	glansforzinket	2	stk

Total antal døre 3

Dør-nr. ID.0.055, ID.0.056, IGP.017

Noter

*) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 14.0 EI2 30/60-C, dørlukker, uaflåselig. Bl.

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle	3	stk
ASSA ABLOY	927000	Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl. slutblik	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951531	Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	930859	DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 sølv (2018)		1	stk

Total antal døre 8

Dør-nr. ID.0.008, ID.0.012, ID.0.058, ID.0.059, ID.0.060, ID.1.046, ID.1.066, ID.1.085

Noter

*) Evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre

Alt beslag skal leveres med skruer

SET 15.0 Toiletør med handicap toiletbesætning

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle t	3	stk
ASSA ABLOY	920078	Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. slutblik	mat forzink et	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951545	Ruko-Line handicap toiletmarkering 3003 AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951703	Ruko-Line dørhank 7019 enkelt 19x300 mm. AISI 316L	rustfrit stål	1	stk

Total antal døre 1

Dør-nr. ID.1.080

Noter

*) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

SET 16.1 Ukla./EI2 30, aflåselig. cy/vr

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle	3	stk
ASSA ABLOY	920078	Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. slutblik	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	197506	Triton 401 ovalcylinder, TS1660	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951405	Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv højde cyl. ring AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk

Total antal døre 1

Dør-nr. ID.0.054

Noter

*) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 17.0 EI2 30/60-C, dørlukker, 2-fl., aflåselig. cy/cy

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle t	6	stk
ASSA ABLOY	920007	Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. slutblik,	mat forzink et	1	stk
ASSA ABLOY	197512	Triton 401 rokoko cylinder TS2602	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951435	3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm indiv. og udv. cyl ring	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	2	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	936572	Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik og styrerør	glansfo rzinket	2	stk
ASSA ABLOY	930943	Dørlukkersystem G461 m/DC700 2-fl. Sølv (2018)		1	stk

Total antal døre 1

Dør-nr. ID.0.029

Noter

*) Evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 18.0 Udv. dør, dørlukker, ADK-T, aflåselig.

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936836	Kabel EA220 til elektromekanisk lås EL580 m.fl., 10 meter		1	stk
ASSA ABLOY	971621	Karmoverføring, EA281, 519 mm	blank krom	1	stk
ASSA ABLOY	982002	Sikkerhedslutblik 4630 til Abloy magnetlås		1	stk
ASSA ABLOY	971905	Magnetlås enkeltfalle m/2-delt fallerør 12-24 VDC EL580L	blank krom	1	stk
ASSA ABLOY	196506	Triton 501 ovalcylinder, TH1660	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951421	Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring m/blindroset AISI316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	954544	ScanFlex gulvdørstop, 45 mm.	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951313	Pinol skrue til dørgrebspind		2	stk
ASSA ABLOY	930859	DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 sølv (2018)		1	stk

Total antal døre 1

Dør-nr. UD.0.039

Noter

Hængsler leveres af dørfabrikanten

Alt beslag skal leveres med skruer

Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise.

Væglæser leveres i anden entreprise.

Højde på cylinderring skal angives.

SET 19.0 EI2 30/60-C, dørluk.ABDL, 2-fl., aflåselig. cy/vr

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle t	6	stk
ASSA ABLOY	920007	Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. slutblik,	mat forzink et	1	stk
ASSA ABLOY	197506	Triton 401 ovalcylinder, TS1660	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951405	Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv højde cyl. ring AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	2	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	936572	Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik og styrerør	glansfo rzinket	2	stk
ASSA ABLOY	930945	G462 m/DC700 komplet Sølv (2018)		1	stk
ASSA ABLOY	939050	Trykkontakt DA033 til udtryk komplet/ABDL test	hvid	1	stk

Total antal døre 1

Dør-nr. ID.0.080

Noter

*) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Tilsluttes ABDL anlæg.

Højde på cylinderring skal angives.

SET 20.0 Ukas-EI2 30, 2-fl., uafåselig. Bl.

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle	6	stk
ASSA ABLOY	927000	Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl. slutblik	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	2	stk
ASSA ABLOY	951531	Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	935197	Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik	glansforzinket	2	stk

Total antal døre 3

Dør-nr. ID.0.023, ID.0.026, ID.0.087

Noter

*) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

SET 21.0 Ukla./EI2 30, 2-fl., aflåselig. cy/cy

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle	6	stk
ASSA ABLOY	920078	Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. slutblik	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	197512	Triton 401 rokoko cylinder TS2602	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951435	3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm indv. og udv. cyl ring	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	2	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	935197	Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik	glansforzinket	2	stk

Total antal døre 1

Dør-nr. ID.0.117

Noter

*) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 22.1 EI2 30/60-C, dørlukker, ABDL, 2-fl., aflåselig

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle t	6	stk
ASSA ABLOY	920007	Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. slutblik,	mat forzink et	1	stk
ASSA ABLOY	197506	Triton 401 ovalcylinder, TS1660	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951405	Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv højde cyl. ring AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	2	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	936572	Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik og styrerør	glansforzink et	2	stk
ASSA ABLOY	930945	G462 m/DC700 komplet Sølv (2018)		1	stk
ASSA ABLOY	939050	Trykkontakt DA033 til udtryk komplet/ABDL test	hvid	1	stk

Total antal døre 3

Dør-nr. ID.0.020, ID.0.061, ID.1.062

Noter

*) Evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre

Alt beslag skal leveres med skruer

Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise.

Væglæser leveres i anden entreprise.

Højde på cylinderring skal angives.

SET 23.0 EI2 30/60-C, dørlukker, ABDL, aflåselig. cy/vr

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle	3	stk
ASSA ABLOY	920007	Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. slutblik,	mat forzinket	1	stk
ASSA ABLOY	197506	Triton 401 ovalcylinder, TS1660	rustfrit look	1	stk
ASSA ABLOY	951405	Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv højde cyl. ring AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	930939	G460 m/DC700 komplet Sølv / G460 (2018)		1	stk
ASSA ABLOY	939050	Trykkontakt DA033 til udtryk komplet/ABDL test	hvid	1	stk

Total antal døre 2

Dør-nr. ID.1.045, ID.1.081

Noter

Hængsler evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre.

Højde på cylinderring skal angives.

Alt beslag skal leveres komplet med skruer.

SET 24.0 EI2 30/60-C, dørlukker, ABDL, 2-fl., uaflåselig.

Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	936122	Tapbærende hængsler 3228, justerbare med justerbrik	zinkbehandle t	6	stk
ASSA ABLOY	927000	Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl. slutblik	mat forzink et	1	stk
ASSA ABLOY	954506	ScanFlex dørstop skildpadde til gulv Ø45x25 mm	rustfrit stål	2	stk
ASSA ABLOY	951531	Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	951510	Ruko-Line dørgreb 0219 U-19 mm.m. ros., nålelj., AISI 316L	rustfrit stål	1	stk
ASSA ABLOY	936572	Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik og styrerør	glansfo rzinket	2	stk
ASSA ABLOY	930945	G462 m/DC700 komplet Sølv (2018)		1	stk
ASSA ABLOY	939050	Trykkontakt DA033 til udtryk komplet/ABDL test	hvid	1	stk

Total antal døre 2

Dør-nr. ID.1.019, ID.1.024

Noter

*) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

SET 27.0 Øvrige dele




Brand	Varenummer	Produktbeskrivelse	Overfl	Antal	Enhed
ASSA ABLOY	942550	Triton 501 system nøgle v/nyt system		300	stk

Total antal døre 1

Dør-nr. Nøgler

Noter

Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise.

Sag: Skærbæk skole	Sag nr. 17-041		Åboulevarden 1, 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk	Tlf: 72 10 00 52
Emne: Dørskema	Tegn. nr. A.X.644.EX		Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk	Tlf: 86 19 18 44
Revision: Revision iht. skyer	06.07.2020		Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk	Tlf: 86 20 32 00
Dato: 2019.05.02	Papir: A3	Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage		

Se beslagssæt dokument nr. 12150-2

Udførsel

ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	LockSet	Akustik krav	Brand krav	ADK	ABDL	Rammedør	Farve	Friløb	Dørlukker	Sparkeplade	Sparkepl. højde	Vægtykkelse	
UD.0.041				FM Wall Recess: FM Åbning ved siddenericher	1													
UD.0.064				FM Wall Recess: FM Dørhul	1													
: 2																		
311001																		
UD.0.037	1786	2188	311001	311 Udv dør udadgående: 311 D 18x22 EI2 60-C	1			EI2 60-C	No		No	7016		Dørlukker	No	0	324	
311001: 1																		
311002																		
UD.0.010	1986	2188	311002	311 Udv dør udadgående: 311 D 20x22	1	Set 9.0			Yes		Yes	7016		Dørlukker	No	0	324	
311002: 1																		
311003																		
UD.0.040	1786	2188	311003	311 Udv dør udadgående: 311 DR 18x22	1	Set 9.0			Yes		Yes	7016		Dørlukker	No	0	324	
UD.1.011	1786	2188	311003	311 Udv dør udadgående: 311 DR 18x22	1	Set 9.0			Yes		Yes	7016			No	0	324	
311003: 2																		
311004																		
UD.0.004	1986	2188	311004	311 Udv dør udadgående: 311 DR 20x22	1				Yes		Yes	7016		Dørlukker	No	0	324	
311004: 1																		
311005																		
UD.1.002	986	2188	311005	311 Udv dør udadgående: 311 E 10x22	1				No		No	7016			No	0	324	
UD.1.005	986	2188	311005	311 Udv dør udadgående: 311 E 10x22	1				No		No	7016			No	0	324	
UD.1.012	986	2188	311005	311 Udv dør udadgående: 311 E 10x22	1				No		No	7016			No	0	324	
UD.1.014	986	2188	311005	311 Udv dør udadgående: 311 E 10x22	1				No		No	7016			No	0	324	
UD.1.015	986	2188	311005	311 Udv dør udadgående: 311 E 10x22	1				No		No	7016			No	0	324	
UD.1.018	986	2188	311005	311 Udv dør udadgående: 311 E 10x22	1				No		No	7016			No	0	324	
311005: 6																		
311006																		
UD.1.007	886	2188	311006	311 Udv dør udadgående: 311 ER 9x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.1.008	886	2188	311006	311 Udv dør udadgående: 311 ER 9x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.1.009	886	2188	311006	311 Udv dør udadgående: 311 ER 9x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
311006: 3																		
311007																		
UD.1.001	886	2188	311007	311 Udv dør udadgående: 311 ER 9x22 EI2 60-C	1			EI2 60-C	No		Yes	7016		Dørlukker	No	0	324	
311007: 1																		
311008																		
UD.0.002	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.014	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.015	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.017	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.018	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016		Dørlukker	No	0	324	
UD.0.021	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.027	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.028	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.029	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.030	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.031	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.032	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.033	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.034	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.036	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.039	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1	Set 18.0			Yes		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.041	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016		Dørlukker	No	250	324	
UD.0.042	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.044	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.046	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.048	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.051	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.052	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.054	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.056	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.058	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.060	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.066	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.0.067	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.1.003	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.1.004	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.1.006	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.1.010	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.1.013	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.1.016	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	
UD.1.017	986	2188	311008	311 Udv dør udadgående: 311 ER 10x22	1				No		Yes	7016			No	0	324	

Sag: Skærbæk skole	Sag nr. 17-041	• FRIIS & MOLTKE	Åboulevarden 1 , 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk	Tlf: 72 10 00 52
Emne: Dørskema s. 2	Tegn. nr. A.X.644.s2	○ Tækker	Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk	Tlf: 86 19 18 44
Revision: Revision iht. skyer	06.07.2020	○ Møller & Grønberg	Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk	Tlf: 86 20 32 00
Dato: 2019.05.02	Papir: A3	Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage		

Se beslagssæt dokument nr. 12150-2

ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	LockSet	Akustik krav	Brand krav	ADK	ABDL	Rammedør	Farve	Friløb	Dørlukker	Sparkeplade	Sparkepl. højde	Vægtykkelse	
UD.0.001	886	2188	311009	311 Udv dør udadgående: 3110 E 9x22 Trædør	1				No		No	7016			No	0	104	
UD.0.003	886	2188	311009	311 Udv dør udadgående: 3110 E 9x22 Trædør	1				No		No	7016			No	0	104	
UD.0.013	886	2188	311009	311 Udv dør udadgående: 3110 E 9x22 Trædør	1				No		No	7016			No	0	104	
UD.0.016	886	2188	311009	311 Udv dør udadgående: 3110 E 9x22 Trædør	1				No		No	7016			No	0	104	
UD.0.019	886	2188	311009	311 Udv dør udadgående: 3110 E 9x22 Trædør	1				No		No	7016			No	0	104	
UD.0.024	886	2188	311009	311 Udv dør udadgående: 3110 E 9x22 Trædør	1				No		No	7016			No	0	104	
UD.0.035	886	2188	311009	311 Udv dør udadgående: 3110 E 9x22 Trædør	1				No		No	7016			No	0	104	
UD.0.043	886	2188	311009	311 Udv dør udadgående: 3110 E 9x22 Trædør	1				No		No	7016			No	0	104	
UD.0.045	886	2188	311009	311 Udv dør udadgående: 3110 E 9x22 Trædør	1				No		No	7016			No	0	104	
UD.0.049	886	2188	311009	311 Udv dør udadgående: 3110 E 9x22 Trædør	1				No		No	7016			No	0	104	
UD.0.055	886	2188	311009	311 Udv dør udadgående: 3110 E 9x22 Trædør	1				No		No	7016			No	0	104	
UD.0.057	886	2188	311009	311 Udv dør udadgående: 3110 E 9x22 Trædør	1				No		No	7016			No	0	104	
UD.2.001	886	2188	311009	311 Udv dør udadgående: 3110 E 9x22 Trædør	1				No		No	7016			No	0	238	
311009: 13																		
311010																		
UD.0.038	886	2188	311010	311 Udv dør udadgående: 3110 E 9x22 Trædør EI2 30-C	1			EI2 30-C	No		No	7016		Dørlukker	No	0	104	
311010: 1																		
311011																		
UD.0.012	1786	2188	311011	311 Udv dør udadgående: 3112 D 18x22 Ståldør	1				No		No	7016			No	0	154	
311011: 1																		
311012																		
UD.0.011	1786	2188	311012	311 Udv dør udadgående: 3112 D 18x22 Ståldør EI2 60-C	1	Set 12.0		EI2 60-C	No		No	7016		Dørlukker	No	0	154	
UD.0.061	1786	2188	311012	311 Udv dør udadgående: 3112 D 18x22 Ståldør EI2 60-C	1			EI2 60-C	No		No	7016		Dørlukker	No	0	200	
311012: 2																		
311013																		
UD.0.026	1986	2188	311013	311 Udv dør udadgående: 3112 D 20x22 Ståldør	1	Set 9.0			Yes		No	7016		Dørlukker	No	0	324	
311013: 1																		
311014																		
UD.0.005	986	2188	311014	311 Udv dør udadgående: 3112 E 10x22 Ståldør	1				No		No	7016			No	0	324	
UD.0.006	986	2188	311014	311 Udv dør udadgående: 3112 E 10x22 Ståldør	1				No		No	7016			No	0	324	
311014: 2																		
313001																		
UD.0.009	987	2120	313001	313 Glasdør enkelt ramme: 313 Udv. glasrammedør 986x2121 enkelt, hærdet og lamineret	1				No			7016						
UD.0.020	986	2161	313001	313 Glasdør enkelt ramme: 313 Udv. glasrammedør 986x2121 enkelt, hærdet og lamineret	1				No			7016						
UD.0.053	974	2121	313001	313 Glasdør enkelt ramme: 313 Udv. glasrammedør 986x2121 enkelt, hærdet og lamineret	1				No			7016						
313001: 3																		
313002																		
UD.0.007	1906	2149	313002	313 Dobbelt glasdør: 313 Udv. glasrammedør dobbelt, 1906x2121 hærdet og lamineret, glasfacadesystem	1				No			7016						
UD.0.008	1907	2149	313002	313 Dobbelt glasdør: 313 Udv. glasrammedør dobbelt, 1906x2121 hærdet og lamineret, glasfacadesystem	1				No			7016						
313002: 2																		
313003																		
UD.0.023	2052	2161	313003	313 Dobbelt glasdør: 313 Udv. glasrammedør dobbelt, 1986x2121 hærdet og lamineret, glasfacadesystem	1	Set 9.0			Yes			7016		Dørlukker				
UD.0.050	1986	2161	313003	313 Dobbelt glasdør: 313 Udv. glasrammedør dobbelt, 1986x2121 hærdet og lamineret, glasfacadesystem	1				No			7016						
UD.0.062	2032	2161	313003	313 Dobbelt glasdør: 313 Udv. glasrammedør dobbelt, 1986x2121 hærdet og lamineret, glasfacadesystem	1				No			7016						
313003: 3																		
321001																		
ID.1.019	1586	2088	321001	3210 Ind. Dør: 3210 D 16x21 Csa	1	Set 24.0		Csa		ABDL	No	7016	No	Dørlukker	Yes	300	150	
321001: 1																		
321002																		
ID.0.117	1786	2088	321002	3210 Ind. Dør: 3210 D 18x21	1	Set 21.0					No	9016	No	Dørlukker	Yes	300	150	
321002: 1																		
321003																		
ID.1.049	1786	2088	321003	3210 Ind. Dør: 3210 D 18x21 44 dB EI2 30	1	Set 10.0	40dB	EI2 30			No	7016	No		Yes	300	200	
ID.1.050	1786	2088	321003	3210 Ind. Dør: 3210 D 18x21 44 dB EI2 30	1	Set 10.0	40dB	EI2 30			No	7016	No		Yes	300	200	
321003: 2																		
321004																		
ID.0.080	1786	2088	321004	3210 Ind. Dør: 3210 D 18x21 EI2 30-C	1	Set 19.0		EI2 30-C	No	ABDL	No	7016	Yes	Dørlukker	Yes	300	150	
321004: 1																		
321005																		
ID.0.081	1786	2088	321005	3210 Ind. Dør: 3210 D 18x21 EI2 60-C	1	Set 12.0	43dB	EI2 60-C			No	7016	No	Dørlukker	Yes	300	200	
321005: 1																		
321006																		
ID.0.072	1986	2088	321006	3210 Ind. Dør: 3210 D 20x21 44 dB EI2 30	1	Set 10.0	40dB	EI2 30	No		No	7016	No		Yes	300	200	
ID.0.073	1986	2088	321006	3210 Ind. Dør: 3210 D 20x21 44 dB EI2 30	1	Set 10.0	40dB	EI2 30	No		No	7016	No		Yes	300	200	
ID.1.002	1986	2088	321006	3210 Ind. Dør: 3210 D 20x21 44 dB EI2 30	1	Set 10.0	40dB	EI2 30	No		No	9016	No		Yes	300	200	
ID.1.006	1986	2088	321006	3210 Ind. Dør: 3210 D 20x21 44 dB EI2 30	1	Set 10.0	40dB	EI2 30	No		No	9016	No		Yes	300	200	
321006: 4																		

Alle døre samt karmbredder opmåles på pladsen. Alle sidepartier males i samme farve som dør. Karmer og dørlukker males i samme farve.

Sag: **Skærbæk skole**

Emne: Dørskema s. 3

Revision: Revision iht. skyer | 06.07.2020 | **P**

Dato: 2019.05.02 | Papir: A3

Sag nr. 17-041

Tegn. nr. **A.X.644.s3**

Udførsel

• **FRIIS & MOLTKE** | Åboulevarden 1, 8000 Aarhus C | www.friis-moltke.dk | Tlf: 72 10 00 52

○ **Tækker** | Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C | www.taekker.dk | Tlf: 86 19 18 44




○ **Møller & Grønborg** | Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C | www.mgarkitekter.dk | Tlf: 86 20 32 00

Tegningsnummer: Fag Lokation **A.X.14.E01** Tegningstype Løbenr./Etage

Se beslagssæt dokument nr. 12150-2


ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	LockSet	Akustik krav	Brand krav	ADK	ABDL	Rammedør	Farve	Friløb	Dørlukker	Sparkeplade	Sparkepl. højde	Vægtykkelse	
321007																		
ID.0.087	1986	2088	321007	3210 Ind. Dør: 3210 D 20x21 40 dB	1	Set 20.0	40dB		No	No		9016	No		Yes	300	150	
321007: 1																		
321008																		
ID.0.029	1986	2088	321008	3210 Ind. Dør: 3210 D 20x21 EI2 30	1	Set 17.0		EI2 30-C	No	No		9016	No	Dørlukker	Yes	300	150	
321008: 1																		
321009																		
ID.0.051	1986	2088	321009	3210 Ind. Dør: 3210 D 20x21 47 dB	1	Set 8.1	47dB	EI2 30	No	No		7016	No	Dørlukker	Yes	300	250	
ID.0.055	1986	2088	321009	3210 Ind. Dør: 3210 D 20x21 47 dB	1	Set 13.1	47dB	EI2 30	No	No		7016	No		Yes	300	250	
ID.0.056	1986	2088	321009	3210 Ind. Dør: 3210 D 20x21 47 dB	1	Set 13.1	47dB	EI2 30	No	No		7016	No		Yes	300	250	
321009: 3																		
321010																		
ID.1.062	1576	2088	321010	3210 Ind. Dør: 3210 DA 16x21	1	Set 22.1		E 60-C	No	ABDL	No	7016	No	Dørlukker	Yes	300	150	
321010: 1																		
321011																		
ID.0.061	1486	2088	321011	3210 Ind. Dør: 3210 DA 15x21 E 60-C	1	Set 22.1		E 60-C	No	ABDL	No	7016	No	Dørlukker	Yes	300	150	
321011: 1																		
321012																		
ID.0.106	1286	2088	321012	3210 Ind. Dør: 3210 DAR 13x21 33dB EI2 30	1	Set 4.0	33dB	EI2 30			Yes	7016	No	Dørlukker	No	0	150	
321012: 1																		
321013																		
ID.0.082	1286	2088	321013	3210 Ind. Dør: 3210 DAR 14x21 E 60-C	1	Set 1.1		E 60-C	No		Yes	7016	No	Dørlukker	No	0	200	
321013: 1																		
321014																		
ID.1.102	1786	2088	321014	3210 Ind. Dør: 3210 DR 18x21	1	Set 10.0					Yes	7016	No	Dørlukker	No	0	150	
321014: 1																		
321015																		
ID.0.031	1986	2088	321015	3210 Ind. Dør: 3210 DR 20x21	1	Set 8.1		E 60-C	No		Yes	7016	No	Dørlukker	No	0	300	
321015: 1																		
321016																		
ID.0.110	1986	2088	321016	3210 Ind. Dør: 3210 DR 20x21 33dB EI2 60-C	1	Set 8.1	33dB	EI2 60-C	No		Yes	7016	No	Dørlukker	No	0	300	
321016: 1																		
321017																		
ID.0.022	1986	2088	321017	3210 Ind. Dør: 3210 DR 20x21 44dB EI2 60-C	1	Set 8.1	43dB	EI2 60-C	No	No		7016	No	Dørlukker	No	0	300	
ID.0.024	1986	2088	321017	3210 Ind. Dør: 3210 DR 20x21 44dB EI2 60-C	1	Set 8.1	43dB	EI2 60-C	No	No		7016	No	Dørlukker	No	0	300	
ID.0.025	1986	2088	321017	3210 Ind. Dør: 3210 DR 20x21 44dB EI2 60-C	1	Set 8.1	43dB	EI2 60-C	No	No		7016	No	Dørlukker	No	0	300	
321017: 3																		
321018																		
ID.0.020	2486	2088	321018	3210 Ind. Dør: 3210 DR 25x21 EI2 60-C	1	Set 22.1		EI2 60-C	No	ABDL	Yes	7016	No	Dørlukker	No	0	150	
321018: 1																		
321019																		
ID.1.096	686	2088	321019	3210 Ind. Dør: 3210 E 7x21 EI2 60-C	1	Set 11.0		EI2 60-C			No	9016	No	Dørlukker	Yes	300	150	
321019: 1																		
321020																		
ID.0.013	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.0.014	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.0.015	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.0.016	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.0.017	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.0.018	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.0.034	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.0.035	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.0.036	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.0.037	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.0.038	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.0.039	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.0.040	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.0.063	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.0.064	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.0.065	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	7016	No		Yes	300	150	
ID.0.067	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.0.068	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.0.077	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	150	
ID.0.078	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	150	
ID.0.092	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 4.0					No	7016	No		Yes	300	150	
ID.0.095	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	7016	No		Yes	300	150	
ID.1.010	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.1.011	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.1.012	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	
ID.1.013	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100	

Alle døre samt karmbredder opmåles på pladsen. Alle sidepartier males i samme farve som dør. Karme og dørlukker males i samme farve.

Sag: Skærbæk skole	Sag nr. 17-041	  	Åboulevarden 1 , 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk	Tlf: 72 10 00 52
Emne: Dørskema s. 4	Tegn. nr. A.X.644.s4		Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk	Tlf: 86 19 18 44
Revision: Revision iht. skyer	06.07.2020	P	Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk	Tlf: 86 20 32 00
Dato: 2019.05.02	Papir: A3	Udførsel	Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage	

Se beslagssæt dokument nr. 12150-2




ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	LockSet	Akustik krav	Brand krav	ADK	ABDL	Rammedør	Farve	Friløb	Dørlukker	Sparkeplade	Sparkepl. højde	Vægtykkelse
ID.1.014	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.015	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.016	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.017	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.026	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.027	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.028	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.029	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.030	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.031	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.032	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.055	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.056	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.059	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.060	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.067	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.068	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.075	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 2.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.076	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 4.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.077	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 4.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.078	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 4.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.079	786	2088	321020	3210 Ind. Dør: 3210 E 8x21	1	Set 4.0					No	9016	No		Yes	300	100
321020: 48																	
321021																	
ID.0.045	886	2088	321021	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21	1	Set 7.0					No	7016	No	Dørlukker	Yes	300	200
ID.1.054	886	2088	321021	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21	1	Set 5.0					No	7016	No		Yes	300	100
ID.1.057	886	2088	321021	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21	1	Set 2.0					No	7016	No		Yes	300	100
ID.1.058	886	2088	321021	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21	1	Set 4.0					No	7016	No		Yes	300	100
ID.1.093	886	2088	321021	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21	1	Set 4.0					No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.094	886	2088	321021	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21	1	Set 4.0					No	9016	No		Yes	300	100
321021: 6																	
321022																	
ID.1.061	886	2088	321022	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21 40dB EI2 30	1	Set 6.0	40dB	EI2 30			No	7016	No		Yes	300	150
321022: 1																	
321023																	
ID.0.004	886	2088	321023	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21 EI2 30-C	1	Set 11.0		EI2 30-C	No	No	No	7016	No	Dørlukker	Yes	300	200
ID.0.008	886	2088	321023	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21 EI2 30-C	1	Set 14.0		EI2 30-C	No	No	No	9016	No	Dørlukker	Yes	300	150
ID.0.021	886	2088	321023	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21 EI2 30-C	1	Set 3.0		EI2 30-C	No	No	No	9016	No	Dørlukker	Yes	300	150
ID.0.052	886	2088	321023	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21 EI2 30-C	1	Set 3.0		EI2 30-C	No	No	No	9016	No	Dørlukker	Yes	300	150
ID.0.053	886	2088	321023	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21 EI2 30-C	1	Set 11.0		EI2 30-C	No	No	No	9016	No	Dørlukker	Yes	300	150
ID.0.059	886	2088	321023	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21 EI2 30-C	1	Set 14.0		EI2 30-C	No	No	No	9016	No	Dørlukker	Yes	300	150
ID.0.109	886	2088	321023	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21 EI2 30-C	1	Set 11.0		EI2 30-C	No	No	No	7016	No	Dørlukker	Yes	300	150
ID.1.034	886	2088	321023	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21 EI2 30-C	1	Set 11.0		EI2 30-C	No	No	No	7016	No	Dørlukker	Yes	300	150
ID.1.089	886	2088	321023	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21 EI2 30-C	1	Set 11.0		EI2 30-C	No	No	No	9016	No	Dørlukker	Yes	300	150
321023: 9																	
321024																	
ID.0.007	886	2088	321024	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21 EI2 60-C	1	Set 11.0		EI2 60-C			No	7016	No	Dørlukker	Yes	300	150
321024: 1																	
321025																	
ID.1.033	986	2088	321025	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21	1	Set 4.0			No	No	No	9016	No		Yes	300	100
ID.1.074	986	2088	321025	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21	1	Set 5.0			No	No	No	7016	No		Yes	300	150
ID.1.080	986	2088	321025	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21	1	Set 15.0			No	No	No	9016	No		Yes	300	100
321025: 3																	
321027																	
ID.1.036	986	2088	321027	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30	No	No	No	9016	No		Yes	300	200
ID.1.043	986	2088	321027	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30	No	No	No	7016	No		Yes	300	200
ID.1.051	986	2088	321027	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30	No	No	No	9016	No		Yes	300	150
ID.1.069	986	2088	321027	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30	No	No	No	7016	No		Yes	300	150
ID.1.071	986	2088	321027	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30	No	No	No	7016	No		Yes	300	150
321027: 5																	
321028																	
ID.1.088	986	2088	321028	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21 40dB EI2 30-C	1	Set 11.0	40dB	EI2 30-C	No	No	No	9016	No	Dørlukker	Yes	300	150
321028: 1																	
321029																	
ID.1.064	986	2088	321029	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21 40dB EI2 60-C	1	Set 11.0	40dB	EI2 60-C	No	No	No	7016	No	Dørlukker	Yes	300	150
321029: 1																	
321030																	
ID.0.047	986	2088	321030	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21 EI2 30-C	1	Set 3.0		EI2 30-C	No	No	No	7016	No	Dørlukker	Yes	300	150
ID.1.022	986	2088	321030	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21 EI2 30-C	1	Set 11.0		EI2 30-C	No	No	No	7016	No	Dørlukker	Yes	300	150
ID.1.045	986	2088	321030	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21 EI2 30-C	1	Set 23.0		EI2 30-C	No	ABDL	No	7016	Yes	Dørlukker	Yes	300	200

Sag: Skærbæk skole	Sag nr. 17-041		Åboulevarden 1, 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk	Tlf: 72 10 00 52
Emne: Dørskema s. 5	Tegn. nr. A.X.644.s5		Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk	Tlf: 86 19 18 44
Revision: Revision iht. skyer	06.07.2020		Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk	Tlf: 86 20 32 00
Dato: 2019.05.02	Papir: A3		Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage	

Se beslagssæt dokument nr. 12150-2

Udførsel




ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	LockSet	Akustik krav	Brand krav	ADK	ABDL	Rammedør	Farve	Friløb	Dørlukker	Sparkeplade	Sparkepl. højde	Vægtykkelse
ID.1.081	986	2088	321030	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21 EI2 30-C	1	Set 23.0		EI2 30-C	No	ABDL	No	9016	Yes	Dørlukker	Yes	300	100
321030: 4																	
321031																	
ID.1.066	986	2088	321031	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21 EI2 60-C	1	Set 14.0		EI2 60-C	No		No	7016	No		Yes	300	195
321031: 1																	
321032																	
ID.0.010	986	2088	321032	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21	1	Set 6.0					Yes	7016	No		No	0	150
ID.0.011	986	2088	321032	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21	1	Set 7.0					Yes	7016	No		No	0	150
ID.0.033	986	2088	321032	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21	1	Set 5.0			No		Yes	7016	No		No	0	200
ID.0.075	986	2088	321032	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21	1	Set 4.0			No		Yes	7016	No	Dørlukker	No	0	150
ID.0.076	986	2088	321032	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21	1	Set 5.0			No		Yes	7016	No		No	0	150
ID.0.079	986	2088	321032	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21	1	Set 4.0			No		Yes	9016	No		No	0	150
ID.0.088	986	2088	321032	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21	1	Set 4.0			No		Yes	7016	No		No	0	150
ID.0.089	986	2088	321032	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21	1	Set 7.0					Yes	7016	No		No	0	150
ID.1.009	986	2088	321032	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21	1	Set 4.0			No		Yes	7016	No		No	0	200
ID.1.025	986	2088	321032	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21	1	Set 5.0			No		Yes	7016	No		No	0	150
321032: 10																	
321033																	
ID.0.050	986	2088	321033	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 33dB	1	Set 6.0	33dB				Yes	7016	No		No	0	150
ID.0.098	986	2088	321033	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 33dB	1	Set 6.0	33dB				Yes	7016	No		No	0	150
ID.0.103	986	2088	321033	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 33dB	1	Set 7.0	33dB				Yes	7016	No		No	0	150
ID.1.103	986	2088	321033	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 33dB	1	Set 7.0	33dB				Yes	7016	No		No	0	150
ID.1.104	986	2088	321033	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 33dB	1	Set 6.0	33dB				Yes	7016	No		No	0	150
ID.1.105	986	2088	321033	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 33dB	1	Set 6.0	33dB				Yes	7016	No		No	0	150
ID.1.106	986	2088	321033	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 33dB	1	Set 6.0	33dB				Yes	7016	No		No	0	150
ID.1.107	986	2088	321033	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 33dB	1	Set 6.0	33dB				Yes	7016	No		No	0	150
321033: 8																	
321034																	
ID.1.095	986	2088	321034	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 33dB E 60-C	1	Set 11.0	33dB	E 60-C			Yes	7016	No		No	0	150
321034: 1																	
321035																	
ID.0.048	986	2088	321035	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 35dB EI2 60-C	1	Set 7.0	35dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	150
321035: 1																	
321036																	
ID.0.001	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 6.0	40dB				Yes	7016	No		No	0	150
ID.0.041	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 7.0	40dB				Yes	7016	No		No	0	200
ID.0.042	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 6.0	40dB				Yes	7016	No		No	0	195
ID.0.043	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 6.0	40dB				Yes	7016	No		No	0	195
ID.0.044	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 6.0	40dB				Yes	7016	No		No	0	195
ID.0.071	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 7.0	40dB				Yes	9016	No		No	0	150
ID.0.074	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 6.0	40dB				Yes	7016	No		No	0	150
ID.0.084	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 4.0	40dB		No		Yes	7016	No		No	0	150
ID.0.090	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 4.0	40dB		No		Yes	7016	No		No	0	150
ID.0.097	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 4.0	40dB		No		Yes	7016	No		No	0	150
ID.0.115	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 7.0	40dB				Yes	9016	No		No	0	150
ID.1.020	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 7.0	40dB				Yes	7016	No		No	0	150
ID.1.021	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 7.0	40dB				Yes	7016	No		No	0	150
ID.1.040	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 7.0	40dB				Yes	7016	No		No	0	200
ID.1.052	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 7.0	40dB				Yes	7016	No		No	0	150
ID.1.087	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 7.0	40dB				Yes	7016	No		No	0	150
ID.1.101	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 4.0	40dB				Yes	9016	No		No	0	150
ID.1.108	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 7.0	40dB				Yes	7016	No		No	0	150
ID.1.110	986	2088	321036	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44dB	1	Set 6.0	40dB		No		Yes	7016	No		No	0	150
321036: 19																	
321037																	
ID.0.002	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	200
ID.0.003	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	150
ID.0.005	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	200
ID.0.006	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	150
ID.0.046	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	200
ID.0.083	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	150
ID.0.085	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30	No		Yes	7016	No		No	0	150
ID.0.086	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30	No		Yes	7016	No		No	0	150
ID.0.091	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30	No		Yes	7016	No		No	0	150
ID.0.093	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30	No		Yes	7016	No		No	0	150
ID.1.001	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	150
ID.1.003	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	150
ID.1.004	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	150
ID.1.007	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	150

Sag: Skærbæk skole	Sag nr. 17-041	 FRIIS & MOLTKE	Åboulevarden 1, 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk	Tlf: 72 10 00 52
Emne: Dørskema s. 6	Tegn. nr. A.X.644.s6	 Tækker	Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk	Tlf: 86 19 18 44
Revision: Revision iht. skyer	06.07.2020	 Møller & Grønberg	Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk	Tlf: 86 20 32 00
Dato: 2019.05.02	Papir: A3	Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage	Udførsel	

Se beslagssæt dokument nr. 12150-2

ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	LockSet	Akustik krav	Brand krav	ADK	ABDL	Rammedør	Farve	Friløb	Dørlukker	Sparkeplade	Sparkepl. højde	Vægtykkelse	
ID.1.008	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	150	
ID.1.035	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	150	
ID.1.037	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	150	
ID.1.038	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	200	
ID.1.041	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	150	
ID.1.047	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	200	
ID.1.048	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	200	
ID.1.073	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	150	
ID.1.082	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	200	
ID.1.084	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	200	
ID.1.091	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	200	
ID.1.092	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	200	
ID.1.097	986	2088	321037	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 30	1	Set 7.0	40dB	EI2 30			Yes	7016	No		No	0	150	
321037: 27																		
321039																		
ID.0.009	986	2088	321039	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 40dB EI2 60-C	1	Set 11.0	40dB	EI2 60-C			Yes	7016	No	Dørlukker	No	0	150	
321039: 1																		
321040																		
ID.0.054	986	2088	321040	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 47 dB EI2 30	1	Set 16.1	47dB	EI2 30	No		No	7016	No		Yes	300	250	
321040: 1																		
321041																		
ID.0.107	986	2088	321041	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 EI2 30	1	Set 4.0		EI2 30	No		Yes	7016	No		No	0	150	
321041: 1																		
321042																		
ID.0.058	986	2088	321042	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 EI2 30-C m. glasudskæring	1	Set 14.0		EI2 30-C	No		No	9016	No	Dørlukker	Yes	900	150	
ID.0.060	986	2088	321042	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 EI2 30-C m. glasudskæring	1	Set 14.0		EI2 30-C	No		No	9016	No	Dørlukker	Yes	900	150	
321042: 2																		
321043																		
ID.0.012	986	2088	321043	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 EI2 60-C	1	Set 14.0		EI2 60-C	No		Yes	7016	No		No	0	200	
ID.1.065	986	2088	321043	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 EI2 60-C	1	Set 1.1		EI2 60-C	No		Yes	7016	No	Dørlukker	No	0	200	
321043: 2																		
321044																		
ID.0.099	1510	2100	321044	3210 Indv. Dobbeldør Asymetrisk: 3210 DA 15x21 44dB EI2 30-C	1	Set 12.0	43dB	EI2 30-C				7016		Dørlukker	Yes	300		
321044: 1																		
321045																		
ID.1.046	1010	2100	321045	3210 Indv. Skydedør i væg: 10x21 EI2 30-C	1	Set 14.0		EI2 30-C				9016		Dørlukker	Yes			
321045: 1																		
321046																		
ID.1.085	1090	2100	321046	3210 Indv. Skydedør påbygget: 11x21 EI2 60-C	1	Set 14.0		EI2 60-C				7016		Dørlukker	Yes			
321046: 1																		
321047																		
ID.0.049	1210	2100	321047	3210 Indv. Skydedør påbygget: 12x21	1	Set 4.0						7016			Yes			
321047: 1																		
321048																		
ID.0.094	1010	2100	321048	3210 Indv. Skydedør: 10x21	1	Set 4.0						7016			Yes			
321048: 1																		
321049																		
ID.0.112	986	2088	321049	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 33dB glasdør	1	Set 6.0	33dB				Yes	7016	No		No	0	150	
321049: 1																		
321050																		
ID.0.062	886	2088	321050	3210 Ind. Dør: 3210 ER 9x21	1	Set 4.0					Yes	7016	No		No	0	150	
ID.0.066	886	2088	321050	3210 Ind. Dør: 3210 ER 9x21	1	Set 4.0					Yes	7016	No		No	0	150	
321050: 2																		
321051																		
ID.0.116	886	2288	321051	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x23	1	Set 4.0					No	9016	No	Dørlukker	Yes	300	150	
321051: 1																		
321052																		
ID.0.057	986	2088	321052	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 44 dB EI2 30-C m. glasudskæring	1	Set 1.1	44dB	EI2 30-C	No		No	7016	No	Dørlukker	Yes	900	200	
321052: 1																		
321053																		
ID.1.024	1486	2088	321053	3210 Ind. Dør: 3210 D 15x21 Csa	1	Set 24.0		Csa		ABDL	No	7016	No	Dørlukker	Yes	300	150	
321053: 1																		
321054																		
ID.0.023	1986	2088	321054	3210 Ind. Dør: 3210 D 20x21 43 dB EI2 30	1	Set 20.0	43dB	EI2 30			No	7016	No		Yes	300	200	
ID.0.069	1986	2088	321054	3210 Ind. Dør: 3210 D 20x21 43 dB EI2 30	1	Set 10.0	43dB	EI2 30	No		No	7016	No		Yes	300	200	
ID.0.070	1986	2088	321054	3210 Ind. Dør: 3210 D 20x21 43 dB EI2 30	1	Set 10.0	43dB	EI2 30	No		No	7016	No		Yes	300	200	
321054: 3																		
321055																		
ID.0.026	1986	2088	321055	3210 Ind. Dør: 3210 D 20x21 43dB	1	Set 20.0	43dB				No	7016	No		Yes	300	200	

Alle døre samt karmbredder opmåles på pladsen. Alle sidepartier males i samme farve som dør. Karme og dørplader males i samme farve.




Sag: Skærbæk skole		Sag nr. 17-041	•  FRIIS & MOLTKE		Åboulevarden 1 , 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk		Tlf: 72 10 00 52
Emne: Dørskema s. 7		Tegn. nr. A.X.644.s7	○  Tækker		Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk		Tlf: 86 19 18 44
Revision: Revision iht. skyer		06.07.2020	○  Møller & Grønberg		Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk		Tlf: 86 20 32 00
Dato: 2019.05.02		Papir: A3	Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01		Tegningstype Løbenr./Etage		

Se beslagssæt dokument nr. 12150-2

Udførsel




ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	LockSet	Akustik krav	Brand krav	ADK	ABDL	Rammedør	Farve	Friløb	Dørlukker	Sparkeplade	Sparkepl. højde	Vægtykkelse
055: 1																	
056																	
.070	886	2088	321056	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21 43dB EI2 30	1	Set 6.0	43dB	EI2 30			No	9016	No		Yes	300	150
.072	886	2088	321056	3210 Ind. Dør: 3210 E 9x21 43dB EI2 30	1	Set 6.0	43dB	EI2 30			No	9016	No		Yes	300	150
056: 2																	
057																	
.039	986	2088	321057	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21 43dB EI2 30	1	Set 7.0	43dB	EI2 30	No		No	9016	No		Yes	300	200
.042	986	2088	321057	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21 43dB EI2 30	1	Set 7.0	43dB	EI2 30	No		No	9016	No		Yes	300	200
.044	986	2088	321057	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21 43dB EI2 30	1	Set 4.0	43dB	EI2 30	No		No	9016	No		Yes	300	150
057: 3																	
058																	
.023	986	2088	321058	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21 43dB EI2 30-C	1	Set 11.0	43dB	EI2 30-C	No		No	7016	No	Dørlukker	Yes	300	150
.053	986	2088	321058	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21 43dB EI2 30-C	1	Set 11.0	43dB	EI2 30-C	No		No	7016	No	Dørlukker	Yes	300	150
058: 2																	
059																	
.018	986	2088	321059	3210 Ind. Dør: 3210 E 10x21 43dB EI2 60-C	1	Set 11.0	43dB	EI2 60-C	No		No	7016	No	Dørlukker	Yes	300	150
059: 1																	
060																	
.098	986	2088	321060	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 43dB EI2 30	1	Set 7.0	43dB	EI2 30			No	7016	No		No	0	150
.099	986	2088	321060	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 43dB EI2 30	1	Set 7.0	43dB	EI2 30			No	7016	No		No	0	150
.100	986	2088	321060	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 43dB EI2 30	1	Set 7.0	43dB	EI2 30			No	7016	No		No	0	150
060: 3																	
061																	
.019	986	2088	321061	3210 Ind. Dør: 3210 ER 10x21 43dB EI2 60-C	1	Set 3.0	43dB	EI2 60-C			No	7016	No	Dørlukker	No	0	200

061: 1
nd total: 288

Sag: Skærbæk skole		Sag nr. 17-041	•  FRIIS & MOLTKE	Åboulevarden 1 , 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk	Tlf: 72 10 00 52
Emne: Dørskema s. 8		Tegn. nr. A.X.644.s8	○  Tækker	Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk	Tlf: 86 19 18 44
Revision: Revision iht. skyer	19.05.2020		A	○  Møller & Grønberg	Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk
Dato: 05/18/20	Papir: A3	Udførsel	Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage		




Se beslagssæt dokument nr. 12150-2

ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	LockSet	Akustik krav	Brand krav	ADK	ABDL	Rammedør	Farve	Friløb	Dørlukker	Sparkeplade	Sparkepl. højde	Vægtykkelse
----	--------	-------	-----------	------	-------	---------	--------------	------------	-----	------	----------	-------	--------	-----------	-------------	-----------------	-------------

Sag: Skærbæk skole		Sag nr. 17-041	•  FRIIS & MOLTKE	Åboulevarden 1 , 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk	Tlf: 72 10 00 52
Emne: Dørskema s. 9		Tegn. nr. A.X.644.s9	○  Tækker	Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk	Tlf: 86 19 18 44
Revision: Revision iht. skyer		Udførsel	○  Møller & Grønberg	Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk	Tlf: 86 20 32 00
Dato: 05/18/20	Papir: A3		Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage		




Se beslagssæt dokument nr. 12150-2

ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	LockSet	Akustik krav	Brand krav	ADK	ABDL	Rammedør	Farve	Friløb	Dørlukker	Sparkeplade	Sparkepl. højde	Vægtykkelse
----	--------	-------	-----------	------	-------	---------	--------------	------------	-----	------	----------	-------	--------	-----------	-------------	-----------------	-------------

Sag: Skærbæk skole		Sag nr. 17-041	 Åboulevarden 1, 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk Tlf: 72 10 00 52	
Emne: Dørskema s. 10		Tegn. nr. A.X.644.s10	<input type="radio"/>  Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk Tlf: 86 19 18 44	
Revision: Revision iht. skyer		19.05.2020 A	<input type="radio"/>  Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk Tlf: 86 20 32 00	
Dato: 05/18/20 Papir: A3		Udførsel	Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage	




Se beslagssæt dokument nr. 12150-2

Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	LockSet	Akustik krav	Brand krav	ADK	ABDL	Rammedør	Farve	Friløb	Dørlukker	Sparkeplade	Sparkepl. højde	Vægtykkelse
--------	-------	-----------	------	-------	---------	--------------	------------	-----	------	----------	-------	--------	-----------	-------------	-----------------	-------------

Sag: Skærbæk skole		Sag nr. 17-041	 Åboulevarden 1, 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk Tlf: 72 10 00 52	
Emne: Dørskema s. 11		Tegn. nr. A.X.644.s11	<input type="radio"/>  Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk Tlf: 86 19 18 44	
Revision: Revision iht. skyer 19.05.2020 A			<input type="radio"/>  Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk Tlf: 86 20 32 00	
Dato: 05/18/20	Papir: A3	Udførsel		Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage




Se beslagssæt dokument nr. 12150-2

Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	LockSet	Akustik krav	Brand krav	ADK	ABDL	Rammedør	Farve	Friløb	Dørlukker	Sparkeplade	Sparkepl. højde	Vægtykkelse
--------	-------	-----------	------	-------	---------	--------------	------------	-----	------	----------	-------	--------	-----------	-------------	-----------------	-------------

Sag: Skærbæk skole		Sag nr. 17-041	 Åboulevarden 1 , 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk		Tlf: 72 10 00 52
Emne: Dørskema s. 12		Tegn. nr. A.X.644.s12	 Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk		Tlf: 86 19 18 44
Revision: Revision iht. skyer			 Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk		Tlf: 86 20 32 00
Dato: 05/18/20	Papir: A3	Udførsel		Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage	

Se beslagssæt dokument nr. 12150-2

Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	LockSet	Akustik krav	Brand krav	ADK	ABDL	Rammedør	Farve	Friløb	Dørlukker	Sparkeplade	Sparkepl. højde	Vægtykkelse
--------	-------	-----------	------	-------	---------	--------------	------------	-----	------	----------	-------	--------	-----------	-------------	-----------------	-------------

Sag: Skærbæk skole		Sag nr. 17-041	  	Åboulevarden 1 , 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk	Tlf: 72 10 00 52
Emne: Vinduesskema		Tegn. nr. A.X.652.EX		Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk	Tlf: 86 19 18 44
Revision: Revision iht. skyer		06.07.2020	Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk		
Dato: 2019.05.02		Papir: A3	Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage		
		Udførsel			

ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	Akustik	Farve	Brandkrav	Tophængt motorstyret
312001									
UV.038	478	2188	312001	1 - Parti - Fast 502X2212mm	1				
UV.042	478	2188	312001	1 - Parti - Fast 502X2212mm	1				
UV.043	478	2188	312001	1 - Parti - Fast 502X2212mm	1				
UV.045	478	2188	312001	1 - Parti - Fast 502X2212mm	1				
UV.052	478	2188	312001	1 - Parti - Fast 502X2212mm	1				
UV.055	478	2188	312001	1 - Parti - Fast 502X2212mm	1				
UV.056	478	2188	312001	1 - Parti - Fast 502X2212mm	1				
UV.059	478	2188	312001	1 - Parti - Fast 502X2212mm	1				
UV.061	478	2188	312001	1 - Parti - Fast 502X2212mm	1				
UV.083	478	2188	312001	1 - Parti - Fast 502X2212mm	1				
UV.087	478	2188	312001	1 - Parti - Fast 502X2212mm	1				
UV.089	478	2188	312001	1 - Parti - Fast 502X2212mm	1				
UV.091	478	2188	312001	1 - Parti - Fast 502X2212mm	1				
UV.190	478	2188	312001	1 - Parti - Fast 502X2212mm	1				
UV.192	478	2188	312001	1 - Parti - Fast 502X2212mm	1				

312001: 15

312002

UV.051	828	2188	312002	1 - Parti - Fast 852X2212mm	1				
UV.075	828	2188	312002	1 - Parti - Fast 852X2212mm	1				

312002: 2

312003

UV.060	1476	788	312003	1 - Parti - Fast 1500X812	1				
UV.082	1476	788	312003	1 - Parti - Fast 1500X812	1				No
UV.090	1476	788	312003	1 - Parti - Fast 1500X812	1				
UV.191	1476	788	312003	1 - Parti - Fast 1500X812	1				

312003: 4

312004

UV.171	986	788	312004	1 - Parti - Fast 1010X812	1				
UV.173	986	788	312004	1 - Parti - Fast 1010X812	1				
UV.180	986	788	312004	1 - Parti - Fast 1010X812	1				
UV.181	986	788	312004	1 - Parti - Fast 1010X812	1				

312004: 4

312005

UV.063	978	2188	312005	1 - Parti - Fast 1002X2212mm	1				
UV.065	978	2188	312005	1 - Parti - Fast 1002X2212mm	1				
UV.068	978	2188	312005	1 - Parti - Fast 1002X2212mm	1				
UV.070	978	2188	312005	1 - Parti - Fast 1002X2212mm	1				
UV.074	978	2188	312005	1 - Parti - Fast 1002X2212mm	1				

312005: 5

312006

UV.072	1328	2188	312006	1 - Parti - Fast 1352X2212mm	1				
UV.081	1328	2188	312006	1 - Parti - Fast 1352X2212mm	1				
UV.085	1328	2188	312006	1 - Parti - Fast 1352X2212mm	1				

312006: 3

312007

UV.145	1476	1476	312007	1 - Parti - Fast 1500X1500	1				
UV.123	1476	1476	312007	1 - Parti - Fast 1500X1500	1				
UV.108	1476	1476	312007	1 - Parti - Fast 1500X1500	1				

312007: 3

312008




UV.002	976	2988	312008	2 - Partier - Fast + overparti 1000x3120mm	1				
UV.010	976	2988	312008	2 - Partier - Fast + overparti 1000x3120mm	1				

312008: 2




312009

UV.050	1978	2188	312009	1 - Parti - Fast 1978X2188	1				
UV.159	1978	2188	312009	1 - Parti - Fast 1978X2188	1				




312009: 2

Sag: Skærbæk skole		Sag nr. 17-041	 Friis & Moltke Åboulevarden 1, 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk Tlf: 72 10 00 52	
Emne: Vindueskema s. 2		Tegn. nr. A.X.652.s2	 Tækker Rådgivende Ingeniører AS Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk Tlf: 86 19 18 44	
Revision: Revision iht. skyer 06.07.2020 O		 Møller & Grønberg Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk Tlf: 86 20 32 00		
Dato: 2019.05.02	Papir: A3	Udførsel Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage		




ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	Akustik	Farve	Brandkrav	Tophængt motorstyret
312010									
UV.177	1976	788	312010	1 - Parti - Fast 2000X812	1				
UV.179	1976	788	312010	1 - Parti - Fast 2000X812	1				
312010: 2									
312011									
UV.158	1476	2976	312011	2 - Partier - Fast + overparti 1500x3000mm	1				Yes
UV.157	1476	2976	312011	2 - Partier - Fast + overparti 1500x3000mm	1				Yes
UV.105	1476	2976	312011	2 - Partier - Fast + overparti 1500x3000mm	1				Yes
312011: 3									
312012									
UV.142	2976	2976	312012	2 - Partier - Fast + overparti 3000x3000mm	1				Yes
312012: 1									
312013									
UV.017	1476	2988	312013	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 1500x3012mm	1				Yes
UV.021	1476	2988	312013	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 1500x3012mm	1				Yes
UV.036	1476	2988	312013	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 1500x3012mm	1				Yes
312013: 3									
312014									
UV.182	2199	2188	312014	1 - Parti - Fast 2223x2212	1				
312014: 1									
312015									
UV.186	2382	788	312015	1 - Parti - Fast 2406X812	1				
UV.170	2382	788	312015	1 - Parti - Fast 2406X812	1				
312015: 2									
312016									
UV.172	2382	2188	312016	1 - Parti - Fast 2406x2212	1				
UV.175	2382	2188	312016	1 - Parti - Fast 2406x2212	1				
312016: 2									
312017									
UV.176	3197	788	312017	1 - Parti - Fast 3221X812	1				
312017: 1									
312018									
UV.174	886	788	312018	1 - Parti - Opluk tophængt 910X812	1				Yes
312018: 1									
312019									
UV.178	2000	788	312019	1 - Parti - Fast 2024X812	1				
312019: 1									
312020									
UV.118	976	976	312020	1 - Parti - Opluk, Sidehængt Ud 1000X1000	1				
UV.154	976	976	312020	1 - Parti - Opluk, Sidehængt Ud 1000X1000	1				
312020: 2									
312021									
UV.144	1476	1476	312021	1 - Parti - Opluk, Sidehængt Ud 1500X1500	1				
UV.138	1476	1476	312021	1 - Parti - Opluk, Sidehængt Ud 1500X1500	1				
UV.137	1476	1476	312021	1 - Parti - Opluk, Sidehængt Ud 1500X1500	1				
UV.134	1476	1476	312021	1 - Parti - Opluk, Sidehængt Ud 1500X1500	1				
UV.133	1476	1476	312021	1 - Parti - Opluk, Sidehængt Ud 1500X1500	1				
UV.126	1476	1476	312021	1 - Parti - Opluk, Sidehængt Ud 1500X1500	1				
UV.107	1476	1476	312021	1 - Parti - Opluk, Sidehængt Ud 1500X1500	1				
UV.117	1476	1476	312021	1 - Parti - Opluk, Sidehængt Ud 1500X1500	1				
312021: 8									
312022									
UV.066	986	788	312022	1 - Parti - Opluk, tophængt 1010x812mm	1				Yes
312022: 1									

Sag: Skærbæk skole		Sag nr. 17-041	 Åboulevarden 1 , 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk Tlf: 72 10 00 52	
Emne: Vinduesskema s. 3		Tegn. nr.	 Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk Tlf: 86 19 18 44	
Revision: Revision iht. skyer 06.07.2020 O		A.X.652.s3	 Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk Tlf: 86 20 32 00	
Dato: 2019.05.02 Papir: A3			Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage	
Udførsel				




ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	Akustik	Farve	Brandkrav	Tophængt motorstyret
312023									
UV.037	1476	788	312023	1 - Parti - Opluk, tophængt 1500x812mm	1				Yes
UV.041	1476	788	312023	1 - Parti - Opluk, tophængt 1500x812mm	1				Yes
UV.044	1476	788	312023	1 - Parti - Opluk, tophængt 1500x812mm	1				Yes
UV.046	1476	788	312023	1 - Parti - Opluk, tophængt 1500x812mm	1				Yes
UV.053	1476	788	312023	1 - Parti - Opluk, tophængt 1500x812mm	1				Yes
UV.054	1476	788	312023	1 - Parti - Opluk, tophængt 1500x812mm	1				Yes
UV.057	1476	788	312023	1 - Parti - Opluk, tophængt 1500x812mm	1				Yes
UV.058	1476	788	312023	1 - Parti - Opluk, tophængt 1500x812mm	1				Yes
UV.086	1476	788	312023	1 - Parti - Opluk, tophængt 1500x812mm	1				Yes
UV.088	1476	788	312023	1 - Parti - Opluk, tophængt 1500x812mm	1				Yes
UV.189	1476	788	312023	1 - Parti - Opluk, tophængt 1500x812mm	1				Yes
312023: 11									
312024									
UV.076	1826	788	312024	1 - Parti - Opluk, tophængt 1850x812mm	1				Yes
UV.079	1826	788	312024	1 - Parti - Opluk, tophængt 1850x812mm	1				Yes
312024: 2									
312025									
UV.062	1976	788	312025	1 - Parti - Opluk, tophængt 2000x812mm	1				Yes
UV.064	1976	788	312025	1 - Parti - Opluk, tophængt 2000x812mm	1				Yes
UV.067	1976	788	312025	1 - Parti - Opluk, tophængt 2000x812mm	1				Yes
UV.069	1976	788	312025	1 - Parti - Opluk, tophængt 2000x812mm	1				Yes
UV.073	1976	788	312025	1 - Parti - Opluk, tophængt 2000x812mm	1				Yes
312025: 5									
312026									
UV.071	2326	788	312026	1 - Parti - Opluk, tophængt 2350x812mm	1				Yes
UV.080	2326	788	312026	1 - Parti - Opluk, tophængt 2350x812mm	1				Yes
UV.084	2326	788	312026	1 - Parti - Opluk, tophængt 2350x812mm	1				Yes
312026: 3									
312027									
UV.077	2926	788	312027	1 - Parti - Opluk, tophængt 2950x812mm	1				Yes
312027: 1									
312028									
UV.049	2976	788	312028	1 - Parti - Opluk, tophængt 3000x812mm	1				Yes
UV.164	2976	788	312028	1 - Parti - Opluk, tophængt 3000x812mm	1				Yes
312028: 2									
312029									
UV.151	976	2576	312029	2 - Partier - Fast + overparti 1000x2600mm	1				
312029: 1									
312030									
UV.112	976	2976	312030	2 - Partier - Fast + overparti 1000x3000mm	1				Yes
UV.113	976	2976	312030	2 - Partier - Fast + overparti 1000x3000mm	1				Yes
312030: 2									
312031									
UV.023	1476	2988	312031	2 - Partier - Fast + overparti 1500x3012mm	1				
312031: 1									
312032									
UV.033	2976	2076	312032	2 - Partier - Fast + overparti 3000x2100mm	1				Yes
312032: 1									
312033									
UV.025	976	2576	312033	2 - Partier - Opluk, Sidehængt ud 1000x2600mm	1				Yes
312033: 1									
312034									
UV.014	976	2988	312034	2 - Partier - Opluk, Sidehængt ud 1000x3012mm	1				
312034: 1									

Sag: Skærbæk skole		Sag nr. 17-041	 Åboulevarden 1, 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk Tlf: 72 10 00 52	
Emne: Vinduesskema s. 4		Tegn. nr.	 Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk Tlf: 86 19 18 44	
Revision: Revision iht. skyer 06.07.2020 O		A.X.652.s4	 Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk Tlf: 86 20 32 00	
Dato: 2019.05.02 Papir: A3			Udførsel Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage	

ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	Akustik	Farve	Brandkrav	Tophængt motorstyret
312035									
UV.018	976	2988	312035	2 - Partier - Opluk, Sidehængt ud 1000x3012mm	1				Yes
UV.019	976	2988	312035	2 - Partier - Opluk, Sidehængt ud 1000x3012mm	1				Yes
UV.022	976	2988	312035	2 - Partier - Opluk, Sidehængt ud 1000x3012mm	1				Yes
UV.007	976	2988	312035	2 - Partier - Opluk, Sidehængt ud 1000x3012mm	1				Yes
UV.020	976	2988	312035	2 - Partier - Opluk, Sidehængt ud 1000x3012mm	1				Yes
UV.013	976	2988	312035	2 - Partier - Opluk, Sidehængt ud 1000x3012mm	1				Yes
312035: 6									
312037									
UV.027	1476	2576	312037	2 - Partier - Opluk, Sidehængt ud 1500x2600mm	1				Yes
UV.016	1476	2576	312037	2 - Partier - Opluk, Sidehængt ud 1500x2600mm	1				Yes
UV.148	1476	2576	312037	2 - Partier - Opluk, Sidehængt ud 1500x2600mm	1				Yes
UV.129	1476	2576	312037	2 - Partier - Opluk, Sidehængt ud 1500x2600mm	1				Yes
UV.012	1476	2576	312037	2 - Partier - Opluk, Sidehængt ud 1500x2600mm	1				Yes
UV.109	1476	2576	312037	2 - Partier - Opluk, Sidehængt ud 1500x2600mm	1				Yes
UV.128	1476	2576	312037	2 - Partier - Opluk, Sidehængt ud 1500x2600mm	1				Yes
312037: 7									
312038									
UV.135	976	976	312038	1 - Parti - Fast 1000X1000	1				
UV.136	976	976	312038	1 - Parti - Fast 1000X1000	1				
UV.132	976	976	312038	1 - Parti - Fast 1000X1000	1				
UV.130	976	976	312038	1 - Parti - Fast 1000X1000	1				
UV.131	976	976	312038	1 - Parti - Fast 1000X1000	1				
UV.104	976	976	312038	1 - Parti - Fast 1000X1000	1				
UV.141	976	976	312038	1 - Parti - Fast 1000X1000	1				
UV.140	976	976	312038	1 - Parti - Fast 1000X1000	1				
UV.153	976	976	312038	1 - Parti - Fast 1000X1000	1				
UV.119	976	976	312038	1 - Parti - Fast 1000X1000	1				
312038: 10									
312039									
UV.078	1928	2188	312039	1 - Parti - Fast 1952X2212mm	1				
312039: 1									
312040									
UV.167	1976	2188	312040	1 - Parti - Fast 2000X2212	1				
UV.183	1976	2188	312040	1 - Parti - Fast 2000X2212	1				
312040: 2									
312041									
UV.011	1976	2176	312041	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x2200mm	1				Yes
UV.005	1976	2176	312041	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x2200mm	1				Yes
UV.004	1976	2176	312041	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x2200mm	1				Yes
UV.001	1976	2176	312041	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x2200mm	1				Yes
UV.003	1976	2176	312041	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x2200mm	1				Yes
312041: 5									
312042									
UV.028	1976	2576	312042	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x2600mm	1				Yes
UV.031	1976	2576	312042	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x2600mm	1				Yes
UV.139	1976	2576	312042	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x2600mm	1				Yes
UV.122	1976	2576	312042	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x2600mm	1				Yes
UV.103	1976	2576	312042	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x2600mm	1				Yes
UV.101	1976	2576	312042	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x2600mm	1				Yes
UV.115	1976	2576	312042	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x2600mm	1				Yes
UV.111	1976	2576	312042	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x2600mm	1				Yes
UV.155	1976	2576	312042	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x2600mm	1				Yes
UV.034	1976	2576	312042	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x2600mm	1				Yes
UV.152	1976	2576	312042	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x2600mm	1				Yes
312042: 11									
312043									
UV.106	1976	2976	312043	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x3000mm	1				Yes
312043: 1									
4993									
312044									
UV.146	2476	2576	312044	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2500x2600mm	1				Yes

Sag: Skærbæk skole		Sag nr. 17-041	 Friis & Moltke Åboulevarden 1, 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk Tlf: 72 10 00 52	
Emne: Vinduesskema s. 5		Tegn. nr.	 Tækker Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk Tlf: 86 19 18 44	
Revision: Revision iht. skyer 06.07.2020 O		A.X.652.s5 Udførsel	 Møller & Grønberg Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk Tlf: 86 20 32 00	
Dato: 2019.05.02 Papir: A3			Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage	

ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	Akustik	Farve	Brandkrav	Tophængt motorstyret
UV.150	2476	2576	312044	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2500x2600mm	1				Yes
UV.149	2476	2576	312044	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2500x2600mm	1				Yes
UV.110	2476	2576	312044	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2500x2600mm	1				Yes
312044: 4									
312045									
UV.015	2976	2076	312045	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 3000x2100mm	1				Yes
312045: 1									
312046									
UV.143	2976	2576	312046	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 3000x2600mm	1				Yes
UV.147	2976	2576	312046	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 3000x2600mm	1				Yes
UV.120	2976	2576	312046	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 3000x2600mm	1				Yes
UV.116	2976	2576	312046	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 3000x2600mm	1				Yes
UV.156	2976	2576	312046	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 3000x2600mm	1				Yes
312046: 5									
312047									
UV.035	2976	2988	312047	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 3000x3012mm	1				Yes
312047: 1									
312048									
UV.127	3976	2576	312048	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 4000x2600mm	1				Yes
UV.121	3976	2576	312048	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 4000x2600mm	1				Yes
UV.102	3976	2576	312048	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 4000x2600mm	1				Yes
312048: 3									
312049									
UV.184	2000	2188	312049	1 - Parti - Fast 2024X2212	1				
312049: 1									
312050									
UV.124	1976	2976	312050	3 - Partier - Opluk, Kip ind - 2000x3000mm	1				Yes
UV.125	1976	2976	312050	3 - Partier - Opluk, Kip ind - 2000x3000mm	1				Yes
UV.114	1976	2976	312050	3 - Partier - Opluk, Kip ind - 2000x3000mm	1				Yes
312050: 3									
312051									
UV.032	2976	2988	312051	2 - Partier - Fast + overparti 3000x3012mm	1				Yes
312051: 1									
312052									
UV.026	1976	2988	312052	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x3012mm	1				Yes
UV.030	1976	2988	312052	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x3012mm	1				Yes
UV.029	1976	2988	312052	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 2000x3012mm	1				Yes
312052: 3									
312053									
UV.009	1482	2988	312053	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 1506x3012mm	1				Yes
UV.008	1482	2988	312053	3 - Partier - Opluk, Sidehængt Ud - 1506x3012mm	1				Yes
312053: 2									
312054									
UV.006	976	2988	312054	2 - Partier - Fast + overparti 1000x3012mm	1				Yes
312054: 1									
312055									
UV.024	1986	788	312055	1 - Parti - Fast 2010X812	1				
312055: 1									
314001									
UV.093	2724	770	314001	314001 Oplukkeligt parti - Curtainwall	1				Yes
UV.094	1983	770	314001	314001 Oplukkeligt parti - Curtainwall	1				Yes
UV.095	2166	770	314001	314001 Oplukkeligt parti - Curtainwall	1				Yes
UV.096	2755	770	314001	314001 Oplukkeligt parti - Curtainwall	1				Yes
UV.097	1907	610	314001	314001 Oplukkeligt parti - Curtainwall	1				Yes
UV.098	2069	770	314001	314001 Oplukkeligt parti - Curtainwall	1				Yes
UV.092	1906	610	314001	314001 Oplukkeligt parti - Curtainwall	1				Yes

Sag: Skærbæk skole		Sag nr. 17-041	 Åboulevarden 1, 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk Tlf: 72 10 00 52	
Emne: Vinduesskema s. 6		Tegn. nr.	 Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk Tlf: 86 19 18 44	
Revision: Revision iht. skyer 06.07.2020 P		A.X.652.s6	 Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk Tlf: 86 20 32 00	
Dato: 2019.05.02 Papir: A3			Udførsel Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage	

ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	Akustik	Farve	Brandkrav	Tophængt motorstyret
UV.187	1907	661	314001	314001 Oplukkeligt parti - Curtainwall	1				Yes
UV.188	1906	661	314001	314001 Oplukkeligt parti - Curtainwall	1				Yes
UV.099	2072	770	314001	314001 Oplukkeligt parti - Curtainwall	1				Yes
UV.0100	2091	770	314001	314001 Oplukkeligt parti - Curtainwall	1				Yes
UV.0101	2094	770	314001	314001 Oplukkeligt parti - Curtainwall	1				Yes
UV.0102	2094	770	314001	314001 Oplukkeligt parti - Curtainwall	1				Yes
UV.0103	1907	598	314001	314001 Oplukkeligt parti - Curtainwall	1				Yes
UV.0104	1906	598	314001	314001 Oplukkeligt parti - Curtainwall	1				Yes
UV.0105	2845	770	314001	314001 Oplukkeligt parti - Curtainwall	1				Yes

314001: 16

322001

IV.058	296	2076	322001	322 - Indvendigt Vindue Fast 320x2100mm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
--------	-----	------	--------	---	---	------	------	--------	--

322001: 1

322002

IV. 130	303	2076	322002	322 - Indvendigt Vindue Fast 327x2100mm EI2 60 33dB	1	33dB	7016	EI2 60	
---------	-----	------	--------	---	---	------	------	--------	--

322002: 1

322003

IV. 126	303	2076	322003	322 - Indvendigt Vindue Fast 327x2100mm 200 karm EI2 60	1		7016	EI2 60	
---------	-----	------	--------	---	---	--	------	--------	--

322003: 1

322005

IV.016	426	2076	322005	322 - Indvendigt Vindue Fast 450x2100mm EI2 60 44dB	1	44dB	7016	EI2 60	
--------	-----	------	--------	---	---	------	------	--------	--

322005: 1

322006

IV.036	476	2076	322006	322 - Indvendigt Vindue Fast 500x2100mm	1		7016		
--------	-----	------	--------	---	---	--	------	--	--

322006: 1

322007

IV.035	576	2076	322007	322 - Indvendigt Vindue Fast 600x2100mm 33dB	1	33dB	7016	Uklassificeret glas	
--------	-----	------	--------	--	---	------	------	---------------------	--

322007: 1

322008

IV.004	576	2076	322008	322 - Indvendigt Vindue Fast 600x2100mm 44dB	1	44dB	7016	Uklassificeret glas	
--------	-----	------	--------	--	---	------	------	---------------------	--

322008: 1

322009

IV.026	576	2076	322009	322 - Indvendigt Vindue Fast 600x2100mm 200mm karm EI2 30	1		7016	EI2 30	
--------	-----	------	--------	---	---	--	------	--------	--

322009: 1

322010

IV.007	776	2076	322010	322 - Indvendigt Vindue Fast 800x2100mm	1		7016	Uklassificeret glas	
--------	-----	------	--------	---	---	--	------	---------------------	--

IV.009	776	2076	322010	322 - Indvendigt Vindue Fast 800x2100mm	1		7016	Uklassificeret glas	
--------	-----	------	--------	---	---	--	------	---------------------	--

322010: 2

322012

IV.018	776	2076	322012	322 - Indvendigt Vindue Fast 800x2100mm EI2 60 44dB	1	44dB	7016	EI2 60	
--------	-----	------	--------	---	---	------	------	--------	--

322012: 1

322013

IV.057	976	2076	322013	322 - Indvendigt Vindue Fast 1000x2100mm 200mm karm 44dB	1	44dB	7016		
--------	-----	------	--------	--	---	------	------	--	--

322013: 1

322014

IV.012	976	2076	322014	322 - Indvendigt Vindue Fast 1000x2100mm 200mm karm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
--------	-----	------	--------	---	---	------	------	--------	--

322014: 1

322015

IV.116	976	2076	322015	322 - Indvendigt Vindue Fast 1000x2100mm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
--------	-----	------	--------	--	---	------	------	--------	--

UV.047	976	2076	322015	322 - Indvendigt Vindue Fast 1000x2100mm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
--------	-----	------	--------	--	---	------	------	--------	--




UV.194	976	2076	322015	322 - Indvendigt Vindue Fast 1000x2100mm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
--------	-----	------	--------	--	---	------	------	--------	--

322015: 3




322016

IV. 131	1016	2076	322016	322 - Indvendigt Vindue Fast 1040x2100mm 150 karm 44dB	1	44dB	7016	Uklassificeret glas	
---------	------	------	--------	--	---	------	------	---------------------	--




322016: 1

Sag: Skærbæk skole		Sag nr. 17-041	•  FRIIS & MOLTKE		Åboulevarden 1 , 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk	Tlf: 72 10 00 52	
Emne: Vindueskema s. 7		Tegn. nr.	○  Tækker		Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk	Tlf: 86 19 18 44	
Revision: Revision iht. skyer		06.07.2020	○	○  Møller & Grønberg		Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk	Tlf: 86 20 32 00
Dato: 2019.05.02				Papir: A3		Udførsel	
				Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage			




ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	Akustik	Farve	Brandkrav	Tophængt motorstyret
322017									
IV.024	1076	2076	322017	322 - Indvendigt Vindue Fast 1100x2100mm 200 karm 44dB	1	44dB	7016	Uklassificeret glas	
322017: 1									
322018									
IV.020	1076	2076	322018	322 - Indvendigt Vindue Fast 1100x2100mm 200 karm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
IV.133	1076	2076	322018	322 - Indvendigt Vindue Fast 1100x2100mm 200 karm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
322018: 2									
322019									
IV.019	1076	2076	322019	322 - Indvendigt Vindue Fast 1100x2100mm EI2 30 35dB	1	35dB	7016	EI2 30	
322019: 1									
322020									
UV.039	1076	2076	322020	322 - Indvendigt Vindue Fast 1100x2100mm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
UV.198	1076	2076	322020	322 - Indvendigt Vindue Fast 1100x2100mm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
322020: 2									
322021									
IV.055	976	2076	322021	322 - Indvendigt Vindue Fast 1000x2100mm EI2 60 44dB	1	44dB	7016	EI2 60	
IV.013	1076	2076	322021	322 - Indvendigt Vindue Fast 1100x2100mm EI2 60 44dB	1	44dB	7016	EI2 60	
322021: 2									
322022									
IV.111	1148	2076	322022	322 - Indvendigt Vindue Fast 1172x2100mm EI2 60	1		7016	EI2 60	
322022: 1									
322023									
IV.056	1176	1726	322023	322 - Indvendigt Vindue Fast 1200x1750mm 200mm karm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
322023: 1									
322024									
IV.040	1176	2076	322024	322 - Indvendigt Vindue Fast 1200x2100mm 200mm karm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
IV. 136	1176	2076	322024	322 - Indvendigt Vindue Fast 1200x2100mm 200mm karm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
IV. 135	1176	2076	322024	322 - Indvendigt Vindue Fast 1200x2100mm 200mm karm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
322024: 3									
322025									
IV.015	1376	1726	322025	322 - Indvendigt Vindue Fast 1400x1750mm 200mm karm 44dB	1	44dB	7016		
322025: 1									
322026									
IV.037	1376	1726	322026	322 - Indvendigt Vindue Fast 1400x1750mm 200mm karm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
322026: 1									
322027									
IV.043	1376	2076	322027	322 - Indvendigt Vindue Fast 1400x2100mm 150mm karm 44dB	1	44dB	7016	Uklassificeret glas	
322027: 1									
322029									
UV.199	1526	2076	322029	322 - Indvendigt Vindue Fast 1550x2100mm 33dB	1	33dB	7016	Uklassificeret glas	
322029: 1									
322031									
IV.041	1563	2076	322031	322 - Indvendigt Vindue Fast 1587x2100mm 44dB	1		9016	Uklassificeret glas	
IV.129	1563	2076	322031	322 - Indvendigt Vindue Fast 1587x2100mm 44dB	1	44dB	7016	Uklassificeret glas	
322031: 2									
322032									
IV.039	1576	2076	322032	322 - Indvendigt Vindue Fast 1600x2100mm 200mm karm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
322032: 1									
322034									
IV.103	1676	2076	322034	322 - Indvendigt Vindue Fast 1700x2100mm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
IV.104	1676	2076	322034	322 - Indvendigt Vindue Fast 1700x2100mm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
IV.108	1676	2076	322034	322 - Indvendigt Vindue Fast 1700x2100mm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
IV.109	1676	2076	322034	322 - Indvendigt Vindue Fast 1700x2100mm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	

Sag: Skærbæk skole	Sag nr. 17-041		Åboulevarden 1 , 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk	Tlf: 72 10 00 52
	Tegn. nr.			Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk
Emne: Vinduesskema s. 8	A.X.652.s8			Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk
Revision: Revision iht. skyer 06.07.2020 O			Udførsel	Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage
Dato: 2019.05.02 Papir: A3				

ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	Akustik	Farve	Brandkrav	Tophængt motorstyret
322035									
IV.023	1676	2076	322035	322 - Indvendigt Vindue Fast 1700x2100mm 200mm karm 44dB	1	44dB	7016	Uklassificeret glas	
322035: 1									
322036									
IV.001	1776	2076	322036	322 - Indvendigt Vindue Fast 1800x2100mm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
IV.002	1776	2076	322036	322 - Indvendigt Vindue Fast 1800x2100mm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
IV.006	1776	2076	322036	322 - Indvendigt Vindue Fast 1800x2100mm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
322036: 3									
322037									
IV.005	1776	2076	322037	322 - Indvendigt Vindue Fast 1800x2100mm 150mm karm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
IV.101	1776	2076	322037	322 - Indvendigt Vindue Fast 1800x2100mm 150mm karm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
UV.048	1676	2076	322037	322 - Indvendigt Vindue Fast 1700x2100mm karm EI2 30 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
322037: 3									
322038									
IV.014	1876	2076	322038	322 - Indvendigt Vindue Fast 1900x2100mm EI2 60 44dB	1	44dB	7016	EI2 60	
322038: 1									
322039									
IV.022	2206	2076	322039	322 - Indvendigt Vindue Fast 2280x2100mm 200mm karm 44dB	1	44dB	7016	Uklassificeret glas	
322039: 1									
322042									
IV.027	2713	2076	322042	322 - Indvendigt Vindue Fast 2737x2100mm EI2 60 33dB	1	33dB	7016	EI2 60	
UV.168	2713	2076	322042	322 - Indvendigt Vindue Fast 2737x2100mm EI2 60 33dB	1		7016		
UV.169	2713	2076	322042	322 - Indvendigt Vindue Fast 2737x2100mm EI2 60 33dB	1		7016		
UV.185	2713	2076	322042	322 - Indvendigt Vindue Fast 2737x2100mm EI2 60 33dB	1		7016		
322042: 4									
322044									
IV.021	1476	2076	322044	322 - Indvendigt Vindue Fast 1500x2100mm 200 karm 44dB	1	44dB	7016	Uklassificeret glas	
322044: 1									
322045									
IV.128	2463	2076	322045	322 - Indvendigt Vindue Fast 2487x2100mm 44dB	1	44dB	7016	Uklassificeret glas	
322045: 1									
322046									
IV.017	2876	2076	322046	322 - Indvendigt Vindue Fast 2900x2100mm EI2 60 44dB	1	44dB	7016	EI2 60	
322046: 1									
322047									
UV.162	2595	2076	322047	322 - Indvendigt Vindue Fast 2619x2100mm 44dB	1	44dB	7016	Uklassificeret glas	
UV.193	2595	2076	322047	322 - Indvendigt Vindue Fast 2619x2100mm 44dB	1	44dB	7016	Uklassificeret glas	
322047: 2									
322050									
IV.042	3251	2076	322050	322 - Indvendigt Vindue Fast 3275x2100mm 200mm karm 44dB	1	44dB	7016	EI2 30	
322050: 1									
322051									
IV.025	3356	2076	322051	322 - Indvendigt Vindue Fast 3380x2100mm 33dB	1	33dB	7016		
322051: 1									
322052									
UV.195	2903	2076	322052	322 - Indvendigt Vindue Fast 2927x2100mm 44dB	1	44dB	7016	Uklassificeret glas	
322052: 1									
322053									
IV.010	4288	976	322053	322 - Indvendigt Vindue Fast 4312x1000mm EI2 60 44dB	1	44dB	7016	EI2 60	
322053: 1									
322054									
IV.033	4726	2076	322054	322 - Indvendigt Vindue Fast 4700x2100mm 33dB	1	33dB	7016	Uklassificeret glas	
322054: 1									
4997 322055									
IV. 053	1986	888	322055	322 - Indvendigt Vindue Fast 2010x912mm EI2 60 33dB	1	33dB	7016	EI2 60	

Sag: Skærbæk skole		Sag nr. 17-041	•  FRIIS & MOLTKE	Åboulevarden 1 , 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk	Tlf: 72 10 00 52
Emne: Vinduesskema s.9		Tegn. nr. A.X.652.s9	○  Tækker	Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk	Tlf: 86 19 18 44
Revision: Revision iht. skyer	06.07.2020	C	○  Møller & Grønberg	Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk	Tlf: 86 20 32 00
Dato: 12/11/19	Papir: A3	Udførsel	Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage		

ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	Akustik	Farve	Brandkrav	Tophængt motorstyret
322055: 1									
322057									
IV.045	1986	888	322057	322 - Indvendigt Vindue Fast 2010x912mm EI2 60 44dB	1	44dB	7016	EI2 60	
IV.046	1986	888	322057	322 - Indvendigt Vindue Fast 2010x912mm EI2 60 44dB	1	44dB	7016	EI2 60	
IV.047	1986	888	322057	322 - Indvendigt Vindue Fast 2010x912mm EI2 60 44dB	1	44dB	7016	EI2 60	
IV.048	1986	888	322057	322 - Indvendigt Vindue Fast 2010x912mm EI2 60 44dB	1	44dB	7016	EI2 60	
322057: 4									
322058									
IV.049	1076	888	322058	322 - Indvendigt Vindue Fast 1100x912mm EI2 60 44dB	1	44dB	7016	EI2 60	
322058: 1									
322059									
IV.051	776	888	322059	322 - Indvendigt Vindue Fast 800x912mm EI2 60 44dB	1	44dB	7016	EI2 60	
322059: 1									
322060									
IV.050	2876	888	322060	322 - Indvendigt Vindue Fast 2900x912mm EI2 60 44dB	1	44dB	7016	EI2 60	
322060: 1									
322061									
IV.052	426	888	322061	322 - Indvendigt Vindue Fast 450x912mm EI2 60 44dB	1	44dB	7016	EI2 60	
322061: 1									
322062									
IV.137	2337	2188	322062	1 - Parti - Fast 2361x2212	1		7016		
322062: 1									
322063									
IV.044	1876	888	322063	322 - Indvendigt Vindue Fast 1900x912mm EI2 60 44dB	1	44dB	7016	EI2 60	
322063: 1									
322065									
IV.054	2676	888	322065	322 - Indvendigt Vindue Fast 2700x912mm EI2 60 33dB	1	33dB	7016	EI2 60	
322065: 1									
322066									
UV.216	976	2076	322066	322 - Indvendigt Vindue Fast 1000x2100mm 150 karm	1	33dB	7016	Uklassificeret glas	
UV.217	976	2076	322066	322 - Indvendigt Vindue Fast 1000x2100mm 150 karm	1	33dB	7016	Uklassificeret glas	
UV.218	976	2076	322066	322 - Indvendigt Vindue Fast 1000x2100mm 150 karm	1	33dB	7016	Uklassificeret glas	
UV.219	976	2076	322066	322 - Indvendigt Vindue Fast 1000x2100mm 150 karm	1	33dB	7016	Uklassificeret glas	
322066: 4									
372001									
UV.206	2490	1120	372001	Double glazing, 2490 x 1180mm	1				
UV.207	2490	1120	372001	Double glazing, 2490 x 1180mm	1				
UV.208	2490	1120	372001	Double glazing, 2490 x 1180mm	1				
UV.209	2490	1120	372001	Double glazing, 2490 x 1180mm	1				
UV.210	2490	1120	372001	Double glazing, 2490 x 1180mm	1				
UV.211	2490	1120	372001	Double glazing, 2490 x 1180mm	1				
372001: 6									
372002									
UV.160	1200	1200	372002	Ovenlys 1200 x 1200	1				
UV.161	1200	1200	372002	Ovenlys 1200 x 1200	1				
UV.200	1200	1200	372002	Ovenlys 1200 x 1200	1				
UV.163	1200	1200	372002	Ovenlys 1200 x 1200	1				
372002: 4									
372003									
UV.201	1000	1000	372003	Brandventilation automatisk	1				
UV.300	1000	1000	372003	Brandventilation automatisk	1				
372003: 2									
372004									
UV.165	2000	2000	372004	Double glazing, 2000 x 2000mm	1				

Sag: Skærbæk skole		Sag nr. 17-041	•  FRIIS & MOLTKE	Åboulevarden 1 , 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk	Tlf: 72 10 00 52
Emne: Vinduesskema s.10		Tegn. nr. A.X.652.s10	○  Tækker	Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk	Tlf: 86 19 18 44
Revision: Revision iht. skyer		06.07.2020 N	○  Møller & Grønberg	Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk	Tlf: 86 20 32 00
Dato: 2019.05.02		Papir: A3	Udførsel		
Tegningsnummer: Fag Lokation A.X.14.E01 Tegningstype Løbenr./Etage					

ID	Bredde	Højde	Type kode	Type	Antal	Akustik	Farve	Brandkrav	Tophængt motorstyret
UV.166	2000	2000	372004	Double glazing, 2000 x 2000mm	1				
372004: 2									
372005									
UV.202	4620	1120	372005	Double glazing, 4620 x 1120 - 6 moduler	1				
UV.203	4620	1120	372005	Double glazing, 4620 x 1120 - 6 moduler	1				
UV.204	4620	1120	372005	Double glazing, 4620 x 1120 - 6 moduler	1				
UV.215	4620	1120	372005	Double glazing, 4620 x 1120 - 6 moduler	1				
UV.205	4620	1120	372005	Double glazing, 4620 x 1120 - 6 moduler	1				
372005: 5									
372006									
UV.212	6000	1120	372006	Double glazing, 6000 x 1120	1				
UV.213	6000	1120	372006	Double glazing, 6000 x 1120	1				
UV.214	6000	1120	372006	Double glazing, 6000 x 1120	1				
372006: 3									

Glasparti udvendig									
ID	Længde	Højde	Type kode	Type	Function	Count			
UGP.045	1176	2200	313001	216001 Udv. glasfacadesystem 300mm	Exterior	1			
UGP.003	11306	7556	313001	216001 Udv. glasfacadesystem 300mm	Exterior	1			
UGP.004	2371	2200	313001	216001 Udv. glasfacadesystem 300mm	Exterior	1			
UGP.014	3045	3000	313002	216002 Udv. glasfacadesystem 250mm	Exterior	1			
IGP.047	3045	3000	313002	216002 Udv. glasfacadesystem 250mm	Exterior	1			
UGP.013	1480	3000	313002	216002 Udv. glasfacadesystem 250mm	Exterior	1			
UGP.015	1480	3000	313002	216002 Udv. glasfacadesystem 250mm	Exterior	1			
UGP.012	2246	3000	313002	216002 Udv. glasfacadesystem 250mm	Exterior	1			
UGP.016	2835	3000	313002	216002 Udv. glasfacadesystem 250mm	Exterior	1			
IGP.046	1171	3000	313002	216002 Udv. glasfacadesystem 250mm	Exterior	1			
IGP.048	1171	3000	313002	216002 Udv. glasfacadesystem 250mm	Exterior	1			
UGP.010	4816	3000	313002	216002 Udv. glasfacadesystem 250mm	Exterior	1			
UGP.036	12660	3000	313002	216002 Udv. glasfacadesystem 250mm	Exterior	1			
UGP.034	6406	3000	313002	216002 Udv. glasfacadesystem 250mm	Exterior	1			
UGP.035	3332	3000	313002	216002 Udv. glasfacadesystem 250mm	Exterior	1			
UGP.038	2925	3000	313002	216002 Udv. glasfacadesystem 250mm	Exterior	1			

Grand total: 16



Solidt byggeri ...

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

5728449#0 - SV:SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [mailto:TO=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]
Til: 'Henrik Villefrance' [hv@friis-moltke.dk]; 'Henning Skriver' [hs@kraftman.dk]; 'Arne Borum Linnet' [al@fmbygningsdrift.dk]; Palle Kudsk [PKU@toender.dk]; 'Kraftman Tømrer og Snedker' [ts@kraftman.dk]
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; 'Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk)' [al@fmbygningsdrift.dk]; 'Esben Jessen' [beregner@kraftman.dk]
Sendt dato: 04-08-2020 08:24
Modtaget Dato: 04-08-2020 08:24
Vedrørende: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?
Vedhæftninger: image003_149.png
image004_150.png
image005_149.png
image006_32.png
image007_18.png
image008_28.jpg
image009_9.jpg
image010_15.png
Re: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?.htm

Hej Henrik.

Der er ikke aftalt noget yderligere siden byggemødet.
Jeg har bedt Henning af flere omgange bestille inden hans ferie. Se vedhæftet.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk]
Sendt: 4. august 2020 08:18
Til: Henning Skriver; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen; Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk); Esben Jessen
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Morten

Jeg ved ikke om i har aftalt andet nede på byggepladsen, men aftalen på sidste byggemøde jeg var med til var at dørene skulle males i ral 7016 og 9016 som det fremgår af dørschemaet.

Ahh Henning du skal vel ikke gætte. Du er vist mere Rasmus modsat i stedet for at få det til at glide. 😊

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Sendt: 4. august 2020 07:57
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk) <al@fmbygningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Godmorgen Henrik

Hvis du læser tråden herunder – er farver vel forkerte og det rigtige ral nummer skal fremgå _ vi snakker varer til +2,8 mio – jeg vil ikke gætte mig til sagen

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T: 74622060
F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Sendt: 4. august 2020 07:49

Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet (<al@fmbyggningsdrift.dk> <al@fmbyggningsdrift.dk>); Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Jeg forstår ikke hvad i nu mangler

Er det hele ikke noteret på belåning / dørskema ?

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Sendt: 3. august 2020 14:36

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet (<al@fmbyggningsdrift.dk> <al@fmbyggningsdrift.dk>); Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej henrik

Går ud fra at du har det endelige med i morgen – inkl farver og glas/lyd etc... VI kan ikke vente mere
Vi må og skal have det endelige materiale NU

Mødet er i morgen kl 13

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T: 74622060
F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henning Skriver

Sendt: 3. august 2020 08:59

Til: Henrik Villefrance; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

5003

Der er møde kl 13 i morgen som tidligere aftalt

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T:74622060
F:7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henrik Villefrance [<mailto:hv@friis-moltke.dk>]
Sendt: 3. august 2020 08:58
Til: Henning Skriver; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Som jeg har sagt før så deltager jeg gerne i et møde med din dør producent hvis der er spørgsmål.

Den hvide er samme farve som i udbud
Den sorte er på ønske fra bygherre lavet om til mørk grå, som vi snakkede om på sidste byggemøde.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Sendt: 10. juli 2020 12:23
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>
Cc: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Arne

Hele verden er forvirret i det nye dørschema er alle farver rettet til 9016
Nu skal I lige passe på for så passer ståldøre ikke til idealcombi og ej heller til alu/alu døre
Udhusedøre og er også rettet selv om de er leveret og monteret i ral 9004

Jeg ser mig ikke i stand til at bestille inden jeg har et retvisende udbud – herunder
Hvis jeg har noget i dag – kan jeg sikkert leverer uge 38 (døre) og glaspartier uge 40

Jeg rykker og rykker – siden januar og vi er ikke i mål endnu

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T:74622060
F:7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Sendt: 10. juli 2020 08:25
Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Cc: hv@friis-moltke.dk; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Emne: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Jeg vil blot lige høre nærmere ind til leveringstiden på dørene som vi snakkede om efter byggemødet i tirsdags.

Er dørene bestilt + indvendige glaspartier?

Jeg forstod på mødet at Bygma kunne reducerer de 10-12 uger. Men var siger ordrebekræftelsen ift. leveringsuge som jeg kan tilrette tidsplanen efter?

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923

Mail: al@fmbygningsdrift.dk

Web: www.fmbygningsdrift.dk



Hovedkontor:

FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:

FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg













RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR



Solidt byggeri ...

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

5730726#0 - SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsu

Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Henning Skriver [hs@kraftman.dk]; Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk]; Palle Kudsk [PKU@toender.dk]; Kraftman Tømrer og Snedker [ts@kraftman.dk]
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk) [al@fmbygningsdrift.dk]; Esben Jessen [beregner@kraftman.dk]
Sendt dato: 04-08-2020 08:31
Modtaget Dato: 04-08-2020 08:31
Vedrørende: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?
Vedhæftninger: image001_366.png
image002_381.png
image003_384.png
image004_384.png
image005_384.png
image006_272.jpg
image007_122.jpg
image008_34.png

Hej Morten

Jeg kan heller ikke forstå at det skal være et så stort problem at sætte de døre i ordre..

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 4. august 2020 08:24

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Henning Skriver <hs@kraftman.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk) <al@fmbygningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henrik.

Der er ikke aftalt noget yderligere siden byggemødet.
Jeg har bedt Henning af flere omgange bestille inden hans ferie. Se vedhæftet.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk]

Sendt: 4. august 2020 08:18

Til: Henning Skriver; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen; Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk); Esben Jessen

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Morten

Jeg ved ikke om i har aftalt andet nede på byggepladsen, men aftalen på sidste byggemøde jeg var med til var at dørene skulle males i ral 7016 og 9016 som det fremgår af dørschemaet.

Ahh Henning du skal vel ikke gætte. Du er vist mere Rasmus modsat i stedet for at få det til at glide. 😊

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Sendt: 4. august 2020 07:57

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Godmorgen Henrik

Hvis du læser tråden herunder – er farver vel forkerte og det rigtige ral nummer skal fremgå _ vi snakker varer til +2,8 mio – jeg vil ikke gætte mig til sagen

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S

T:74622060

F:7462 2080



www.kraftman.dk

Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Sendt: 4. august 2020 07:49

Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Jeg forstår ikke hvad i nu mangler

Er det hele ikke noteret på belåning / dørschema ?

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Sendt: 3. august 2020 14:36

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej henrik

Går ud fra at du har det endelige med i morgen – inkl farver og glas/lyd etc... VI kan ikke vente mere
Vi må og skal have det endelige materiale NU

Mødet er i morgen kl 13

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S

T:74622060



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henning Skriver
Sendt: 3. august 2020 08:59
Til: Henrik Villefrance; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Der er møde kl 13 i morgen som tidligere aftalt

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T:74622060
F:7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henrik Villefrance [<mailto:hv@friis-moltke.dk>]
Sendt: 3. august 2020 08:58
Til: Henning Skriver; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Som jeg har sagt før så deltager jeg gerne i et møde med din dør producent hvis der er spørgsmål.

Den hvide er samme farve som i udbud

Den sorte er på ønske fra bygherre lavet om til mørk grå, som vi snakkede om på sidste byggemøde.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Sendt: 10. juli 2020 12:23
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>
Cc: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Arne

Hele verden er forvirret i det nye dørskema er alle farver rettet til 9016
Nu skal I lige passe på for så passer ståldøre ikke til idealcombi og ej heller til alu/alu døre
Udhudsdøre og er også rettet selv om de er leveret og monteret i ral 9004

Jeg ser mig ikke i stand til at bestille inden jeg har et retvisende udbud – herunder
Hvis jeg har noget i dag – kan jeg sikkert leverer uge 38 (døre) og glaspartier uge 40

Jeg rykker og rykker – siden januar og vi er ikke i mål endnu

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S

T:74622060
F:7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Sendt: 10. juli 2020 08:25
Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Cc: hv@friis-moltke.dk; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Emne: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Jeg vil blot lige høre nærmere ind til leveringstiden på dørene som vi snakkede om efter byggemødet i tirsdags.

Er dørene bestilt + indvendige glaspartier?

Jeg forstod på mødet at Bygma kunne reducerer de 10-12 uger. Men var siger ordrebekræftelsen ift. leveringsuge som jeg kan tilrette tidsplanen efter?

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet
Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbyggningsdrift.dk
Web: www.fmbyggningsdrift.dk



Hovedkontor:	Afdeling Sverige:
FM Bygningsdrift ApS	FM Management AB
Bryggergade 6A, 1.	Bergaliden 11
7400 Herning	252 23 Helsingborg













RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR



Solidt byggeri ...

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

5728461#0 - SV Vedr. vores aftaleseddel 50, afdækning vindspærre

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]
Til: 'Arne Borum Linnet' [al@fmbygningsdrift.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]; 'Henning Skriver' [hs@kraftman.dk]
Cc: 'hv@friis-moltke.dk' [hv@friis-moltke.dk]; 'Søren Aaby' [saa@fmbygningsdrift.dk]; Palle Kudsk [PKU@toender.dk]
Sendt dato: 04-08-2020 08:33
Modtaget Dato: 04-08-2020 08:33
Vedrørende: SV: Vedr. vores aftaleseddel 50, afdækning vindspærre
Vedhæftninger: image003_152.png
image004_153.png
image005_152.png
image006_33.png
image007_20.png
image008_30.jpg
image009_17.png
image010_8.jpg

Hej Henning.

Se Sunes svar i tråden fra d. 10 juli.

- Jeg har ligeledes kommenteret på det igen i vores mail korrespondance "SV: SSK - TØ sSrosser og motorer - IKKE godkendt af Tilsyn - Døre ikke bestilt"

"Jeg kan kun sige med henvisning til Sunes mail, at så længe det ekstrakrav fra Jer, som Friis og Moltke eller TK er uenig i, så må forhandling herom ikke forsinke arbejdets udførelse. Det er nævnt af flere omgang ved udvendig beklædning."

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Arne Borum Linnet [mailto:al@fmbygningsdrift.dk]
Sendt: 3. august 2020 19:43
Til: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen; Sune Bundesen
Cc: hv@friis-moltke.dk; Søren Aaby
Emne: VS: Vedr. vores aftaleseddel 50, afdækning vindspærre

Hej med jer

Henning hører indtil nedenstående som omhandler aftaleseddel nr. 50 fra deres side.

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbygningsdrift.dk
Web: www.fmbygningsdrift.dk



Hovedkontor: FM Bygningsdrift ApS
Byggegade 6A, 1.
Afdeling Sverige: FM Management AB
Bergaliden 11

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Sendt: 3. august 2020 17:15
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Jan M. Løper <adm@kraftman.dk>
Emne: SV: Vedr. vores aftaleseddel 50, afdækning vindspærre

Hej arne

Er vi enige om denne i m2 priser

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T: 7462 2060
F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Arne Borum Linnet [<mailto:al@fmbyggningsdrift.dk>]
Sendt: 10. juli 2020 14:49
Til: Morten Bramstrup Jakobsen; Sune Bundesen
Cc: hv@friis-moltke.dk; Søren Aaby; Palle Kudsk; Henning Skriver
Emne: VS: Vedr. vores aftaleseddel 50, afdækning vindspærre

Se nedenstående fra Kraftman ift. afdækning af vindpladerne.

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet
Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbyggningsdrift.dk
Web: www.fmbyggningsdrift.dk



Hovedkontor: FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige: FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Sendt: 10. juli 2020 14:07
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: hv@friis-moltke.dk; Lars Mathiesen <lm@fmbyggningsdrift.dk>; Søren Aaby <saa@fmbyggningsdrift.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Emne: Re: Vedr. vores aftaleseddel 50, afdækning vindspærre

Hej Sune

Vi fastholder og henviser til mødereferater
I bedes kommentere jvf AB-12
Hvor i ikke kan forlange dette af mig
AB 92 stk 1

Med venlig hilsen

HENNING SKRIVER

KRAFTMAN A/S
T: 7462 2060

Se meget mere på www.kraftman.dk

Den 10. jul. 2020 kl. 13.09 skrev Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>:

Hej Henning

Se nedenstående svar fra BH omkring jeres aftaleseddel vedr. afdækning af vindspærre.

Aftalesedlen er afvist.

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet
Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbyggningsdrift.dk
Web: www.fmbyggningsdrift.dk

<image001.png>

Hovedkontor: FM Bygningsdrift ApS Bryggergade 6A, 1. 7400 Herning	Afdeling Sverige: FM Management AB Bergaliden 11 252 23 Helsingborg
---	---

Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>

Sendt: 10. juli 2020 13:08

Til: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Cc: Lars Mathiesen <lm@fmbyggningsdrift.dk>; hv@friis-moltke.dk

Emne: SV: Vedr. vores aftaleseddel 50, afdækning vindspærre

Hej Arne

Bygherre afviser aftalesedlen.

Vi er ikke enige i at begrundelsen for at vindspærren har været uafdækket så længe, skyldes bygherren.

Tønder Kommune er af den opfattelse, at Kraftman har undladt at bestille nødvendige materialer for færdiggørelse af facader.

Da Kraftman mener at de er berettiget til ekstra betaling for ovenstående, hvilket Tønder Kommune og Friis & Moltke ikke er enige i, må en sådan uenighed ikke standse arbejdet jf. AB92.

Vi vil ikke betale for afdækning af en vindspærre der har overskredet garantien.

Venlig hilsen

Sune Bundesen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

<image003.png>

<image004.png>

<image005.png>

<image006.png>

5028
<image007.png>

<image008.jpg>

Fra: Arne Borum Linnet [<mailto:al@fmbyggningsdrift.dk>]
Sendt: 10. juli 2020 12:09
Til: Sune Bundesen; Morten Bramstrup Jakobsen
Cc: Lars Mathiesen; lv@friis-moltke.dk
Emne: VS: Vedr. vores aftaleseddel 50, afdækning vindspærre

Hvordan er jeres holdning til denne aftaleseddel? Skal vi lave den med vores løb nr. på?

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet
Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbyggningsdrift.dk
Web: www.fmbyggningsdrift.dk

<image001.png>

Hovedkontor:	Afdeling Sverige:
FM Bygningsdrift ApS	FM Management AB
Bryggergade 6A, 1.	Bergaliden 11
7400 Herning	252 23 Helsingborg

Fra: Jan M. Løper <adm@kraftman.dk>
Sendt: 10. juli 2020 12:00
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Emne: Vedr. vores aftaleseddel 50, afdækning vindspærre

Hej Arne

I henhold til aftale med Henning fremsendes jeg hermed aftaleseddel 50 vedr. afdækning af vindspærre.

Med venlig hilsen
KRAFTMAN A/S
Jan M. Løper
Økonomichef
Tlf. 7462 2060 – Mobil 2163 4070
Fax. 7462 2080
www.kraftman.dk

<image010.jpg>

Fra: mailservice@digitalgroup.dk <mailservice@digitalgroup.dk>
Sendt: 10. juli 2020 11:54
Til: Jan M. Løper <adm@kraftman.dk>
Emne: Scan fra Kraftman A/S













RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning



Solidt byggeri ...

5728486#0 - SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [mailto:TONDERKOM@OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]
Til: 'Esben Jessen' [mailto:beregner@kraftman.dk]; 'Henrik Villefrance' [mailto:hv@friis-moltke.dk]; 'Henning Skriver' [mailto:hs@kraftman.dk]; 'Arne Borum Linnet' [mailto:al@fmbygningsdrift.dk]; 'Palle Kudsk' [mailto:PKU@toender.dk]; 'Kraftman Tømrer og Snedker' [mailto:ts@kraftman.dk]
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen [mailto:kimkir@toender.dk]; 'Arne Borum Linnet' [mailto:al@fmbygningsdrift.dk]
Sendt dato: 04-08-2020 08:43
Modtaget Dato: 04-08-2020 08:43
Vedrørende: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?
Vedhæftninger: image001_66.jpg
image003_154.png
image004_155.png
image005_154.png
image006_36.png
image007_22.png
image008_32.jpg
image011_1.jpg
image014_0.jpg
image015_5.png

Hej Esben.

Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad der står ved udv. døre. ☺ - I har jo leveret de udvendige døre. Indvendige døre, der var sorte, er ændret fra sort til antracit, som det blev aftalt ved det omtalte byggemøde. – Og som det fremgår af skemaet.

Vi er klar over, at der er en farveforskel imellem en sort og antracitgrå, men det er nu engang det skolen ønsker.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Esben Jessen [mailto:beregner@kraftman.dk]

Sendt: 4. august 2020 08:34

Til: Morten Bramstrup Jakobsen; 'Henrik Villefrance'; Henning Skriver; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk)

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej morten

Som Henning skrev inden ferie er vi blevet usikre igen med rettelse Q på dørschema

Vi er nu næsten kommet gennem alfabetet med revisioner

På dørschema er alle udv. Døre rettet til 7016 som er **antracit og ikke sort**

Alle udvendige døre er leveret i 9004

Det samme fremgår af vinduesskema rev P

Du blander i to nye farver indv.

7016 +9016 (cremehvid)

Jeg skal bare have et endelig go fra jer – når vi sætter disse døre op mod de farver på udv. Vinduer er forskel enorm

Esben M. Jessen
Beregner / KS

KRAFTMAN A/S
Dir: 6023 1825



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 4. august 2020 08:24

Til: 'Henrik Villefrance' <hv@friis-moltke.dk>; Henning Skriver <hs@kraftman.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk) <al@fmbygningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henrik.

Der er ikke aftalt noget yderligere siden byggemødet.
Jeg har bedt Henning af flere omgange bestille inden hans ferie. Se vedhæftet.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Henrik Villefrance [<mailto:hv@friis-moltke.dk>]

Sendt: 4. august 2020 08:18

Til: Henning Skriver; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen; Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk); Esben Jessen

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Morten

Jeg ved ikke om i har aftalt andet nede på byggepladsen, men aftalen på sidste byggemøde jeg var med til var at dørene skulle males i ral 7016 og 9016 som det fremgår af dørschemaet.

Ahh Henning du skal vel ikke gætte. Du er vist mere Rasmus modsat i stedet for at få det til at glide. 😊

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Sendt: 4. august 2020 07:57

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk) <al@fmbygningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Godmorgen Henrik

Hvis du læser tråden herunder – er farver vel forkerte og det rigtige ral nummer skal fremgå _ vi snakker varer til +2,8 mio – jeg vil ikke gætte mig til sagen

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T: 74622060
F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Sendt: 4. august 2020 07:49

Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet (al@fmbyggningsdrift.dk) <al@fmbyggningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Jeg forstår ikke hvad i nu mangler

Er det hele ikke noteret på belåning / dørskema ?

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Sendt: 3. august 2020 14:36

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet (al@fmbyggningsdrift.dk) <al@fmbyggningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej henrik

Går ud fra at du har det endelige med i morgen – inkl farver og glas/lyd etc... VI kan ikke vente mere
Vi må og skal have det endelige materiale NU

Mødet er i morgen kl 13

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T: 74622060
F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

5040

Fra: Henning Skriver
Sendt: 3. august 2020 08:59
Til: Henrik Villefrance; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Der er møde kl 13 i morgen som tidligere aftalt

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T: 74622060
F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henrik Villefrance [<mailto:hv@friis-moltke.dk>]
Sendt: 3. august 2020 08:58
Til: Henning Skriver; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Som jeg har sagt før så deltager jeg gerne i et møde med din dør producent hvis der er spørgsmål.

Den hvide er samme farve som i udbud
Den sorte er på ønske fra bygherre lavet om til mørk grå, som vi snakkede om på sidste byggemøde.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Sendt: 10. juli 2020 12:23
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>
Cc: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Arne

Hele verden er forvirret i det nye dørschema er alle farver rettet til 9016
Nu skal I lige passe på for så passer ståldøre ikke til idealcombi og ej heller til alu/alu døre
Udhudsdøre og er også rettet selv om de er leveret og monteret i ral 9004

Jeg ser mig ikke i stand til at bestille inden jeg har et retvisende udbud – herunder
Hvis jeg har noget i dag – kan jeg sikkert leverer uge 38 (døre) og glaspartier uge 40

Jeg rykker og rykker – siden januar og vi er ikke i mål endnu

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T: 74622060
F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

5041

Fra: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Sendt: 10. juli 2020 08:25

Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Cc: hv@friis-moltke.dk; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Emne: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Jeg vil blot lige høre nærmere ind til leveringstiden på dørene som vi snakkede om efter byggemødet i tirsdags.

Er dørene bestilt + indvendige glaspartier?

Jeg forstod på mødet at Bygma kunne reducerer de 10-12 uger. Men var siger ordrebekræftelsen ift. leveringsuge som jeg kan tilrette tidsplanen efter?

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923

Mail: al@fmbyggningsdrift.dk

Web: www.fmbyggningsdrift.dk



Hovedkontor:

FM Byggningsdrift ApS

Bryggergade 6A, 1.

7400 Herning

Afdeling Sverige:

FM Management AB

Bergaliden 11

252 23 Helsingborg















RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR



Solidt byggeri ...



Solidt byggeri ...

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

5730719#0 - SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsu

Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Sendt dato: 04-08-2020 08:50
Modtaget Dato: 04-08-2020 08:50
Vedrørende: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?
Vedhæftninger: image002_378.png
image003_383.png
image004_383.png
image005_383.png
image006_91.png
image007_121.jpg
image008_73.jpg
image009_24.jpg
image010_20.jpg
image011_33.png

Tak .. 😊

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Sendt: 4. august 2020 08:44
Til: 'Esben Jessen' <beregner@kraftman.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Henning Skriver <hs@kraftman.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet (al@fmbyggningsdrift.dk) <al@fmbyggningsdrift.dk>
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Esben.

Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad der står ved udv. døre. ☺ - I har jo leveret de udvendige døre. Indvendige døre, der var sorte, er ændret fra sort til antracit, som det blev aftalt ved det omtalte byggemøde. - Og som det fremgår af skemaet.

Vi er klar over, at der er en farveforskel imellem en sort og antracitgrå, men det er nu engang det skolen ønsker.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Esben Jessen [<mailto:beregner@kraftman.dk>]
Sendt: 4. august 2020 08:34
Til: Morten Bramstrup Jakobsen; 'Henrik Villefrance'; Henning Skriver; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; Arne Borum Linnet (al@fmbyggningsdrift.dk)
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej morten

Som Henning skrev inden ferie er vi blevet usikre igen med rettelse Q på dørschema
Vi er nu næsten kommet gennem alfabetet med revisioner

På dørschema er alle udv. Døre rettet til 7016 som er **antracit og ikke sort**

Alle udvendige døre er leveret i 9004

Det samme fremgår af vinduesskema rev P

5053
Du blander i to nye farver indv.

7016 +9016 (cremehvid)

Jeg skal bare have et endelig go fra jer – når vi sætter disse døre op mod de farver på udv. Vinduer er forskel enorm

Esben M. Jessen
Beregner / KS

KRAFTMAN A/S

Dir: 6023 1825



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 4. august 2020 08:24

Til: 'Henrik Villefrance' <hv@friis-moltke.dk>; Henning Skriver <hs@kraftman.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet (<al@fmbyggningsdrift.dk>) <al@fmbyggningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henrik.

Der er ikke aftalt noget yderligere siden byggemødet.
Jeg har bedt Henning af flere omgange bestille inden hans ferie. Se vedhæftet.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Henrik Villefrance [<mailto:hv@friis-moltke.dk>]

Sendt: 4. august 2020 08:18

Til: Henning Skriver; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen; Arne Borum Linnet (<al@fmbyggningsdrift.dk>); Esben Jessen

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Morten

Jeg ved ikke om i har aftalt andet nede på byggepladsen, men aftalen på sidste byggemøde jeg var med til var at dørene skulle males i ral 7016 og 9016 som det fremgår af dørschemaet.

Ahh Henning du skal vel ikke gætte. Du er vist mere Rasmus modsat i stedet for at få det til at glide. 😊

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

5054
Henrik Villefrance

Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Sendt: 4. august 2020 07:57

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet (<al@fmbyggningsdrift.dk>)

<al@fmbyggningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Godmorgen Henrik

Hvis du læser tråden herunder – er farver vel forkerte og det rigtige ral nummer skal fremgå _ vi snakker varer til +2,8 mio – jeg vil ikke gætte mig til sagen

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S

T:74622060

F:7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Sendt: 4. august 2020 07:49

Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet (<al@fmbyggningsdrift.dk>)

<al@fmbyggningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Jeg forstår ikke hvad i nu mangler

Er det hele ikke noteret på belåning / dørskema ?

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Sendt: 3. august 2020 14:36

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet (<al@fmbyggningsdrift.dk>)

<al@fmbyggningsdrift.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej henrik

Går ud fra at du har det endelige med i morgen – inkl farver og glas/lyd etc... VI kan ikke vente mere
Vi må og skal have det endelige materiale NU

Mødet er i morgen kl 13

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S

T:74622060

F:7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henning Skriver
Sendt: 3. august 2020 08:59
Til: Henrik Villefrance; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Der er møde kl 13 i morgen som tidligere aftalt

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T: 74622060
F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henrik Villefrance [<mailto:hv@friis-moltke.dk>]
Sendt: 3. august 2020 08:58
Til: Henning Skriver; Arne Borum Linnet; Palle Kudsk; Kraftman Tømrer og Snedker
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Som jeg har sagt før så deltager jeg gerne i et møde med din dør producent hvis der er spørgsmål.

Den hvide er samme farve som i udbud

Den sorte er på ønske fra bygherre lavet om til mørk grå, som vi snakkede om på sidste byggemøde.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Sendt: 10. juli 2020 12:23
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kraftman Tømrer og Snedker <ts@kraftman.dk>
Cc: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: SV: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Arne

Hele verden er forvirret i det nye dørschema er alle farver rettet til 9016
Nu skal I lige passe på for så passer ståldøre ikke til idealcombi og ej heller til alu/alu døre
Udhusdøre og er også rettet selv om de er leveret og monteret i ral 9004

Jeg ser mig ikke i stand til at bestille inden jeg har et retvisende udbud – herunder
Hvis jeg har noget i dag – kan jeg sikkert leverer uge 38 (døre) og glaspartier uge 40

Jeg rykker og rykker – siden januar og vi er ikke i mål endnu

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S
T: 74622060

5096



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Sendt: 10. juli 2020 08:25

Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Cc: hv@friis-moltke.dk; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Emne: SSK - Indvendige døre / glaspartier - Leveringsuge?

Hej Henning

Jeg vil blot lige høre nærmere ind til leveringstiden på dørene som vi snakkede om efter byggemødet i tirsdags.

Er dørene bestilt + indvendige glaspartier?

Jeg forstod på mødet at Bygma kunne reducerer de 10-12 uger. Men var siger ordrebekræftelsen ift. leveringsuge som jeg kan tilrette tidsplanen efter?

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923

Mail: al@fmbyggningsdrift.dk

Web: www.fmbyggningsdrift.dk



Hovedkontor:

FM Byggningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:

FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg













RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR



Solidt byggeri ...





Solidt byggeri ...

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

5739364#0 - 06 Tilsynsnoter vedr. inventar

Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk)' [hv@friis-moltke.dk]
Cc: 'Morten Højer (moh@taekker.dk)' [moh@taekker.dk]; 'Kasper Bornstein Larsen (kbl@taekker.dk)' [kbl@taekker.dk]
Sendt dato: 04-08-2020 13:32
Modtaget Dato: 04-08-2020 13:32
Vedrørende: VS: Tilsynsnoter vedr. inventar til Skærbæk Skole
Vedhæftninger: Report-03-08-2020, 14.20.10.pdf

Hej Henrik

Jeg har fået vedhæftede fra Inventarentreprisen. Vil I tage et kig på det.

Venlig hilsen


Sune Bundesen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk



OL_Logo



Fra: Henrik Søndberg [mailto:hso@st-skoleinventar.dk]
Sendt: 3. august 2020 14:27
Til: Sune Bundesen
Cc: Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk); Gert Michaelsen
Emne: Tilsynsnoter vedr. inventar til Skærbæk Skole

Hej Sune!

Jeg har udskrevet en "rapport" vedr. tilsynsnotater som vi gerne vil have besvaret hurtigst muligt... kan du svarer på disse?

Jeg har udover dette følgende spørgsmål:

- Vi mangler en nøgle kode og system nr. på de skabe der skal lås i, vil du finde disse?

Tusinde tak!

Med venlig hilsen / Kind regards

Henrik Søndberg


Salgs- og Projektkonsulent




ST Skoleinventar A/S
Gl. Kongevej 14-20
6880 Tarm, Denmark

+45 3078 7026 Mobile
+45 9737 1188 Main office

hso@st-skoleinventar.dk
www.st-skoleinventar.dk





Skærbæk ny skole - 149636



Gamle Kongevej 14
6880 Tarm
97 37 11 88
info@st-skoleinventar.dk

#9	Type: KS	Projektmappe: Skærbæk ny skole - 149636
Tidsfrist fra: 03-08-20 - Til: 03-08-20		Kategori/Liste: 01 ST. Skoleinventar (DK/NO) / 2.0 Tilsyns notat
Beskrivelse		Ansvarlig
Hso: bliver disse stikkontakter blændet af?		OPRETET 03-08-20, 14:17:49
Seneste kommentar		ST Skoleinventar A/S Henrik Søndberg

Fotos 1: 03-08-20, 14:17:24



Tegning: A-1-140-E0 - Etageplan E0.pdf-



Fotos 2:

Fotos 3:

Fotos 4:

Fotos 5:


Skærbæk ny skole - 149636



Gamle Kongevej 14
6880 Tarm
97 37 11 88
info@st-skoleinventar.dk

#8	Type: KS	Projektmappe: Skærbæk ny skole - 149636
Tidsfrist fra: 03-08-20 - Til: 03-08-20	Kategori/Liste: 01 ST. Skoleinventar (DK/NO) / 2.0 Tilsyns notat	
Beskrivelse		Ansvarlig
Hso: el-installationer sidder så der er kollision med skabe... skal vi gøre bordpladen lidt mindre eller større? Hvis bordpladen skal være større skal vi lave et skab der er mindre..		OPRETTET 03-08-20, 14:15:19 ST Skoleinventar A/S Henrik Søndberg
Seneste kommentar		0

Fotos 1: 03-08-20, 14:15:19

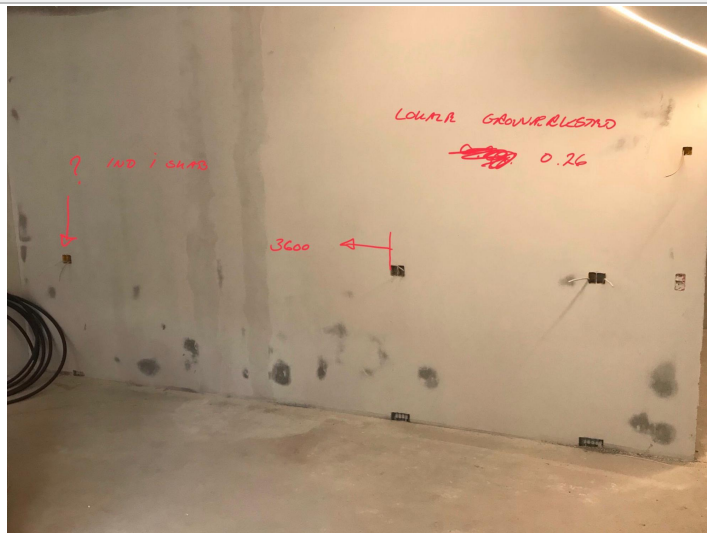

Tegning: A-1-140-E0 - Etageplan E0.pdf-



Fotos 2:

Fotos 3:

Fotos 4:

Fotos 5:

Skærbæk ny skole - 149636



Gamle Kongevej 14
6880 Tarm
97 37 11 88
info@st-skoleinventar.dk

#7	Type: KS	Projektmappe: Skærbæk ny skole - 149636
Tidsfrist fra: 03-08-20 - Til: 03-08-20		Kategori/Liste: 01 ST. Skoleinventar (DK/NO) / 2.0 Tilsyns notat
Beskrivelse		Ansvarlig
HSD: forstærkning i væggen til bordbæring..		OPRETET 03-08-20, 14:10:25
Seneste kommentar		ST Skoleinventar A/S Henrik Søndberg

Fotos 1: 03-08-20, 14:10:25



Tegning: A-2-140-E0 - Etageplan E0.pdf-



Fotos 2:

Fotos 3:

Fotos 4:

Fotos 5:

Skærbæk ny skole - 149636




Gamle Kongevej 14
6880 Tarm
97 37 11 88
info@st-skoleinventar.dk

#6	Type: KS	Projektmappe: Skærbæk ny skole - 149636
Tidsfrist fra: 03-08-20 - Til: 03-08-20		Kategori/Liste: 01 ST. Skoleinventar (DK/NO) / 2.0 Tilsyns notat
Beskrivelse		Ansvarlig
HSD: EL-installationer sidder forkert i forhold til beskrivelsen af sidde trappen.. bliver installationerne flyttet?		OPRETTET 03-08-20, 14:05:33
Seneste kommentar		ST Skoleinventar A/S Henrik Søndberg

Fotos 1: 03-08-20, 14:05:33



Tegning: A-2-141-E1 - Etageplan E1.pdf-

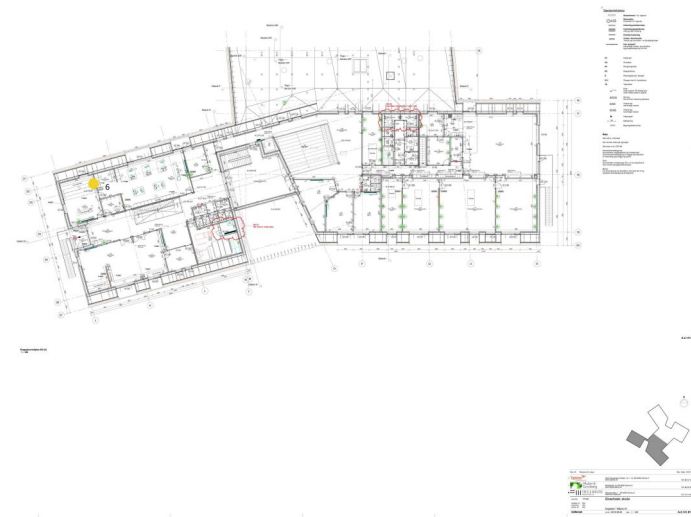

Fotos 2:

Fotos 3:

Fotos 4:

Fotos 5:


Skærbæk ny skole - 149636



Gamle Kongevej 14
6880 Tarm
97 37 11 88
info@st-skoleinventar.dk

#5	Type: KS	Projektmappe: Skærbæk ny skole - 149636
Tidsfrist fra: 03-08-20 - Til: 03-08-20		Kategori/Liste: 01 ST. Skoleinventar (DK/NO) / 2.0 Tilsyns notat
Beskrivelse		Ansvarlig
HSD: Installationer til vand og strøm sidder i front af opv. Og ovn..		OPRETTET 03-08-20, 14:02:44
Seneste kommentar		ST Skoleinventar A/S Henrik Søndberg

Fotos 1: 03-08-20, 14:02:44

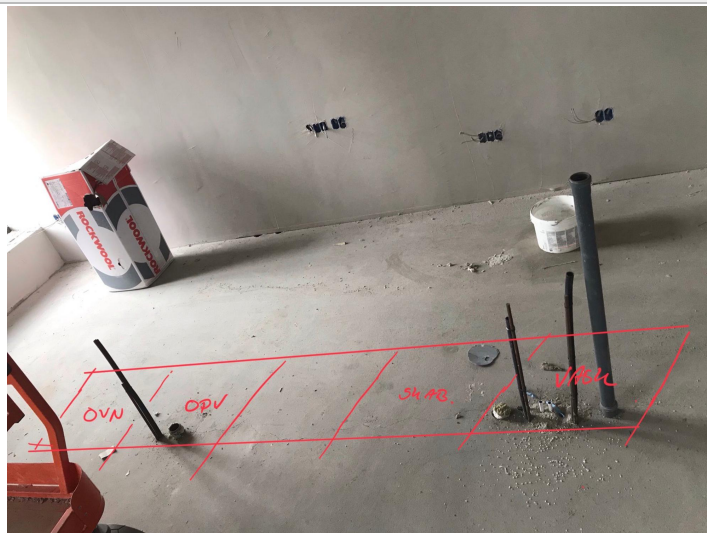

Tegning: A-2-141-E1 - Etageplan E1.pdf-



Fotos 2:

Fotos 3:

Fotos 4:

Fotos 5:


Skærbæk ny skole - 149636



Gamle Kongevej 14
6880 Tarm
97 37 11 88
info@st-skoleinventar.dk

#4	Type: KS	Projektmappe: Skærbæk ny skole - 149636
Tidsfrist fra: 03-08-20 - Til: 03-08-20		Kategori/Liste: 01 ST. Skoleinventar (DK/NO) / 2.0 Tilsyns notat
Beskrivelse		Ansvarlig
HSO: el installationer sidder for lavt... de sidder i skabene... skal de det?		OPRETTET 03-08-20, 14:01:06
Seneste kommentar		ST Skoleinventar A/S Henrik Søndberg

Fotos 1: 03-08-20, 14:01:06

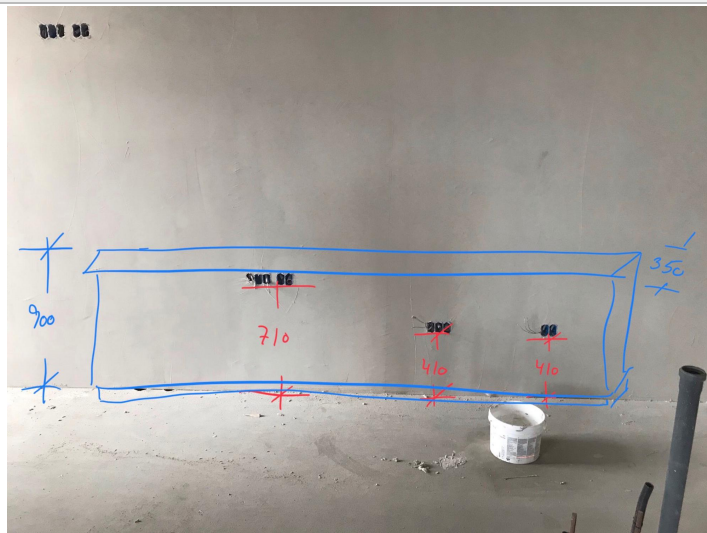

Tegning: A-2-141-E1 - Etageplan E1.pdf-



Fotos 2:

Fotos 3:

Fotos 4:

Fotos 5:

Skærbæk ny skole - 149636



Gamle Kongevej 14
6880 Tarm
97 37 11 88
info@st-skoleinventar.dk

#3	Type: KS	Projektmappe: Skærbæk ny skole - 149636
Tidsfrist fra: 03-08-20 - Til: 03-08-20		Kategori/Liste: 01 ST. Skoleinventar (DK/NO) / 2.0 Tilsyns notat
Beskrivelse		Ansvarlig
HSO: installationer skal rykkes 200 mm til venstre		OPRETTET 03-08-20, 13:58:55
Seneste kommentar		ST Skoleinventar A/S Henrik Søndberg
		0

Fotos 1: 03-08-20, 13:58:55



Tegning: A-1-140-E0 - Etageplan E0.pdf-



Fotos 2:

Fotos 3:

Fotos 4:

Fotos 5:


Skærbæk ny skole - 149636



Gamle Kongevej 14
6880 Tarm
97 37 11 88
info@st-skoleinventar.dk

#2	Type: KS	Projektmappe: Skærbæk ny skole - 149636
Tidsfrist fra: 03-08-20 - Til: 03-08-20		Kategori/Liste: 01 ST. Skoleinventar (DK/NO) / 2.0 Tilsyns notat
Beskrivelse		Ansvarlig
HSO: installationer i vejen for oven		OPRETTET 03-08-20, 13:57:55
Seneste kommentar		ST Skoleinventar A/S Henrik Søndberg

Fotos 1: 03-08-20, 13:57:55

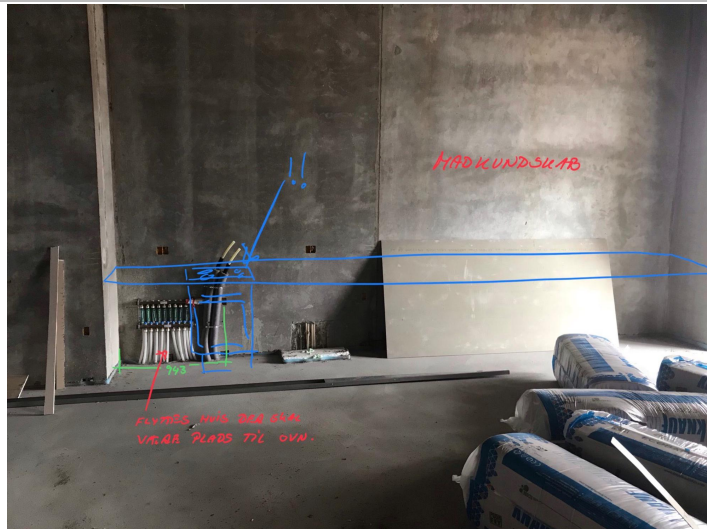

Tegning: A-1-140-E0 - Etageplan E0.pdf-



Fotos 2:

Fotos 3:

Fotos 4:

Fotos 5:


Skærbæk ny skole - 149636



Gamle Kongevej 14
6880 Tarm
97 37 11 88
info@st-skoleinventar.dk

#1	Type: KS	Projektmappe: Skærbæk ny skole - 149636
Tidsfrist fra: 03-08-20 - Til: 03-08-20		Kategori/Liste: 01 ST. Skoleinventar (DK/NO) / 2.0 Tilsyns notat
Beskrivelse		Ansvarlig
<p>HSD: bordpladen går ud i døråbningen. Skal dette ændres på en af følgende måder. Skal bordpladen afkortes og den første vaske slettes... eller flyttes døren?</p>		<p>OPRETTET 03-08-20, 13:56:08</p> <p>ST Skoleinventar A/S Henrik Søndberg</p>
Seneste kommentar		0

Fotos 1: 03-08-20, 13:55:07

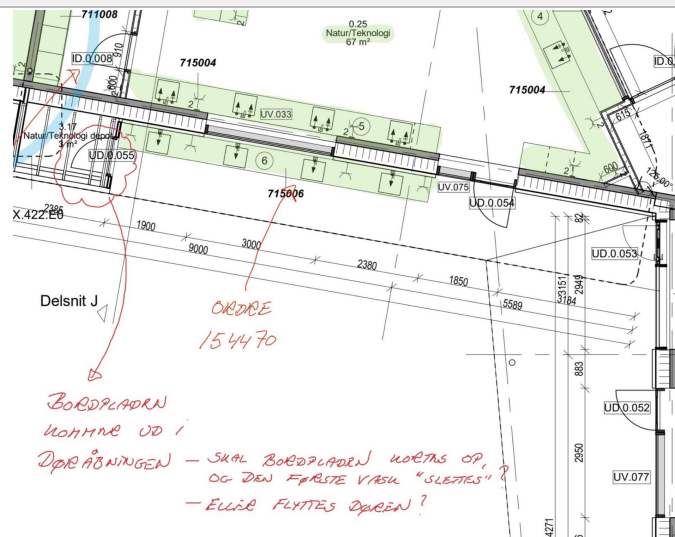

Tegning: A-1-140-E0 - Etageplan E0.pdf-



Fotos 2:

Fotos 3:

Fotos 4:

Fotos 5:

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]
Til: 'hv@friis-moltke.dk' [hv@friis-moltke.dk]; 'Morten Højer (moh@taekker.dk)' [moh@taekker.dk]
Cc: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Palle Kudsk [PKU@toender.dk]; 'Arne Borum Linnet' [al@fmbyggningsdrift.dk]; 'Kasper Bornstein Larsen' [kbl@taekker.dk]; 'Ingri B. Løvsbogen' [ibl@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 05-08-2020 09:38
Modtaget Dato: 05-08-2020 09:38
Vedrørende: SSK - Lysninger ved vinduer og fjernvarme/CTS
Vedhæftninger: image001_287.png
image002_289.png
image003_293.png
image004_293.png
image005_292.png
image006_210.jpg

Hej Henrik og Morten H.

@Henrik – Ved gårsdagens byggemøde meldte Henning ud, at han ikke har lysninger med til de resterende vinduer. Han siger det hverken fremgår af beskrivelsen eller tilbudslisten, at han skal have dem med. Arne har fundet lysninger på tegningerne dateret til 18', men jeg kan ikke finde det på hverken tilbudslisten eller arbejdsbeskrivelsen, udover at der henvises til tegningsmaterialet og basisbeskrivelser. Vil I granske om det er nævnt nogen steder af referater, rettelsesblade el. lign. – Ellers står bygherre givetvis igen med en væsentlig udgift.

@Morten H. – Der blev rejst et flag igen i går fra VVS angående fjernvarme i bygningen. De siger, at de ikke har mulighed for at sætte 'mere' varme på bygningen, da returløbet til netværket er alt for højt i forvejen. Derudover menes det, at der ikke er koordineret/beskrevet styring imellem CTS og fjernvarme og, at den dag bygning skal tages i brug kan systemet ikke indreguleres. Vil ifølge op på dette? Tag gerne fat i Jürgensen, men jeg har bedt dem fremsende igennem dalux, mail og ringe til Jer for et svar.

Vi er ligeledes uforstående for, hvorfor I ikke var ved byggemødet i går, der var flere væsentlig punkter, hvor I kunne være kommet med indput til, både på ventilation, Vvs og CTS. I havde i forvejen en mand der planlagde at deltage i et forudgående møde ang. CTS. Bravida og Jürgensen rykker for nyt møde hurtigst mulig.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk















RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5730715#0 - SV SSK - Lysninger ved vinduer og fjernvarmeCTS

Fra: Morten Høier [moh@taekker.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk];hv@friis-moltke.dk [hv@friis-moltke.dk]
Cc: Sune Bundesen [sb32@toender.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];'Arne Borum Linnet' [al@fmbyggningsdrift.dk];Kasper Bornstein Larsen [kbl@taekker.dk];Ingri B. Løvsbogen [ibl@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 05-08-2020 10:07
Modtaget Dato: 05-08-2020 10:07
Vedrørende: SV: SSK - Lysninger ved vinduer og fjernvarme/CTS
Vedhæftninger: image001_9.gif
image002_6.gif
image003.gif
image010_32.png
image011_32.png
image012_28.png
image013_15.png
image014_14.png
image015_5.jpg

Hej Morten,

Det tager vi hånd om. Kasper B var syg i går og er pt hjemme, hvor han afventer svar fra en coronatest før han kan komme tilbage. Det var meningen han skulle deltage ved byggemødet efter mødet med CTS. Hvis punkterne bare fremgår af byggemødereferatet skal vi nok besvare dem. Jeg ved Kasper og Jürgensen havde snakken omkring fjernvarme til sidste møde.

Ellers opfordrer jeg til at entreprenørerne ligger deres spørgsmål op på Dalux fremfor at samle dem til byggemødet, så det ikke kun er hver 2. uge at tingen bliver lagt frem. Dette fremgår også af de tidligere referater, at det er igennem dalux den primære kommunikation skal foregå.

De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M +45 4171 1319
T +45 8619 1844

www.taekker.dk



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 5. august 2020 09:38

Til: hv@friis-moltke.dk; Morten Høier <moh@taekker.dk>

Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; 'Arne Borum Linnet' <al@fmbyggningsdrift.dk>; Kasper Bornstein Larsen <kbl@taekker.dk>; Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>

Emne: SSK - Lysninger ved vinduer og fjernvarme/CTS

Hej Henrik og Morten H.

@Henrik – Ved gårsdagens byggemøde meldte Henning ud, at han ikke har lysninger med til de resterende vinduer. Han siger det hverken fremgår af beskrivelsen eller tilbudslisten, at han skal have dem med. Arne har fundet lysninger på tegningerne dateret til 18', men jeg kan ikke finde det på hverken tilbudslisten eller arbejdsbeskrivelsen, udover at der henvises til tegningsmaterialet og basisbeskrivelser. Vil I granske om det er nævnt nogen steder af referater, rettelserblade el. lign. – Ellers står bygherre givetvis igen med en væsentlig udgift.

@Morten H. – Der blev rejst et flag igen i går fra VVS angående fjernvarme i bygningen. De siger, at de ikke har mulighed for at sætte 'mere' varme på bygningen, da returløbet til netværket er alt for højt i forvejen. Derudover menes det, at der ikke er koordineret/beskrevet styring imellem CTS og fjernvarme og, at den dag bygning skal tages i brug kan systemet ikke indreguleres. Vil I følge op på dette? Tag gerne fat i Jürgensen, men jeg har bedt dem fremsende igennem dalux, mail og ringe til Jer for et svar.

Vi er ligeledes uforstående for, hvorfor I ikke var ved byggemødet i går, der var flere væsentlig punkter, hvor I kunne være kommet med input til, både på ventilation, Vvs og CTS. I havde i forvejen en mand der planlagde at deltage i et forudgående møde ang. CTS. Bravida og Jürgensen rykker for nyt møde hurtigst mulig.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent

Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk





















RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5730695#0 - SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Fra: Ingri B. Løvskogen [ibl@friis-moltke.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; 'Lars Høi' [lh@garant.nu]; Arne Borum Linnet [al@fmbyggningsdrift.dk]
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 05-08-2020 11:56
Modtaget Dato: 05-08-2020 11:56
Vedrørende: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020
Vedhæftninger: 20200629 Oplæg gulve.pdf
A-X-170-E0 - Gulvbelægningsplan E0.pdf
A-X-171-E1 - Gulvbelægningsplan E1.pdf
image009_22.jpg
image010_29.png
image011_29.png
image012_25.png
image013_12.png
image014_11.png
image015_2.jpg
image016.gif
image017_0.png

Hej Morten/Lars,

Gulvplaner er opdateret, og bliver lagt på Dalux. De er også vedhæftet i denne mail sammen med Oplæg gulve.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvskogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ibl@friis-moltke.dk



 **Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail**
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!

Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Sendt: 3. august 2020 09:28
Til: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; 'Lars Høi' <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

Vi har rettet gulvene i det tidligere fremsendte til bygherre og Gulvlægger for at få en pris.
Vi mener godt at der kan gives en pris ud fra det vedhæftede.

Vi ville vendte med at bruge timer på at rette gulvplaner indtil der var en aftalt pris.

Vi retter gulvplanerne nu. 😊

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Sendt: 14. juli 2020 09:00
Til: 'Lars Høi' <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Det kan jeg godt se. Den jeg refererede til var også kun et oplæg.
@Henrik vil i få opdateret planerne når i er tilbage på kontoret?

5097

Jeg får arrangeret et møde i slut uge 33.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Lars Høi [<mailto:lh@garant.nu>]

Sendt: 14. juli 2020 08:53

Til: Morten Bramstrup Jakobsen; Arne Borum Linnet

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; hv@friis-moltke.dk

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

De gulvplaner, der er på Dalux er ikke opdateret med farvenumre på linoleum. Der står stadig "gummi eller linoleum". Dem jeg kan finde er uploadet i marts måned, så de er ikke opdateret.

Jeg har brug for at tegningerne viser de rigtige dessinumre, ellers er det dømt til at gå galt.

Jeg går på ferie fra næste uge. Vi kan tage et møde slut uge 33/start uge 34, hvis det kan passe jer.

Med venlig hilsen

Lars Høi

Garant

FOR GULVE OG GARDINER

Høi Tæpper A/S, Rødekrø

Tlf. 74 66 21 24

Mobil 20 27 38 10



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 14. juli 2020 08:41

Til: Lars Høi <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; hv@friis-moltke.dk

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Tak for din mail

Den opdateret plan skulle meget gerne være tilgængelig på Dalux.

Angående aftalesedlen mangler jeg stadig en opgørelse for de reelle "ekstra m²". – Jeg vil foreslå et dialogmøde, hvor vi gennemgår hvorfor I, og Friis og Moltke kommer frem til to forskellige mængder. Jeg skal selvfølgelig gerne underskrive den når parterne er enig.

Er det en acceptabel løsning for Jer?

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Lars Høi [<mailto:lh@garant.nu>]

Sendt: 14. juli 2020 08:37

Til: Morten Bramstrup Jakobsen; Arne Borum Linnet

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; hv@friis-moltke.dk

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

Jeg mangler stadig en opdateret gulvplan samt en aftaleseddel, så jeg kan få bestilt materialerne.
Arne: Hvordan ser tidsplanen ud for os?

Med venlig hilsen

Lars Høi



Høi Tæpper A/S, Rødebro

Tlf. 74 66 21 24

Mobil 20 27 38 10



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 25. juni 2020 11:03

Til: Lars Høi <lh@garant.nu>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; hv@friis-moltke.dk

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Tak for det hurtige svar. Så tager vi den blå farve i delområderne. – Jeg tror Friis og Moltke er på sagen og får planen opdateret.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent

Ejendomme

Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Lars Høi [<mailto:lh@garant.nu>]

Sendt: 25. juni 2020 11:01

Til: Morten Bramstrup Jakobsen

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

5099

Der er ikke noget økonomi i at ændre farven.

Jeg vil meget gerne have en opdateret gulvplan hurtigst muligt (inden for en uge), så jeg kan få reserveret de forskellige mængder.

De prøver i har, må i gerne ligge i skurvognen på byggepladsen, så tager jeg dem med, når jeg engang skal til byggemøde.

Med venlig hilsen

Lars Høi

Garant

FOR GULVE OG GARDINER

Høi Tæpper A/S, Rødekrø

Tlf. 74 66 21 24

Mobil 20 27 38 10



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 25. juni 2020 10:44

Til: Lars Høi <lh@garant.nu>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Emne: VS: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Lige et par ting ift. skolen i Skærbæk. Som du kan se af nedenstående korrespondance.

Skolen ønsker gerne at dele af gulvet, hvor det var tiltænkt blå bliver lavet med Linoflex Forbo 809, lys blå i stedet for den grønne. Er det muligt at få med og er der evt. merøkonomi forbundet med det?

Jeg får selvfølgelig Friis og Moltke til at opdatere, deres farveplan til dig. – Ellers ønskes de tre farver du har fremsendt.

Angående farveprøver samt katalog, skal jeg sende dem retur til dig?

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent

Ejendomme

Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Klaus Fog

Sendt: 25. juni 2020 08:26

Til: Thomas Ushus

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; Sune Bundesen

Emne: Gulve

Hej Thomas (cc Kim og Sune)

Vi har kigget en gang mere på gulvfarver efter, at det er blevet ændret til linoleum og alle væggene er blevet ændret til hvid farve. Vi kigger på at ændre gulvet i indskoling på begge etager til Linofleks Forbo 809 (lyseblå farve). Vores indskoling hedder "Vadehavet" og mange af udsmykningerne vil nok være i den genre. Derfor passer det bedst med et blått gulv. De øvrige gulve fastholder vi. Har du nogle faglige kommentarer til det?

Venlig hilsen

Klaus Fog

Distriktsskoleleder

Skærbæk Distriktsskole

Børn & Skole

Tønder Kommune

Skolegade 19 - 6780 Skærbæk

Tlf. +45 74 92 82 81 - E-mail kfo3@toender.dk



<Logo>

 FRIIS & MOLTKE
ARCHITECTS



SKÆRBÆK SKOLE
OPLÆG TIL GULVE OG FARVER
31.01.2020 REV. C - 29.06.2020

LINOLEUM:

FORBO LINO FLEX



BRUN 208



GRÅ 617



GRØN 407




LYS BLÅ 809


Læringsrum, fællesrum, finværksteder,
garderober, toiletter, personalerum

VINYLGULV:

FORBO SURESTEP ORIGINAL



171262 UMBER



171922 CONCRETE

Vådrom - brusenicher og rengøringsrum

TRÆGULV:

HØJKANTSPARKET, EG




EG, NATUR

Administration, grovværksted

LAMELMÅTTER:

SOM EGE LAMELMÅTTER



TEKSTIL/ALU/GUMMI

Vindfang og garderobe indskoling

BETONGULV:

STØVBUNDET BETON



NATUR

Teknikrum, varmt depot/rengøring











Gulvbælgingsplan E00
1 : 200

GULVTYPER SIGNATUR:
(udbydes i Materiale- og Farveskemaet, samt beskrivelsen)
Signaturfarven indikerer ikke den reelle gulvfarve

--- Synlig dilatationsfuge

333001 Smudsmåtte

334001 Flydebeton

332001 Trægulv

433001 Linoleum Linoleumsgulve anvendes

433002 Vinyl

441001 Støvbundet beton

331001
335002

339001 Betonfliser Type 1

339002 Betonfliser Type 2


100 - BD beskrivelse - Floors	
Type Mark	Konstruktionsbeskrivelse
331001	270 mm Betondæk
331003	Opbygget gulv, tagterrasser: 22x142 mm terrassebrædder 20mm Aluminiumstrøer Terrassefodder
332001	Opbygget gulv, tagterrasser: 22x142 mm terrassebrædder, Brandimpregneret 45x216 mm strøer, Brandimpregneret 21mm Krydsfiner på trælester med lagsp mellem spær, Brandimpregneret
333001	Svømmende trægulv 15 mm: 15 mm trægulvflude
333001	Måtterammer, 10 mm: 10 mm lamelrumsmåtte
333002	50 mm Gitterst 1 skævt 30x90mm
333005	20 mm Galvaniseret Gitterst 30x90mm
339001	Øvrig dækkomplætering, 50 mm: 50 mm Betonfliser 300x300mm Sand til LARIK
339002	Øvrig dækkomplætering, 100 mm (MU): 100 mm betonfliser 300x900mm
433001	Beklædninger, Linoleum 2 mm Linoleum
433002	Beklædninger, Vinyl 2 mm Vinyl 3 mm Lim
441001	Målerbehandlet 1 mm: 1 mm Støvbundet beton

A.X.170.E0
G

Rev.:G Revision iht. skyer Rev. Dato: 05.08.2020

	Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C www.taekker.dk	TLF 86 19 18 44
	Mindegade 13, DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk	TLF 86 20 32 00
	Aboulevarden 1, DK 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk	TLF 72 10 00 52

SAG NR: 17-041 **Skærbæk skole**
UDARB. AF: FM
KONTROL: FM
GODK. AF: FM
Gulvbælgingsplan E00
Dato: 2019.05.02 MÅL: As indicated **A.X.170.E0 G**

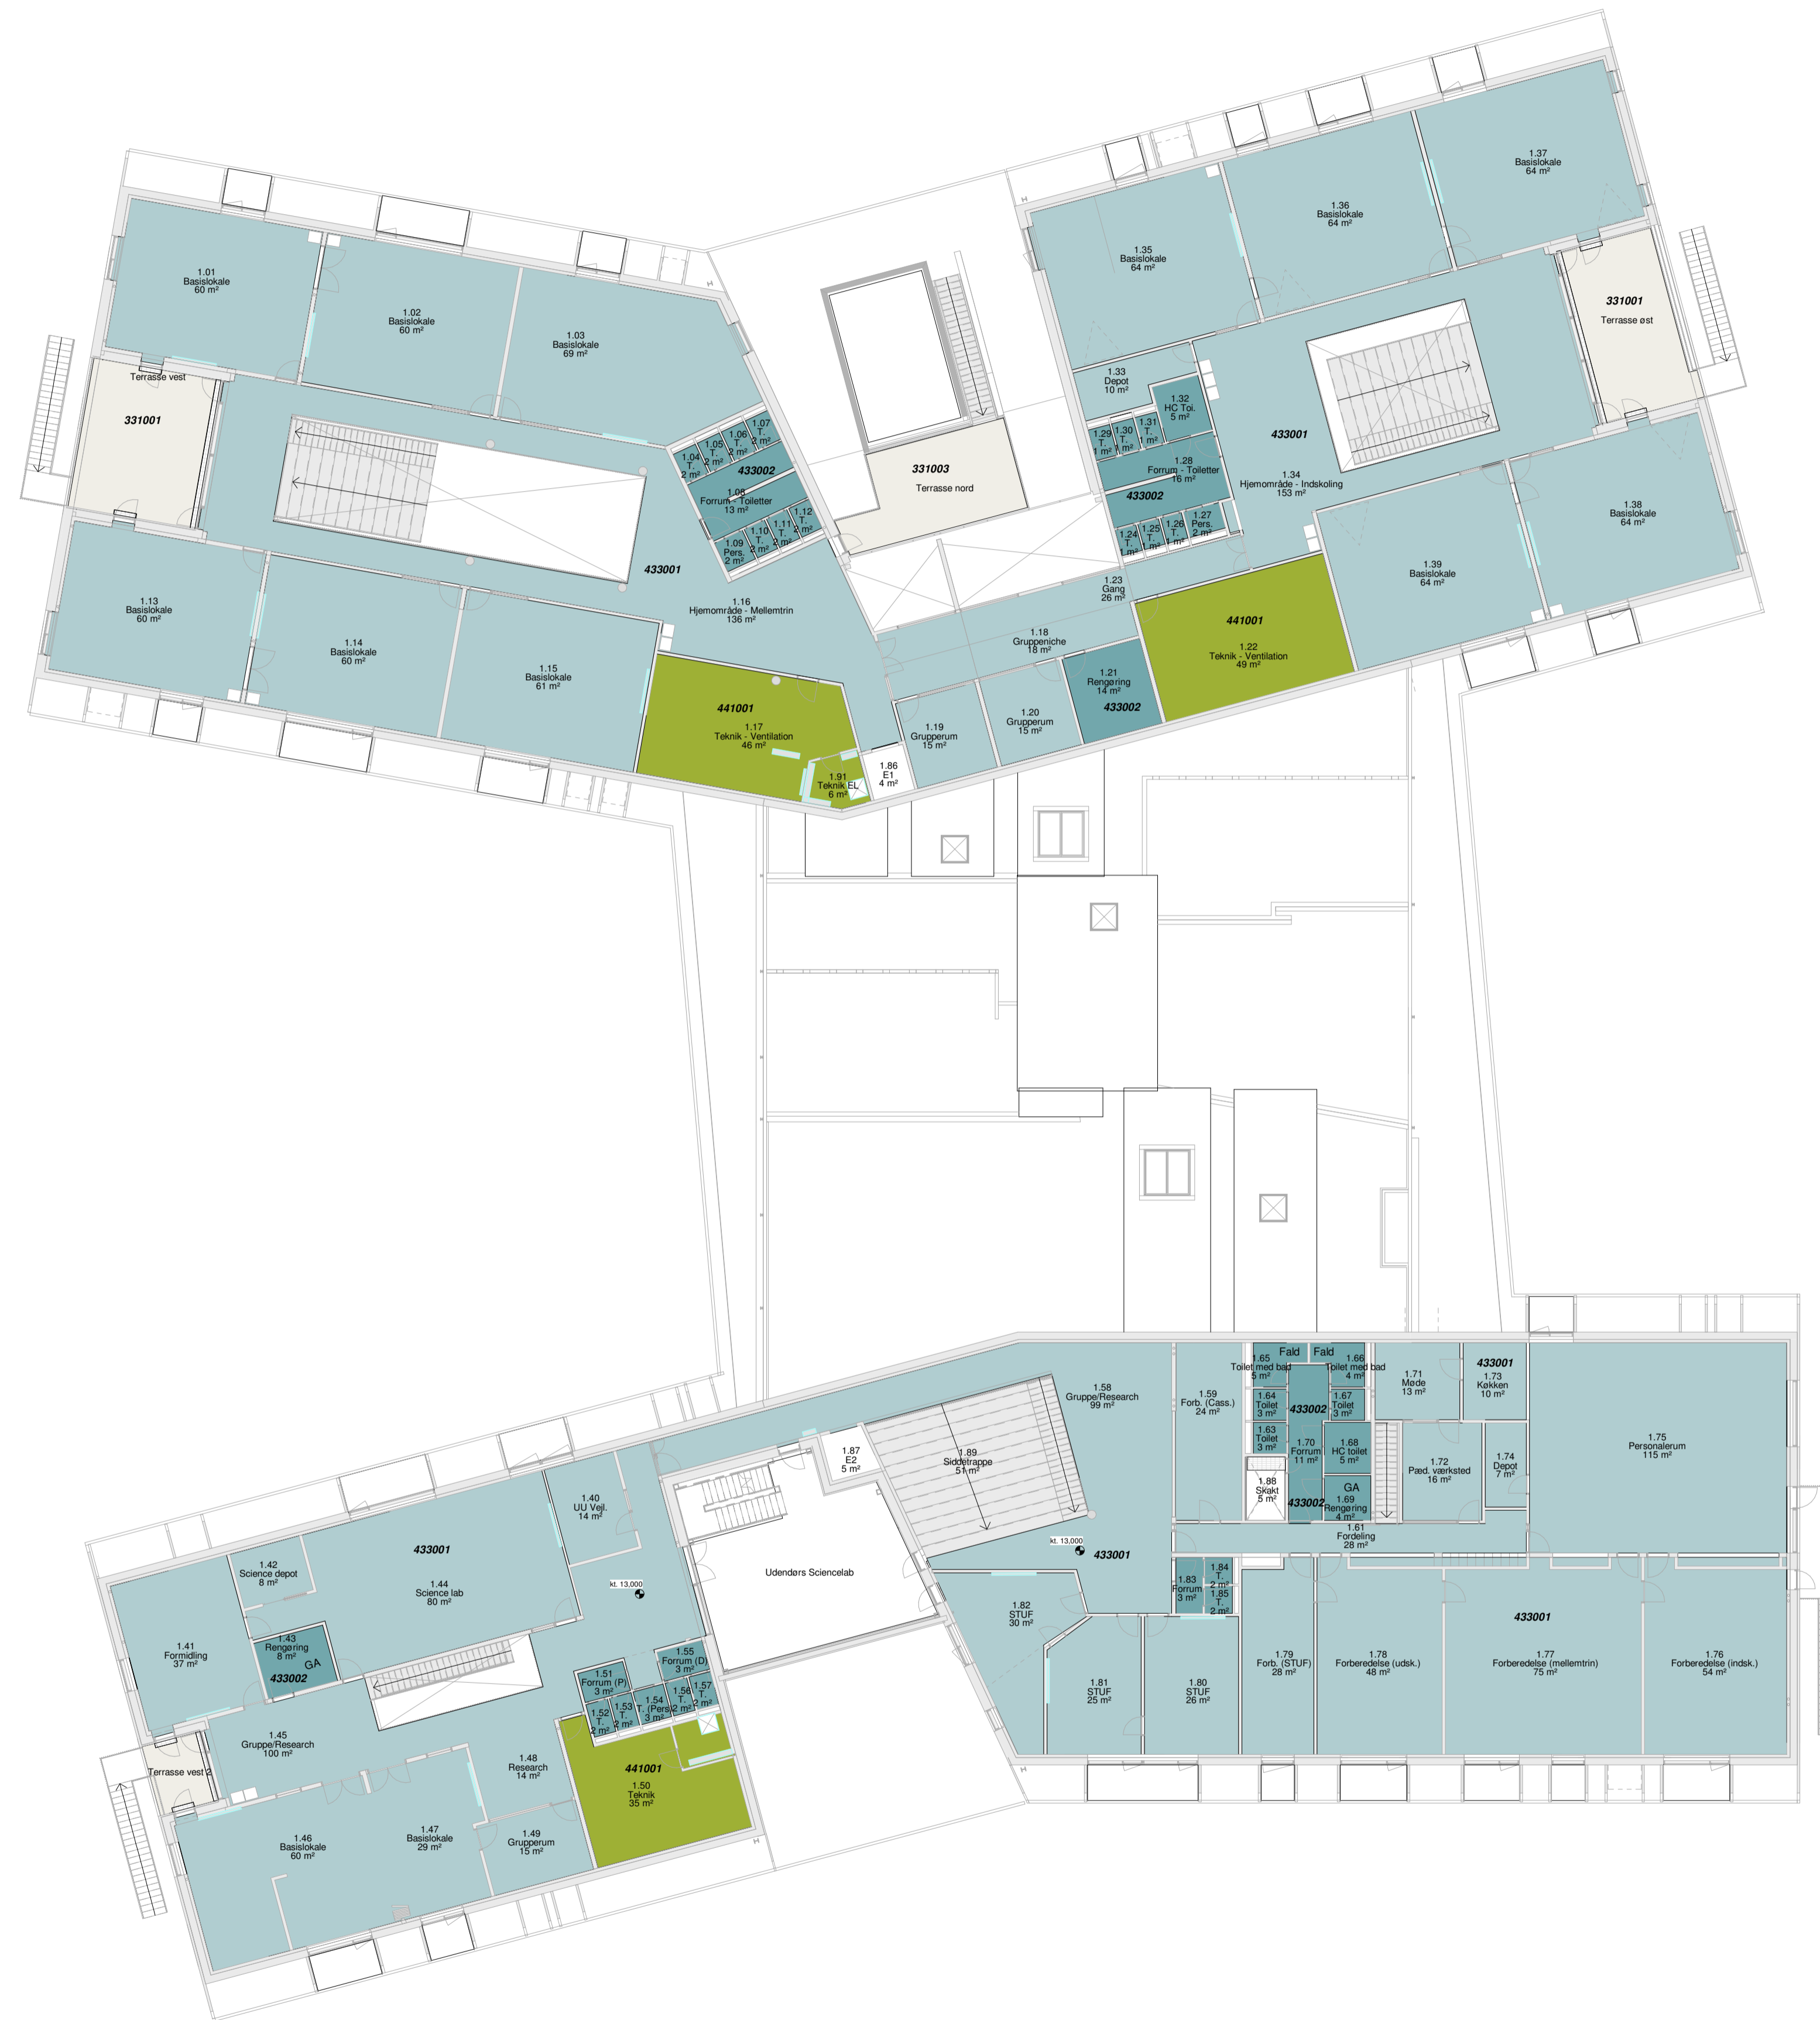

Gulvbelægningsplan E01
1 : 200




GULVTYPER SIGNATUR:
(udfyldes i Materiale- og Farveskemaet, samt beskrivelsen)
Signaturfarven indikerer ikke den reelle gulvfarve

-  Synlig dilationsfuge
-  333001 Smudsmatte
-  334001 Flydebeton
-  332001 Trægulv
-  433001 Linoleum Linoleumgulve anvendes
-  433002 Vinyl
-  441001 Støbundet beton
-  331001
335002
-  339001 Betonfliser Type 1
-  339002 Betonfliser Type 2

A.X.171.E1
C

100 - BD-beskrivelse - Floors	
Type Mark	Konstruktionsbeskrivelse
	270 mm Betondæk
331001	Ophængt gulv, tagterrasser: 22x142 mm terrassebrædder 20mm Aluminiumstrøer Terrassefodder
331003	Ophængt gulv, tagterrasser: 22x142 mm terrassebrædder, Brandimprægneret 45x216 mm strøer, Brandimprægneret 21mm Krydsliner på træler med tagpap mellem soaer, Brandimprægneret
332001	Svømmende trægulv 15 mm: 15 mm trægulv(buldmet)
333001	Målerammer, 10 mm: 10 mm lamel-smudsmatte
333002	50 mm Gitterrist i skakt 30x90mm
333005	20 mm Galvaniseret Gitterrist 30x90mm
339001	Øvrig dækkplætning, 50 mm: 50 mm Betonfliser 300x300mm Sand iht. LARK
339002	Øvrig dækkplætning, 100 mm (MU): 100 mm betonfliser 300x900mm
433001	Beklædninger, Linoleum 2 mm Linoleum 3 mm Lim
433002	Beklædninger, Vinyl 2 mm Vinyl 3 mm Lim
441001	Malerbehandlet 1 mm: 1 mm Støbundet beton

Rev.:C Revision iht. skyer Rev. Dato: 28.03.2020

	Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. dk. MF 8000 Aarhus C www.taekker.dk	TLF 86 19 18 44
	Mindegade 13, DK 8000 Aarhus C www.mgarkitekter.dk	TLF 86 20 32 00
	Aboulevarden 1, DK 8000 Aarhus C www.friis-moltke.dk	TLF 72 10 00 52

SAG NR: 17-041 **Skærbæk skole**
 UDARB. AF: FM
 KONTROL: FM
 GODK. AF: FM
 Gulvbelægningsplan E1
 Udførsel DATO: 2019.05.02 MÅL: As indicated A.X.171.E1 C















RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

Garant
FOR GULVE OG GARDINER



5730713#0 - SV:SSK - Lysninger ved vinduer og fjernvarme/CTS

Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Morten Højer (moh@taekker.dk) [moh@taekker.dk]
Cc: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Palle Kudsk [PKU@toender.dk]; 'Arne Borum Linnet' [al@fmbyggningsdrift.dk]; 'Kasper Bornstein Larsen' [kbl@taekker.dk]; Ingri B. Løvskogen [ibl@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 05-08-2020 12:01
Modtaget Dato: 05-08-2020 12:01
Vedrørende: SV: SSK - Lysninger ved vinduer og fjernvarme/CTS
Vedhæftninger: 3.0_Tømrerentreprisen_Tilbudsliste KRAFTMAN AS.pdf
image001_363.png
image002_376.png
image003_381.png
image004_381.png
image005_381.png
image006_271.jpg

Hej Morten

Jeg kan også kun finde lysninger på tegningsmaterialet og ikke i beskrivelsen eller på tilbudslisten.
Jeg tror ikke juridisk at det holder når lysningerne ikke er med i beskrivelserne + tilbudslisten.
Henning har det med da jeg flere gange er blevet spurgt til udførsel af lysninger.

Jeg vil foreslå at i laver det som en bygherre leverance og får en anden tømrer til at udføre lysningerne da de ellers bliver alt for dyrt ved Kraftman.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 5. august 2020 09:38

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Højer (moh@taekker.dk) <moh@taekker.dk>

Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; 'Arne Borum Linnet' <al@fmbyggningsdrift.dk>; 'Kasper Bornstein Larsen' <kbl@taekker.dk>; Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>

Emne: SSK - Lysninger ved vinduer og fjernvarme/CTS

Hej Henrik og Morten H.

@Henrik – Ved gårdsdagens byggemøde meldte Henning ud, at han ikke har lysninger med til de resterende vinduer. Han siger det hverken fremgår af beskrivelsen eller tilbudslisten, at han skal have dem med. Arne har fundet lysninger på tegningerne dateret til 18', men jeg kan ikke finde det på hverken tilbudslisten eller arbejdsbeskrivelsen, udover at der henvises til tegningsmaterialet og basisbeskrivelser. Vil I granske om det er nævnt nogen steder af referater, rettelserblade el. lign. – Ellers står bygherre givetvis igen med en væsentlig udgift.

@Morten H. – Der blev rejst et flag igen i går fra VVS angående fjernvarme i bygningen. De siger, at de ikke har mulighed for at sætte 'mere' varme på bygningen, da returløbet til netværket er alt for højt i forvejen. Derudover menes det, at der ikke er koordineret/beskrevet styring imellem CTS og fjernvarme og, at den dag bygning skal tages i brug kan systemet ikke indreguleres. Vil ifølge op på dette? Tag gerne fat i Jürgensen, men jeg har bedt dem fremsende igennem dalux, mail og ringe til Jer for et svar.

Vi er ligeledes uforstående for, hvorfor I ikke var ved byggemødet i går, der var flere væsentlig punkter, hvor I kunne være kommet med input til, både på ventilation, Vvs og CTS. I havde i forvejen en mand der planlagde at deltage i et forudgående møde ang. CTS. Bravida og Jürgensen rykker for nyt møde hurtigst mulig.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



TILBUDSLISTE

Undertegnede tilbyder at udføre tømrerentreprisen i fast tid og - pris, i henhold til udbudsbrevet, denne tilbudsliste, tidsplanen, beskrivelser og tegninger, med efterfølgende rettelser, for en samlet tilbudssum af:

Kr. ekskl. moms.:	25.226.611
Skriver kr.:	to-fem-to-to-seks-seks-et-et
Moms, kr.:	6.306.653
Tilbudssum, inkl. moms, kr.:	<u>31.533.264</u>

Følgende rettelsesblade er modtaget:

1 til **7**

Bemærkninger og eventuelle forbehold:

Dato: 14.01.2019



T. 7462 2060 · F. 7462 2080
Tilbudsgiverens underskrift og stempel
www.kraftman.dk

Tilbudsgiverens CVR/SE-nummer: 30198158
Tilbudsgiverens bankforbindelse: Skjerbank - tryk kaution
Tilbudsgiverens kontaktperson: Henning Skriver
Kontaktpersonens e-mailadresse: hs@kraftman.dk
Kontaktpersonens telefonnummer: 40152116

SAMLESIDE

1 Tømrerarbejde	(overført fra afsnit B), kr. ekskl. moms.:	16.471.018
2 Lukningsarbejde	(overført fra afsnit B), kr. ekskl. moms.:	4.000.719
3 Indvendigt snedkerarbejde	(overført fra afsnit B), kr. ekskl. moms.:	4.289.474
4 Stipulerede ydelser	(overført fra afsnit B), kr. ekskl. moms.:	465.400
TØMRERENTREPRISEN, I ALT	(overføres til forsiden), kr. ekskl. moms.:	<u>25.226.611</u>

NOTER TIL TILBUDSLISTERNE

Tilbudslisten omfatter tre afsnit:

- afsnit A: forsiden, samlesiden og denne side med noter.
- afsnit B: prisspecifikation.
- afsnit C: materiale- og konstruktionsspecifikation

Alle poster i tilbudslisten skal udfyldes.

Alle ydelser omfatter levering og montering, samt alle nødvendige hjælpeydelser, myndighedsansøgninger og -tilladelser, administration, gebyrer, o.s.v., medmindre andet udtrykkeligt er nævnt.

Hvor der er tale om sammensatte eller ikke-kvantificerbare ydelser, anvendes enheden "komplet", mængden sættes til 1, og enhedsprisen er den samlede pris for ydelsen.

Hvor der er fortrykt en værdi i kolonnen "Mængde", skal entreprenøren anvende den fortrykte mængde. Hvor der ikke er fortrykt mængder, og hvor mængden er angivet som "komplet", opmåler og beregner den bydende selv mængden.

De stipulerede ydelser indregnes i det samlede tilbud, men ikke i kontraktsummen.

De mængder, der er opgivet under stipulerede ydelser, er ud over det, der allerede måtte befinde sig i projektet.

De stipulerede ydelser supplerer - , men erstatter ikke bygningsdele og mængder, der indgår i tegningerne og beskrivelserne.

Enhedspriserne, der opgives for de stipulerede ydelser, anvendes i forbindelse med regulering for tilkøb og fravalg og for mer- eller mindreydelser.

I afsnit C, materiale- og komponentspecifikationen, skal de bydende udfylde de fortrykte linjer. Det står de bydende frit for at specificere yderligere materialer og konstruktioner.

Oplysningerne i afsnit C betragtes ikke som konkurrenceparametre, og vil ikke blive lagt til grund for bedømmelsen af tilbuddene.

Specifikationen skal tilgodese beskrivelsernes krav og intensioner, og der skal oplyses konkrete produktnavne som udtryk for den standard som leveres og monteres.

De bydende kan efter eget valg benytte den trykte tilbudsliste eller den digitale tilbudsliste i xls-format. Såfremt den digitale xls-fil benyttes, er den bydende ansvarlig for, at formler og referencer (links) fungerer efter hensigten. Udbyderen og rådgiverne påtager sig intet ansvar for tilbudslisternes matematiske funktionalitet.

BD-nummer	Emne	Specifikation	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum
1 Tømrerarbejde						
210000	Fuger: Gipspladevægge/facadeelementer	Jf. tegninger og beskrivelse	lb.m.	200	60	11.919
210001	Indvendige fuger langs vægge, søjler og facade	Jf. tegninger og beskrivelse	lb.m.	612	53	32.150
214001	1-Sidet skelletkonstrueret trævæg 110 mm	Skeletkonstrueret væg, 110 mm:95 mm skeletkonstruktion15mm Kalcium Silikatplade	m ²	615	392	241.127
217001	Isoleringsvægssystem 330mm	Isoleringsvægssystem 330mm:30mm hatprofil300mm Isoleringsvægssystem	m ²	2.514	726	1.825.017
217003	Isoleringsvægssystem 170mm	Isoleringsvægssystem 170mm:30mm hatprofil140mm Isoleringsvægssystem	m ²	114	774	88.185
217005	Isoleringsvægssystem 330mm	Isoleringsvægssystem 330mm:30mm hatprofil300mm Isoleringsvægssystem, forstærket til direkte montering af beklædningsstegl på lægter og afstandslister 70kg pr. m ²	m ²	495	740	366.546
217006	Isoleringsvægssystem 200 mm	200 mm isoleringsvægssystem på stålkonstruktion ved sciencetårn.	m ²	193	777	150.002
224001	1-Sidet skelletkonstrueret væg 100 mm	Skeletkonstrueret væg, 100 mm:75 mm skeletkonstruktion2 x 12,5mm gipsplade	m ²	222	536	118.970
224002	1-Sidet skelletkonstrueret væg 125 mm	Skeletkonstrueret væg 125 mm:100 mm skelletkonstruktion2 x 12,5 mm gipsplade	m ²	23	581	13.354
224003	1-Sidet skelletkonstrueret væg 100 mm	Skeletkonstrueret væg, 100mm:75 mm skeletkonstruktion m. 45mm fastholdt isolering2 x 12,5 mm gipsplade	m ²	92	565	51.971

BD-nummer	Emne	Specifikation	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum
224004	2-sidet skelletkonstrueret væg 100 mm	Skelletkonstrueret væg 100 mm:15mm fibergipsplade70mm skeletkonstruktion15mm fibergipsplade	m ²	379	634	240.166
224005	2-Sidet skelletkonstrueret væg 150 mm	Skeletkonstrueret væg, 150 mm:2 x 12,5 mm gipsplade100 mm skelletkonstruktion m. isolering2 x 12,5 mm gipsplade	m ²	2.357	588	1.386.258
224006	2-Sidet skelletkonstrueret væg 200 mm	200 mm 2-sidet gipsvæg	m ²	54	590	31.872
224007	1-Sidet skelletkonstrueret væg 70	Skeletkonstrueret væg, 70 mm:45 mm skeletkonstruktion2 x 12,5mm gipsplade	m ²	7	354	2.481
224008	2-Sidet skelletkonstrueret væg, vådrum 150 mm	Skeletkonstrueret væg, vådrum 150 mm:2 x 12,5 mm gipsplade100 mm skelletkonstruktion m. isolering2 x 12,5 mm vådrumsgips	m ²	5	654	3.271
27100X	271001 - 271016, Spær	Spær i henhold til tegning nr. K-X-401 A	stk.	732	1.184	866.322
273003	18 mm krydsfiner	18mm krydsfiner	m ²	157	151	23.688
276001	Udvendig solafskærmning	Jf. tegninger og beskrivelse	stk.	2	11.694	23.388
276002	Hældende beklædningstegl 100mm	Kold konstruktion med beklædningstegl 48mm Beklædningstegl38mm Taglægter25mm Afstandslistes15mm Kalcium Silikatplade	m ²	1.126	1.639	1.845.378
317001	Lodret afskærmning Beklædningstegl 126 mm	Kold konstruktion med beklædningstegl 48 mm Beklædningstegl38 mm forskalling25 mm afstandslister15 mm Kalcium Silikatplade, inkl. bagvedliggende	m ²	557	1.436	800.000
317002	Lodret afskærmning Beklædningstegl på ydervæg 111 mm	Kold konstruktion med beklædningstegl 48 mm Beklædningstegl38 mm forskalling25 mm afstandslister	m ²	556	1.259	700.000

BD-nummer	Emne	Specifikation	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum
317004	Afskærmning Træbeklædning på ydervæg 72mm	Træbeklædning, 72 mm:22 mm Bræddebeklædning25 mm Afstandslistes25 mm Afstandslistes	m ²	537	417	223.931
317005	Afskærmning aluplade	4 mm Sandwichplade med 0,5mm aluminium25mm Hatprofil	m ²	189	836	158.000
317006	Afskærmning vandfast krydsfiner	Afskærmning udv.18mm Vandfast krydsfiner	m ²	33	173	5.701
317007	Afskærmning Massiv træ 100 mm	Afskærmning udv.100 mm Massivt træelement	m ²	37	1.616	59.782
317009	Afskærmning Brandimprægneret Træbeklædning på ydervæg 72mm	Træbeklædning, 72 mm:22 mm Brandimprægneret Bræddebeklædning25 mm Brandimprægneret Afstandslistes25 mm Brandimprægneret Afstandslistes	m ²	1.060	377	400.000
322066	Inspektionslemme	700x600 mm	stk.	1	2.406	2.406
322067	Inspektionslemme	1.200x600 mm	stk.	2	2.720	5.440
327001	Foldevægge 52 dB	Foldevæg 52 dB, loftmonteret, limet sandwichkonstruktion	m ²	110	3.527	388.000
328001	Træbeklædning trælameller 27 x 72 mm	Jf. tegninger og beskrivelse	m ²	48	967	46.392
328002	Afskærmning træfineérplade 12 mm	Jf. tegninger og beskrivelse	m ²	1.158	922	1.068.000
328003	Væg, Træfineérplade og isolering	Jf. tegninger og beskrivelse	m ²	145	1.021	148.000
329002	Akutiskplader til vægge 40 mm	Jf. tegninger og beskrivelse	m ²	94	638	60.000
331001	Opbyggede gulve terrassebrædder	Opbygget gulv, tagterrasser: 22x142 mm terrassebrædder 20mm Aluminiumsstrøer Terrassefodder	m ²	41	1.406	57.660
331002	Opbyggede gulve terrassebrædder 2	Opbygget gulv, tagterrasser: 22x142 mm terrassebrædder 36x73 mm regler Terrassefodder	m ²	38	913	34.695

BD-nummer	Emne	Specifikation	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum
331003	Opbyggede gulve terrassebrædder 3	Opbygget gulv, tagterrasser: 22x142 mm terrassebrædder 45x216 mm strøer Brandimprægneret 21 mm krydsfiner på trælister med tagpap mellem spær. Brandimprægneret.	m ²	31	916	28.410
332001	Svømmende Trægulv 15 mm	Svømmende trægulv 15 mm: 15 mm trægulv(fuldlimet)	m ²	412	667	275.007
335002	Opbyggede belægninger træterrasse 150mm	Opbyggede belægninger, Skibsdæk: Terrassebrædder med gummifuger monteret på Strøer	m ²	29	1.077	31.222
335001	300 mm tagisolering ved terrasser	450 mm udvendig belægning: 20 mm træbelægning 130 mm opbygning 300 trykfast isolering	m ²	91	708	64.427
351001	Nedhængt systemloft hygiejne synligt skinnesystem 600 x600 mm	Nedhængt systemloft:Synligt skinnesystem Gips 600 x 600 mm hygiejne	m ²	103	525	54.126
351002	Nedhængt systemloft synligt skinnesystem 600 x 600 mm	Nedhængt systemloft:Synligt skinnesystemGips 600 x 600 mm	m ²	236	478	112.741
351003	Nedhængt systemloft 600x1200 mm stående halvforbandt	Nedhængt systemloft:25 mm træbeton 600 x 1200 mm skjulte skinner	m ²	8	704	5.632
353001	Påbygget systemloft 600x1200 mm stående halvforbandt	Jf. tegninger og beskrivelsee	m ²	338	495	167.460
353002	Påbyggede systemloft 600x1200 mm	Fastmonteret systemloft:22 mm forskalling25 mm træbeton 600 x 1200 mm skjulte skinner	m ²	146	363	52.932
353003	Påbygget systemloft	Fastmonteret systemloft:22 mm forskalling25 mm gips	m ²	21	397	8.335
353004	Påbygget underbeklædning calcium silikat plade	Fastmonteret underbeklædning:15 mm Calciumsilikat plade	m ²	111	296	32.843

BD-nummer	Emne	Specifikation	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum
353101	Nedhængt ventilationsloft 600x1200 mm	Nedhængt ventilationsloft:25 mm fibercement 600 x 1200 mm skjulte skinnerAktive/passive plader	m ²	4.326	585	2.531.465
354001	Underbeklædning 21 x 145 mm	Fastmonteret, underbeklædning 21 x 145 mm43 mm Afstandslægter15 mm Calsium Cilikatplade	m ²	367	591	216.999
354002	Underbeklædning 21x145 mm	Fastmonteret, brandimprægnereret underbeklædning 21x145 mm monteret på undersiden af trækonstruktion.	m ²	30	672	20.153
355001	Loftskørt, gips 50 mm	Loftskørt, 50 mm:25 mm hatprofil25 mm Gipsplade	m ²	237	841	199.370
355002	Loftskørt, gips 125 mm	Loftskørt, 125 mm:25 mm Gipsplade100 mm Stålskellet	m ²	20	537	10.748
433003	Udv. aluplade på krydsfiner	Udv. aluplade beklædning i vindueslysning 4 mm Sandwichplade med 0,5mm aluminium 25 mm Hatteprofil Tagpap 18 mm Krydsfiner	m ²	127	1.355	172.129
433005	Krydsfinerplade 12 mm	Beklædning, monteret på samlingstrappe:15 mm krydsfinerplade	m ²	27	382	10.305
453001	Udv. aluplade underbeklædning	Udv. Aluplade underbeklædning ved vindueslysninger4 mm Sandwichplade med 0,5mm aluminium25mm Hatteprofil18mm Krydsfiner	m ²	61	1.317	80.330
714001	Mørklægningsgardiner	Jf. tegninger og beskrivelsee	m ²	41	2.054	85.000
715007	Udvendige bordplader	Bænke og borde i varierende længdemål jf. tegninger og beskrivelse	Komplet	1	36.845	36.845

BD-nummer	Emne	Specifikation	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum
990001	Stillads	Stillads til egne ydelser incl. Tømrer-, Luknings- og Indvendigt snedkerarbejde.	Komplet	1	252.460	252.460
990002	Øvrige tømrerarbejder (specificeres)			1	586.076	586.076
1 Tømrerarbejde sum:						16.471.018

2 Lukningsarbejde

312001	Vindue	Fast_Opluk. sideparti	stk.	15	3.073	46.100
312002	Vindue	Fast_Opluk. sideparti	stk.	2	4.393	8.786
312003	Vindue	Fast_Opluk. sideparti	stk.	4	2.502	10.008
312004	Vindue	Fast_Opluk. sideparti	stk.	4	2.142	8.567
312005	Vindue	Fast_Opluk. sideparti	stk.	5	4.384	21.921
312006	Vindue	Fast_Opluk. sideparti	stk.	3	5.266	15.797
312007	Vindue	Fast_Opluk. sideparti	stk.	3	3.455	10.366
312008	Vindue	Fast_Opluk. sideparti	stk.	1	5.903	5.903
312009	Vindue	Fast_Opluk. sideparti	stk.	2	7.926	15.851
312010	Vindue	Fast_Opluk. sideparti	stk.	3	3.034	9.101
312011	Vindue	Fast_Opluk. sideparti	stk.	3	9.569	28.706
312012	Vindue	Fast_Opluk. sideparti	stk.	2	19.654	39.307
312013	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	5	11.482	57.412
312014	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	1	8.850	8.850
312015	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	2	3.541	7.082
312016	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	2	6.822	13.643
312017	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	1	4.690	4.690
312018	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	1	3.939	3.939
312019	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	1	4.014	4.014
312020	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	2	2.610	5.220
312021	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	8	3.829	30.629
312022	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	1	4.019	4.019
312023	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	11	4.395	48.341

BD-nummer	Emne	Specifikation	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum
312024	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	2	5.419	10.838
312025	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	5	5.581	27.907
312026	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	3	8.108	24.324
312027	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	1	8.606	8.606
312028	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	2	8.650	17.299
312029	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	1	5.371	5.371
312030	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	3	7.775	23.324
312031	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	1	7.657	7.657
312032	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	1	19.646	19.646
312033	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	1	7.642	7.642
312034	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	1	6.284	6.284
312035	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	6	8.172	49.031
312036	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	2	11.233	22.465
312037	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	5	11.233	56.164
312038	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	10	2.288	22.875
312039	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	1	7.765	7.765
312040	Vindue	Opluk. side og overparti opluk	stk.	2	7.905	15.810
312041	Vindue	Opluk, Sidehængt Ud - 2000x2200mm	stk.	5	12.256	61.278
312042	Vindue	Opluk, Sidehængt Ud - 2000x2600mm	stk.	11	12.279	135.065
312043	Vinduesparti	Opluk, Sidehængt Ud - 2000x3000mm	stk.	4	13.294	53.175
312044	Vinduesparti	Opluk, Sidehængt Ud - 2500x2600mm	stk.	4	15.991	63.962
312045	Vinduesparti	Opluk, Sidehængt Ud - 3000x2100mm	stk.	1	12.297	12.297
312046	Vinduesparti	Opluk, Sidehængt Ud - 3000x2600mm	stk.	5	17.686	88.429
312047	Vinduesparti	Opluk, Sidehængt Ud - 3000x3000mm	stk.	1	19.930	19.930

BD-nummer	Emne	Specifikation	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum
312048	Vinduesparti	Opluk, Sidehængt Ud - 4000x2600mm	stk.	3	22.522	67.566
312049	Vinduesparti	Fast parti 2024x2200mm	stk.	1	7.978	7.978
312050	Partier	Opluk. Kip ind - 2000x3000 mm	stk.	3	13.558	40.675
313001	Udv. glasfacadesystem 300mm	300 mm	Komplet	95	3.023	287.154
313002	Udv. glasfacadesystem 300mm	250 mm	Komplet	141	2.829	398.828
372001	Ovenlysmoduler		stk.	6	35.418	212.510
372002	Ovenlys		stk.	4	14.838	59.351
372003	Ovenlys		stk.	2	15.744	31.487
372004	Ovenlysmoduler		stk.	2	46.360	92.720
372005	Ovenlysmoduler		stk.	5	59.490	297.449
372006	Ovenlysmoduler		stk.	3	79.185	237.554
372011	Elastiske fuger ved alle tilslutninger udvendigt og indvendigt	Jf. tegninger og beskrivelse	Lb.m.	2.852	60	171.134
311001	Udv. dør udadgående	D 18x22 EI2 60-C	stk.	1	18.357	18.357
311002	Udv. dør udadgående	D 20x22	stk.	1	11.578	11.578
311003	Udv. dør udadgående	DR 18x22	stk.	2	10.874	21.747
311004	Udv. dør udadgående	DR 20x22	stk.	1	11.578	11.578
311005	Udv. dør udadgående	E 10x22	stk.	6	6.280	37.680
311006	Udv. dør udadgående	ER 9x22	stk.	4	6.291	25.164
311007	Udv. dør udadgående	ER 9x22 EI2 60-C	stk.	1	9.953	9.953
311008	Udv. dør udadgående	ER 10x22	stk.	34	6.291	213.878
311009	Udv. dør udadgående	0 E 9x22 Trædør	stk.	13	6.848	89.019
311010	Udv. dør udadgående	0 E 9x22 Trædør EI2 30-C	stk.	1	9.945	9.945
311011	Udv. dør udadgående	D 18x22 Ståldør	stk.	1	18.805	18.805
311012	Udv. dør udadgående	D 18x22 Ståldør EI2 60-C	stk.	2	38.497	76.994
311013	Udv. dør udadgående	D 20x22 Ståldør	stk.	1	19.930	19.930
311014	Udv. dør udadgående	E 10x22 Ståldør	stk.	2	9.052	18.104
313001	Udv. glasrammedør	986x2121 enkelt, hærdet og lamineret	stk.	3	9.051	27.152
313002	Udv. glasrammedør dobbelt	1906x2121 hærdet og lamineret, glasfacadesystem	stk.	2	15.981	31.962
313003	Udv. glasrammedør dobbelt	1986x2121 hærdet lamineret, glasfacadesystem	stk.	3	33.333	100.000
314001	Oplukkeligt parti - Curtainwall	Opluk i aluparti	stk.	16	8.125	130.000
990004	Øvrige lukningsarbejder (specificeres)	diverse arbejder og stillads		1	49.071	49.071

OBS: Alle beslagsæt prissættes under Indvendigt snedkerarbejde

BD-nummer	Emne	Specifikation	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum
2 Lukningsarbejde sum:						4.000,719

3 Indvendigt snedkerarbejde

322001	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	3.545	3.545
322002	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	4.001	4.001
322003	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	4.082	4.082
322004	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	3.989	3.989
322005	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	5.772	5.772
322006	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	2.335	2.335
322007	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	2.636	2.636
322008	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	2.899	2.899
322009	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	4.558	4.558
322010	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	2.552	2.552
322011	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	3.240	3.240
322012	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	8.772	8.772
322013	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	3.826	3.826
322014	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	7.612	7.612
322015	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	7.508	7.508
322016	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	3.948	3.948
322017	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	4.049	4.049
322018	Indvendigt vindue	Fast	stk.	2	8.232	16.463
322019	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	6.679	6.679
322020	Indvendigt vindue	Fast	stk.	4	8.248	32.992
322021	Indvendigt vindue	Fast	stk.	2	11.720	23.440
322022	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	10.374	10.374
322023	Indvendigt vindue	Fast	stk.	3	7.493	22.478
322024	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	8.761	8.761
322025	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	4.138	4.138
322026	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	8.598	8.598
322027	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	4.546	4.546
322028	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	4.733	4.733
322029	Indvendigt vindue	Fast	stk.	3	3.911	11.733
322030	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	3.967	3.967
322031	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	4.756	4.756
322032	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	10.882	10.882
322033	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	3.397	3.397
322034	Indvendigt vindue	Fast	stk.	8	11.452	91.617
322035	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	5.073	5.073
322036	Indvendigt vindue	Fast	stk.	3	12.006	36.019
322037	Indvendigt vindue	Fast	stk.	3	12.138	36.414
322038	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	27.462	27.462
322039	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	6.226	6.226
322040	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	5.027	5.027

BD-nummer	Emne	Specifikation	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum
322041	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	7.266	7.266
322042	Indvendigt vindue	Fast	stk.	4	26.534	106.134
322043	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	5.834	5.834
322044	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	7.208	7.208
322045	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	6.736	6.736
322046	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	28.339	28.339
322047	Vindue	Fast_Opluk. sideparti	stk.	1	17.270	17.270
322048	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	6.498	6.498
322049	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	12.421	12.421
322050	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	22.291	22.291
322051	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	7.917	7.917
322052	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	7.539	7.539
322053	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	22.142	22.142
322054	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	9.857	9.857
322055	Indvendigt vindue	Fast	stk.	1	8095	8.095
322056	Indvendigt Vindue	Fast 3000x2100mm 200 karm 44dB	stk.	1	7816	7.816
322057	Indvendigt Vindue	Fast 2010x912mm EI2 60 44dB	stk.	4	9553	38.211
322058	Indvendigt Vindue	Fast 1100x912mm EI2 60 44dB	stk.	1	6133	6.133
322059	Indvendigt Vindue	Fast 800x912mm EI2 60 44dB	stk.	1	4826	4.826
322060	Indvendigt Vindue	Fast 2900x912mm EI2 60 44dB	stk.	1	13329	13.329
322061	Indvendigt Vindue	Fast 450x912mm EI2 60 44dB	stk.	1	3372	3.372
322062	Parti	Fast 2400x220	stk.	1	4200	4.200
322063	Indvendigt Vindue	Fast 1900x912mm EI2 60 44dB	stk.	1	9226	9.226
322064	Indvendigt Vindue	Fast 2100x2100mm 200 karm EI2 30 44dB	stk.	1	13968	13.968
322065	Indvendigt	Vindue Fast 2700x912mm EI2 60 33dB	stk.	1	12519	12.519
	"FEJL I UPLOAD"		stk.	1		
			stk.	1		
322059	Indvendigt Vindue	Fast 800x912mm EI2 60 44dB	stk.	1		
322060	Indvendigt Vindue	Fast 2900x912mm EI2 60 44dB	stk.	1		
			stk.	1		
321001	Indvendig dør	D 16x21 Csa	stk.	2	9491	18.981
321002	Indvendig dør	D 18x21	stk.	1	6348	6.348
321003	Indvendig dør	D 18x21 44 dB EI2 30	stk.	2	30904	61.808

(står også øverst).

BD-nummer	Emne	Specifikation	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum
321004	Indvendig dør	D 18x21 EI2 30-C	stk.	1	8014	8.014
321005	Indvendig dør	D 18x21 EI2 60-C	stk.	1	32702	32.702
321006	Indvendig dør	D 20x21 44 dB EI2 30	stk.	7	31266	218.864
321007	Indvendig dør	D 20x21 44dB	stk.	2	32729	65.458
321008	Indvendig dør	D 20x21 EI2 30	stk.	1	8623	8.623
321009	Indvendig dør	D 20x21 Træfiner	stk.	3	28764	86.293
321010	Indvendig dør	DA 16x21	stk.	1	6143	6.143
321011	Indvendig dør	DA 15x21 E 60-C	stk.	1	9092	9.092
321012	Indvendig dør	DAG 15x21 33dB EI2 30	stk.	1	9025	9.025
321013	Indvendig dør	DAR 14x21 E 60-C	stk.	1	16427	16.427
321014	Indvendig dør	DR 18x21	stk.	1	8190	8.190
321015	Indvendig dør	DR 20x21	stk.	1	8814	8.814
321016	Indvendig dør	DR 20x21 33dB EI2 60-C	stk.	1	26887	26.887
321017	Indvendig dør	DR 20x21 44dB EI2 60-C	stk.	3	27008	81.023
321018	Indvendig dør	DR 25x21 EI2 60-C	stk.	1	33774	33.774
321019	Indvendig dør	E 7x21 EI2 60-C	stk.	1	4469	4.469
321020	Indvendig dør	E 8x21	stk.	48	3259	156.438
321021	Indvendig dør	E 9x21	stk.	9	3259	29.332
321022	Indvendig dør	E 9x21 44dB EI2 30	stk.	3	15202	45.607
321023	Indvendig dør	E 9x21 EI2 30-C	stk.	9	3663	32.966
321024	Indvendig dør	E 9x21 EI2 60-C	stk.	1	4626	4.626
321025	Indvendig dør	E 10x21	stk.	6	3405	20.427
321026	Indvendig dør	E 10x21 44dB	stk.	3	15674	47.021
321027	Indvendig dør	E 10x21 44dB EI2 30	stk.	6	15878	95.267
321028	Indvendig dør	E 10x21 44dB EI2 30-C	stk.	3	15878	47.635
321029	Indvendig dør	E 10x21 44dB EI2 60-C	stk.	1	18216	18.216
321030	Indvendig dør	E 10x21 EI2 30-C	stk.	4	3827	15.307
321031	Indvendig dør	E 10x21 EI2 60-C	stk.	2	4796	9.591
321032	Indvendig dør	ER 10x21	stk.	7	4369	30.586
321033	Indvendig dør	ER 10x21 33dB	stk.	9	6293	56.637
321034	Indvendig dør	ER 10x21 33dB E 60-C	stk.	1	9639	9.639
321035	Indvendig dør	ER 10x21 35dB EI2 60-C	stk.	1	12996	12.996
321036	Indvendig dør	ER 10x21 44dB	stk.	20	12019	240.385
321037	Indvendig dør	ER 10x21 44dB EI2 30	stk.	27	14739	397.962
321038	Indvendig dør	ER 10x21 44dB EI2 30-C	stk.	1	8902	8.902
321039	Indvendig dør	ER 10x21 44dB EI2 60-C	stk.	2	12996	25.992
321040	Indvendig dør	ER 10x21 47dB EI2 30	stk.	1	8902	8.902
321041	Indvendig dør	ER 10x21 EI2 30	stk.	1	8037	8.037
321042	Indvendig dør	ER 10x21 EI2 30-C	stk.	2	8038	16.075
321043	Indvendig dør	ER 10x21 EI2 60-C	stk.	1	15343	15.343
321044	Indvendig asymetrisk dobbeldør	15x21 44dB EI2 30-C	stk.	1	30228	30.228
321045	Indvendig skydedør i væg	10x21 EI2 30-C	stk.	1	19309	19.309
321046	Indv. skydedør påbygget	11x21 EI2 60-C	stk.	1	23996	23.996
321047	Indv. skydedør påbygget	12x21	stk.	1	6930	6.930

BD-nummer	Emne	Specifikation	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum
321048	Indv. skydedør:	10x21	stk.	1	5574	5.574
339001	Fodlister og indfatninger	Jf. tegningerne og beskrivelsen		1	1.016.156	1.016.156
991001	Beslagsæt 01	Aflåselig (E) Dobbelt cylinder		30	880	26.385
991002	Beslagsæt 02	Aflåselig (D) Dobbelt cylinder Dørlukker	stk.	1	1.891	1.891
991003	Beslagsæt 03	Aflåselig (E) Cylinder og vrider Dørlukker	stk.	11	1.630	17.935
991004	Beslagsæt 04	Aflåselig (E) Toiletbesætning med markering	stk.	46	722	33.219
991005	Beslagsæt 05	Aflåselig (E) Toiletbesætning med HC markering	stk.	3	722	2.166
991006	Beslagsæt 06	Aflåselig (E) Cylinder Toiletbesætning med markering	stk.	6	722	4.332
991007	Beslagsæt 07	Uaflåselig €	stk.	26	242	6.286
991008	Beslagsæt 08	Uaflåselig (E) Dørlukker	stk.	8	1.254	10.029
991009	Beslagsæt 09	Uaflåselig (D) Flugtvej i en retning	stk.	5	242	1.208
991010	Beslagsæt 10	Uaflåselig (S)	stk.	2	242	483
991011	Beslagsæt 11	Uaflåselig (S) Dørlukker	stk.	1	1.153	1.153
991012	Beslagsæt 12	Uaflåselig (S) ABDL Dørlukker	stk.	1	2.840	2.840
991013	Beslagsæt 13	Aflåselig (E) Flugtvej i en retning	stk.	88	52	4.565
991014	Beslagsæt 14	Aflåselig (D) Flugtvej i en retning	stk.	9	511	4.598
991015	Beslagsæt 15	Aflåselig (E) Flugtvej i en retning Dørlukker	stk.	5	1.031	5.153
991016	Beslagsæt 16	Aflåselig (D) Flugtvej i en retning Dørlukker	stk.	7	1.519	10.630
991017	Beslagsæt 17	Aflåselig (D) Friløb ABDL Dørlukker	stk.	1	3.433	3.433
991018	Beslagsæt 18	Uaflåselig (D) Flugtvej i begge retninger ABDL	stk.	4	2.841	11.362

BD-nummer	Emne	Specifikation	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum
991020	Beslagsæt 20	Aflåselig (E) Flugtvej i en retning ADK kortlæser uden tastatur	stk.	1	6.053	6.053
991021	Beslagsæt 21	Aflåselig (D) Flugtvej i en retning ADK kortlæser uden tastatur Dørlukker	stk.	1	6.757	6.757
991023	Beslagsæt 23	Aflåselig (D) Flugtvej i en retning ADK kortlæser med tastatur Dørlukker	stk.	4	6.757	27.029
991024	Beslagsæt 24	Aflåselig (D) ADK kortlæser med tastatur Dørlukker	stk.	2	6.757	13.514
991025	Beslagsæt 25	Aflåselig (D) ADK kortlæser uden tastatur Flugtvej i begge retninger ABDL Dørlukker	stk.	1	9.054	9.054
991026	Beslagsæt 26	Aflåselig (E) Dobbelt cylinder Dørlukker	stk.	5	1.891	9.456
991028	Beslagsæt 28	Aflåselig (D) Cylinder/vrider Dørlukker	stk.	3	1.630	4.891
991029	Beslagsæt 29	Uaflåselig (D) Dørlukker	stk.	1	1.249	1.249
991030	Beslagsæt 30	Aflåselig (D) Flugtvej i begge retninger	stk.	1	510	510
991031	Beslagsæt 31	Aflåselig (E) Flugtvej i begge retninger Dørlukker	stk.	1	1.332	1.332
991032	Beslagsæt 32	Aflåselig (E) Friløb ABDL Dørlukker	stk.	2	3.248	6.495
991033	Beslagsæt 33	Aflåselig (D) Cylinder/vrider	stk.	1	618	618
991034	Beslagsæt 34	Aflåselig (E) Flugtvej i en retning ADK kortlæser med tastatur	stk.	1	6.051	6.051

BD-nummer	Emne	Specifikation	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum
991035	Beslagsæt 35	Aflåselig (D) Flugtvej i en retning ADK kortlæser med tastatur	stk.	2	6.051	12.102
991036	Beslagsæt 36	Aflåselig (D) ADK kortlæser uden tastatur	stk.	2	6.238	12.475
991037	Beslagsæt 37	Nøgle, patenteret	stk.	70	99	6.957
990004	Øvrige indvendige snedkerarbejder (specificeres)					

3 Indvendigt snedkerarbejde sum: 4.289.474

4 Stipulerede ydelser

327002	Foldevægge 44 dB	Foldevæg 44 dB, loftmonteret, limet sandwichkonstruktion	m ²	110	3.314	364.500
999001	Faglærte medarbejdere		Timer	100	410	41.000
999002	Ufaglærte medarbejdere		Timer	100	360	36.000
999003	Lærlinge		Timer	100	239	23.900

4 Stipulerede ydelser sum: 465.400

Nr.	Bygningsdel	Specifikation	Bemærkninger













RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5730511#0 - SV:SSK - Lysning v. ovenlys

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [mailto:ibj@friis-moltke.dk] (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]
Til: 'Ingri B. Løvsbogen' [ibl@friis-moltke.dk]
Cc: 'Arne Borum Linnet' [al@fmbyggningsdrift.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; 'Henrik Villefrance' [hv@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 05-08-2020 14:00
Modtaget Dato: 05-08-2020 14:00
Vedrørende: SV: SSK - Lysning v. ovenlys.
Vedhæftninger: image001_330.png
image002_340.png
image003_344.png
image004_344.png
image005_344.png
image006_244.jpg
image007_110.jpg

Hej Ingri.

Super, det var bare det jeg skulle vide. Tak.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Ingri B. Løvsbogen [mailto:ibl@friis-moltke.dk]
Sendt: 5. august 2020 13:32
Til: Morten Bramstrup Jakobsen
Cc: Arne Borum Linnet; Sune Bundesen; Kim Kirkegaard Sørensen; Henrik Villefrance
Emne: SV: SSK - Lysning v. ovenlys.


Hej Morten,

Hvis du hentyder til at lysningen har er kegleformet, er det fordi vi blev nødt til at finde en løsning på grund af at ovenlyseleverandør ikke havde taget mål på pladsen (jf. beskrivelsen) af selve betonhul. Dette resulterede så i at ovenlyset er større end betonhullet. Så hvis det er dette, så er dette aftalt med Rikke på pladsen 😊

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvsbogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ibl@friis-moltke.dk



 Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Sendt: 5. august 2020 13:23
Til: Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: SV: SSK - Lysning v. ovenlys.

5145

Hej Ingri.

Rikke referer, at du har godkendt ved tilsyn, at lysninger ikke skal være indenfor tolerancerne i og med de konfliktede med betonelementer. Det er den nordøstlige del ved trapperne. Det er bare et ja/nej spørgsmål, er det godkendt af dig? ☺

På forhånd tak.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Ingri B. Løvsbogen [<mailto:ibl@friis-moltke.dk>]

Sendt: 5. august 2020 13:16

Til: Morten Bramstrup Jakobsen

Cc: Arne Borum Linnet; Sune Bundesen; Kim Kirkegaard Sørensen; Henrik Villefrance

Emne: SV: SSK - Lysning v. ovenlys.

Hej Morten,

I må tage fat i Rikke, og høre helt specifikt omkring hvad ARK har sendt, og melde tilbage hvis det er noget I er uenige i.

Jeg har lavet tilsyn på ovenlys, at disse ikke var korrekt udført, og ikke ville blive godkendt at maler.
Vi sagde god for at de kunne bruge 15 mm gips.

Mvh,
Ingri

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 22. juli 2020 13:41

Til: Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>

Cc: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; 'Arne Borum Linnet' <al@fmbyggningsdrift.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Emne: SSK - Lysning v. ovenlys.

Hej Ingri.

Ved koordineringsmøde i går på pladsen var vi ved at se på gipsarbejdet ved ovenlys.

Der er en del, der er blevet kasseret af maler i nordvestlig del. I den nordøstlig del så Søren Aaby og jeg også, at der var nogle plader der springer. Her nævnte Rikke fra Kraftman, at det var accepteret af dig på pladsen og der var fremsendt noget på skrift? Hvis det er tilfældet, vil du så ikke fremsende det til mig? ☺

Det skal lige siges, at der var noget med nogle beton elementer, der vist ikke var efter tegningerne og det var på den baggrund godkendelsen er givet, men jeg vil gerne lige sikrer mig at det også passer, hvad vi fik at vide på pladsen. Om pladerne er inden for Q2 tolerance på gips kunne jeg ikke lige se på øjemål.

På forhånd tak.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk















RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR



5730683#0 - 06 Opsamling fra videomøde den 4.8 2020 medlemme rå

Fra: Lars-Erik Skydsbjerg [les@toender.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Cc: Palle Kudsk [PKU@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Sendt dato: 05-08-2020 14:00
Modtaget Dato: 05-08-2020 14:00
Vedrørende: VS: Opsamling fra videomøde den 4.8 2020 medlemme rådgiver og kommunen

T.O og til sagen.

Venlig hilsen

Lars-Erik Skydsbjerg

Fagchef
Teknik & Plan
Teknik og Miljø

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 55 - Mobil +45 24 25 73 24 - E-mail les@toender.dk



OL_Logo

Fra: Ditte Lundgaard Jakobsen
Sendt: 4. august 2020 15:50
Til: 'Mogens Husted Kristensen'; Lars-Erik Skydsbjerg
Cc: Klaus Liestmann; Jan Præstholm
Emne: Opsamling fra videomøde den 4.8 2020 medlemme rådgiver og kommunen

Her følger opsamling efter dagens møde mellem Friis og Moltke ved Mogens Husted Kristensen og Henrik Villefrance samt Tønder Kommune ved Ditte Lundgaard Jakobsen og Lars-Erik Skydsbjerg.

På mødet blev honorering af rådgiver i den forlængede byggeperiode drøftet. Drøftelsen var afledt af mailkorrespondance mellem Mogens Husted Kristensen og Ditte Lundgaard i uge 29 grundet et faktureret timetal på over 300.000 kr. i juni måned fordelt på 13 fakturaer.

Tønder Kommune tydeliggjorde, at det var en væsentlig præmis for aftalen med rådgiver, at loftet på de 1,4 mio. kr. holdes, og at der alene betales for ekstraarbejder afledt af forlængelsen. Kommunen er bekymret får loftet kan holdes, idet første afregning allerede er så markant over det af rådgiver estimeret.

Der blev fra Rådgivers side oplyst, at man ikke vil garantere beløbsrammen på 1,4 mio. kr. kan overholdes og derfor ikke vil påtage sig den risiko med en bindende aftale. .
Rådgiver er indstillet på at overdrage opgaver til Tønder Kommune som bygherre med henblik på at minimere antallet af forbrugte timer.

Tønder Kommune orienterede om, at i det omfang der ikke kan laves en bindende aftale om de 1,4 mio. kr., så må honoraret genforhandles på ny med det oprindelig afsæt eventuelt med juridisk bistand.

Man er enige om, at Tønder Kommune kan overtage visse projekteringsopgaver i forbindelse med besparelse på udenoms-arealerne. Herudover kan rådgiver eventuelt overtage direkte korrespondance med entreprenører.
Rådgiver vender hurtigst mulig tilbage med bud på, hvilke opgaver kommunen kan overtage, med henblik på at kunne lave en endelig aftale om et honorar på maksimalt 1,4 mio. kr.
Det blev endvidere aftalt, at kommunen udbetaler 0.2 mio. kr. aconto for juni måned, og rådgiver fremsender en faktura på dette.

Venlig hilsen

Ditte Lundgaard Jakobsen

Direktør
Teknik & Miljø

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 92 - Mobil +45 22 15 41 04 - E-mail dilja@toender.dk



OL_Logo

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]
Til: 'hv@friis-moltke.dk' [hv@friis-moltke.dk]; 'Arne Borum Linnet' [al@fmbyggningsdrift.dk]
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 05-08-2020 14:06
Modtaget Dato: 05-08-2020 14:06
Vedrørende: SSK - Arbejdsbeskrivelse for TØ og arbejde ved vinduerne.
Vedhæftninger: image002_29.jpg
image003_350.png
image004_350.png
image005_350.png
image006_78.png
image007_43.png
image008_68.jpg

Hej Alle.

Kan se følgende i punkt i TØ's arbejdsbeskrivelse. Så efter min mening, så har Henning fugearbejde med selvom han ikke mener det.

372011 - Elastiske fuger ved alle tilslutninger udvendigt og indvendigt

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



372011 - Elastiske fuger ved alle tilslutninger udvendigt og indvendigt













RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5730706#0 - SV:SSK - Arbejdsbeskrivelse for TØ og arbejde ved

Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; 'Arne Borum Linnet' [al@fmbygningsdrift.dk]
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 06-08-2020 07:21
Modtaget Dato: 06-08-2020 07:21
Vedrørende: SV: SSK - Arbejdsbeskrivelse for TØ og arbejde ved vinduerne.
Vedhæftninger: image001_119.jpg
image002_372.png
image003_377.png
image004_377.png
image005_377.png
image006_87.png
image007_118.jpg

Enig

Det er kun lysningerne der er tvivl om – De er ikke beskrevet på tilbudslisterne, alt andet har Henning med under montage af vinduer / lukningsentreprisen.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Sendt: 5. august 2020 14:06
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; 'Arne Borum Linnet' <al@fmbygningsdrift.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Emne: SSK - Arbejdsbeskrivelse for TØ og arbejde ved vinduerne.

Hej Alle.

Kan se følgende i punkt i TØ's arbejdsbeskrivelse. Så efter min mening, så har Henning fugearbejde med selvom han ikke mener det.

372011 - Elastiske fuger ved alle tilslutninger udvendigt og indvendigt

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



372011 - Elastiske fuger ved alle tilslutninger udvendigt og indvendigt













RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5730704#0 - SV: SSK - Arbejdsbeskrivelse for TØ og arbejde ved

Fra: Arne Borum Linnét [al@fmbyggningsdrift.dk]
Til: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]; Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 06-08-2020 07:40
Modtaget Dato: 06-08-2020 07:40
Vedrørende: SV: SSK - Arbejdsbeskrivelse for TØ og arbejde ved vinduerne.
Vedhæftninger: image001_359.png
image009_23.jpg
image010_31.png
image011_31.png
image012_27.png
image013_14.png
image014_13.png
image015_4.jpg

Hej Henrik

Sender Ingri det til Henning, så vi fastholder ham i at det er Kraftman som skal leverer fuge?

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnét
Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbyggningsdrift.dk
Web: www.fmbyggningsdrift.dk



Hovedkontor:	Afdeling Sverige:
FM Bygningsdrift ApS	FM Management AB
Bryggergade 6A, 1.	Bergaliden 11
7400 Herning	252 23 Helsingborg

Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Sendt: 6. august 2020 07:21
Til: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Arne Borum Linnét <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Emne: SV: SSK - Arbejdsbeskrivelse for TØ og arbejde ved vinduerne.

Enig

Det er kun lysningerne der er tvivl om – De er ikke beskrevet på tilbudslisterne, alt andet har Henning med under montage af vinduer / lukningsentreprisen.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Sendt: 5. august 2020 14:06
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; 'Arne Borum Linnét' <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Emne: SSK - Arbejdsbeskrivelse for TØ og arbejde ved vinduerne.

Hej Alle.

Kan se følgende i punkt i TØ's arbejdsbeskrivelse. Så efter min mening, så har Henning fugearbejde med selvom han ikke mener det.

372011 - Elastiske fuger ved alle tilslutninger udvendigt og indvendigt

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

372011 - Elastiske fuger ved alle tilslutninger udvendigt og indvendigt













RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5731093#0 - SSK - Tækker, VVS, CTS, forkerte motorventiler

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VKS]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Sendt dato: 06-08-2020 10:55
Modtaget Dato: 06-08-2020 10:55
Vedrørende: SSK - Tækker, VVS, CTS, forkerte motorventiler
Vedhæftninger: image001_10.gif
image002_7.gif
image003_0.gif
image005_411.png
image006_105.png
image007_59.png
image008_43.png
image009_42.png
image010_25.jpg

Hej Morten

Hermed som aftalt

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Fra: Kasper Bornstein Larsen <kbl@taekker.dk>

Sendt: 18. juni 2020 15:57

Til: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Thomas Kawaler <tk@jurgensen-vvs.dk>; Morthensen Michael Kenneth (Bravida) <Michael.k.Morthensen@bravida.dk>

Cc: Morten Høier <moh@taekker.dk>

Emne: VS: Skærbæk skole - CTS

Hej alle.

Som I ved har det været oppe at vende at motorventilerne til blandekredsene er leveret i for små størrelser. Nedenfor kommer en redegørelse af situationen. I er meget velkomne til at skrive eller ringe (som nok er mere praktisk) hvis I har spørgsmål til det.

CTS har leveret motorventil til VVS som skal etablere disse i blandekredse, og efterfølgende i gang med at funktionsafprøve og indregulere varmeanlægget.

Motorventilerne har ikke samme dimensioner som anført på principdiagrammer udført af ING. Dette påpeger VVS og de melder ud at de er nød til at fortsætte arbejdet for at overholde tidsplanen.

Motorventilerne er i en dimension der gør at de kan anvendes til at regulere varmeanlægget, men det er muligt at tryktabet over dem er for stort (grundet at de er mindre end anført). Der kan være 2 udfald af denne situation:

- 1: Varme anlægget virker fint og varmen kan styres som det er tiltænkt.
- 2: Varme anlægget har svært ved at levere varme til dele af varme anlægget grundet at trykket der er tilgængeligt er for lavt.

I tilfælde 2 vil der være behov for at der etableres motorventiler af den rigtige størrelse, eller måske at der etableres trykforøgelse. Det er op til CTS hvordan dette løses, da leverancen af motorventiler er deres ansvar. Jeg synes du skal give mig et kald Michael, da jeg ved at der er ingen som vil eller har brug for at det her bliver mere kompliceret end nødvendigt. Det er klart at der er risiko for at VVS skal udføre noget merarbejde i forbindelse med montering af motorventilerne eller trykforøger.

De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Kasper Bornstein Larsen
Civilingeniør i energi, indeklimateknik, VVS og ventilation
kbl@taekker.dk

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M +45 41711328
T +45 8619 1844

www.taekker.dk





















RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VKS]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mob]2@toender.dk
Cc: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 06-08-2020 11:01
Modtaget Dato: 06-08-2020 11:01
Vedrørende: SSK - Tækker, Friis & Moltke, CTS, VVS, Forkerte Motorventiler, evt. manglende varme
Vedhæftninger: image001_390.png
image002_410.png
image003_410.png
image004.gif
image005.gif
image006.gif
image007_60.png
image008_80.jpg
image009_29.jpg
image010_39.png
image011_39.png
image012_4.jpg

Hej Morten

Nedenstående har jeg fået fra Arne.
Tror ikke der er gjort mere i denne sag.

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Fra: Arne Borum Linnet [mailto:al@fmbyggningsdrift.dk]

Sendt: 6. august 2020 10:35

Til: Kim Kirkegaard Sørensen

Emne: VS: Sv.:Skærbæk skole - CTS

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbyggningsdrift.dk
Web: www.fmbyggningsdrift.dk



Hovedkontor: FM Byggningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige: FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Fra: Søren Jacobsen <sj@jurgensen-vvs.dk>
Sendt: 22. juni 2020 20:18
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Lars Jürgensen <lj@jurgensen-vvs.dk>
Emne: Sv.:Skærbæk skole - CTS

Hej Arne

Det skal vi nok gøre.

God aften

Mvh søren

----- Oprindelig besked -----

Fra: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Dato: man. d. 22. jun. 2020 16.29
Til: Søren Jacobsen <sj@jurgensen-vvs.dk>
Emne: VS: Skærbæk skole - CTS
Hej Søren

Se nedenstående ift. hvis der er udfordringer med beskrivelse eller andet til projektet, så må I meget gerne sætte Henrik cc mail ift. at det er ham som står for at rådgiver teamet

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet
Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbyggningsdrift.dk
Web: www.fmbyggningsdrift.dk



Hovedkontor:	Afdeling Sverige:
FM Byggningsdrift ApS	FM Management AB
Bryggergade 6A, 1.	Bergaliden 11
7400 Herning	252 23 Helsingborg

Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Sendt: 18. juni 2020 12:47
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>; Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk>
Emne: VS: Skærbæk skole - CTS

Hej Arne

Her er svar fra Tækker på mail fra VVS

Hvis VVS eller andre har problemer med svar fra Tækker (oprettet i Dalux) må de gerne rykke ved mig også, så går jeg videre med det til Tækker. Evt. en liste med ting de mangler svar på.

Du må gerne sende denne tråd videre til VVS så de kan se svaret fra Tækker omkring evt. manglende svar/projekt opdateringer.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Sendt: 18. juni 2020 11:41
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk>; Kasper Bornstein Larsen <kbl@taekker.dk>
Emne: SV: Skærbæk skole - CTS

Hej Henrik,

5193
Vi er i dialog med VVS og CTS omkring dette, da det handler om hvad CTS har leveret og ikke leveret til VVS – han sender igen en mail ud nu ift.

dette.
Vi har generelt forhørt os løbende ift. manglende afklaringer for at sikre at der ikke er noget udestående, og har generelt haft en god dialog med Jürgensen VVS. Som Arne har påpeget til entreprenørerne så må de oprette sagerne i Dalux. Her er der mig bekendt ikke noget omkring dette på Dalux.

Jeg synes godt nok at tingene bliver blæst voldsomt op 😊
Vi læser vores mails og svarer jævnlige, men vi kan ikke smide alt vi har hænderne hver gang der bliver rykket for noget. Entreprenørerne må også forvente en svartid.

De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M +45 4171 1319
T +45 8619 1844

www.taekker.dk



Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Sendt: 18. juni 2020 10:29
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>; Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk>
Cc: Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>; Arne Borum Linnét <al@fmbyggningsdrift.dk>
Emne: VS: Skærbæk skole - CTS

Hej Morten

Vil du forholde dig til mailen fra VVS, som nu indbygger forkerte motorventiler osv. Dette fordi (Som jeg læser det) ikke kan få et svar fra jer ved Tækker.

Det er ikke godt hvis dialogen med VVS stopper her, fordi i er for langsomme til at svare på spørgsmål fra VVS.

Vi har i forvejen en rigtig dårlig sag ved bygherre, vi skal ikke ud i flere fejl som bygherre efterfølgende kan bruge i en voldgift.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Arne Borum Linnét <al@fmbyggningsdrift.dk>
Sendt: 18. juni 2020 09:35
Til: Kasper Born Larsen <kbl@taekker.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Morten Høier (moh@taekker.dk) <moh@taekker.dk>
Emne: VS: Skærbæk skole - CTS

Hej Kasper og Henrik

Se nedenstående ift. at VVS melder at de monterer ukritisk nu. Jeg er bange for at det kan give stor udfordringer, hvis vi ikke tager tingene i opløbet som der er blevet gjort fra VVS side indtil nu. Vil følge op på nedenstående og om de mangler andet til deres projekt. De nævner til hver BM at de mangler måler og føler.

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnét
Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbyggningsdrift.dk
Web: www.fmbyggningsdrift.dk

FM Byggningsdrift
Logistik & Rådgivning

5194
Hovedkontor: Afdeling Sverige:

FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Fra: Søren Jacobsen <sj@jurgensen-vvs.dk>
Sendt: 17. juni 2020 06:49
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>
Emne: Skærbæk skole - CTS

Hej Arne

Blot så du er informeret – Se nedenstående

Med venlig hilsen

Søren Jacobsen

Tel.: 7472 2210
Håndværkervej 9
6270 Tønder
www.jurgensen-vs.dk



Fra: Lars Jürgensen
Sendt: 16. juni 2020 17:49
Til: Kasper Born Larsen (kbl@taekker.dk) <kbl@taekker.dk>
Cc: Søren Jacobsen <sj@jurgensen-vvs.dk>; Thomas Kawaler <tk@jurgensen-vvs.dk>
Emne: Skærbæk skole - CTS

Hej Kasper

Jeg ved faktisk ikke om dette er dit bord, men ellers kan du sende min mail videre. Du ved vi har måttet rykke rigtig mange gange for at få motorventiler m.m. fra CTS, men jeg tror det er lykkedes

Nu kommer Thomas hjem og fortæller at motorventilerne fint er mærket op med hvilken sløjfe de skal bruges til, og det burde jo være perfekt. Ved et tilfælde opdager han så at størrelsen på den leverede ventil ikke passer med det der står på tegningen. Om det er det ene eller det andet der ikke passer ved jeg ikke, men der må være rod i et eller andet. Jeg har sagt til Thomas at der ikke længere skal bruges tid på projekt, så han har fået besked på at han ukritisk skal montere de ventiler CTS har leveret, så må der være nogen andre der skifter dem ud senere hen hvis de er forkerte

Med venlig hilsen
Lars Jürgensen
VVS installatør
Tel.: 74 72 22 10
Dir.: 73 63 22 11
Mobil: 27 15 22 00



FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning













 **Jürgensen VVS**

 **Jürgensen VVS**







RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5731501#0 - SV: Skærbæk skole - besparelser

Fra: Karen Marie Fisker Langkjer [kml@lytt.dk]
Til: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]; Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk) [hv@friis-moltke.dk]; Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk) [al@fmbygningsdrift.dk]
Sendt dato: 06-08-2020 11:17
Modtaget Dato: 06-08-2020 11:17
Vedrørende: SV: Skærbæk skole - besparelser
Vedhæftninger: image009_50.png
image010_47.png
image011_46.png
image012_37.png
image013_19.png
image014_19.png
image015_9.jpg
image016_9.png
image017_2.png

Hej Kim,

Ja – det kan jeg. Hvilket tidspunkt passer jer?

Mød venlig hilsen / Best Regards

Karen Marie Fisker Langkjer

Arkitekt maa mdl
+45 2265 8902

www.lytt.dk / Aarhus / København

LYTT Urban & Landscape
Architecture

> [Schyyy ... Arkitektfaglig fusion lytter til fremtiden](#)

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen [mailto:kimkir@toender.dk]
Sendt: 6. august 2020 11:12
Til: Karen Marie Fisker Langkjer
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Sune Bundesen; Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk); Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk)
Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Hej Karen Marie

Har du stadig mulighed for at deltage i et møde tirsdag i uge 33.
Tænker mødet har en varighed på en lille time, hvor vi kan gennemgå udearealet og besparelserunden.

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Fra: Karen Marie Fisker Langkjer [mailto:kml@lytt.dk]
Sendt: 3. august 2020 13:22
Til: Henrik Villefrance; Kim Kirkegaard Sørensen; Morten Bramstrup Jakobsen
Cc: Arne Borum Linnet; Mogens Husted Kristensen
Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Hej Kim,

5208

Det er desværre ikke muligt for mig at deltage i møde nu på onsdag.

Hvad med mandag eller tirsdag i uge 33 i stedet?

Mød venlig hilsen / Best Regards

Karen Marie Fisker Langkjer

Arkitekt maa mdl
+45 2265 8902

www.lytt.dk / Aarhus / København

LYTT Urban & Landscape
Architecture

> [Schyyy ... Arkitektfaglig fusion lytter til fremtiden](#)

Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk]

Sendt: 3. august 2020 11:59

Til: Kim Kirkegaard Sørensen; Morten Bramstrup Jakobsen

Cc: Arne Borum Linnet; Mogens Husted Kristensen; Karen Marie Fisker Langkjer

Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Hej Kim

Alt det indvendige har vi jo løbende om projekteret (Det har i også fået faktura på) Der er overhoved ikke rettet noget på alt det udvendige mht. Besparelser i landskabsprojekt.

Alle de besparelser i har lavet på det udvendige skal jo indarbejdes i tegningsarbejdet af landskabsarkitekten.

Jeg vil forslå at vi holder et møde med landskabsarkitekten hvor vi gennemgår alle besparelserne, så de kan indarbejdes i projektet.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Sendt: 3. august 2020 11:06

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Cc: Karen Marie Fisker Langkjer (kml@mgarkitekter.dk) <kml@mgarkitekter.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>

Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Hej Henrik

Vi har lige drøftet og vendt den på kontoret.

Du er nød til at uddybe hvad det er i mæner der skal indarbejdes?

Er det hele besparelseslisten, indvendig og udvendig eller er det enkelte punkter fra listen?

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk]

Sendt: 3. august 2020 10:40

Til: Kim Kirkegaard Sørensen; Morten Bramstrup Jakobsen

Cc: Karen Marie Fisker Langkjer (kml@mgarkitekter.dk); Arne Borum Linnet; Mogens Husted Kristensen; Morten Høier

Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Hej Kim

5209

Alle de besparelser i har lavet skal indarbejdes i projektet så projektet tilsvaret det aftalte med Ent.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Sendt: 3. august 2020 10:13

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Cc: Karen Marie Fisker Langkjer (<kml@mgarkitekter.dk> <kml@mgarkitekter.dk>); Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>

Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Hej Henrik

Kan jeg ikke få dig til at beskrive, hvad det er du mener der skal om projekteres?

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Fra: Henrik Villefrance [<mailto:hv@friis-moltke.dk>]

Sendt: 3. august 2020 10:02

Til: Kim Kirkegaard Sørensen; Morten Bramstrup Jakobsen

Cc: Karen Marie Fisker Langkjer (<kml@mgarkitekter.dk>); Arne Borum Linnet; Mogens Husted Kristensen; Morten Høier

Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Hej Kim

Hvis landskabsarkitekten ikke får mulighed/honorar for at om projektere hele landskabsprojektet efter besparelser, så overtager Tønderkommune projekterings ansvaret for projekteringen og opfølgning.

Skal jeg igangsætte om projektering af landskabsprojektet på medgået tid ?

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Sendt: 29. juli 2020 11:03

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Karen Marie Fisker Langkjer (<kml@mgarkitekter.dk> <kml@mgarkitekter.dk>); Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>

Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Hej Henrik

Tønder Kommune ønsker ikke at overtage rådgivningsarbejdet i forbindelse med besparelserunden, derfor har Friis og Moltke også være inviteret til de afholdte besparelsermøder på byggepladsen.

Vedr. Landskabsprojektet se Tønder kommune ikke at besparelserne ændre projektet i en sådan grad, at dette kræver en opretning eller omprojektering.

Hertil forventer Tønder Kommune at Friis og Moltke informere, såfremt besparelserne kræve opretning eller ikke kan godkendes.

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Fra: Henrik Villefrance [<mailto:hv@friis-moltke.dk>]

Sendt: 9. juli 2020 08:57

Til: Kim Kirkegaard Sørensen; Morten Bramstrup Jakobsen

Cc: Arne Borum Linnet; Karen Marie Fisker Langkjer (kml@mgarkitekter.dk); Mogens Husted Kristensen

Emne: Skærbæk skole - besparelser

Hej Kim

Som opfølgning på besparelser runden har vi forståelse for at kommunen gerne selv vil forestå dele af rådgiverarbejdet, og såfremt de selv forestår rådgivningsydelser vedr. ændringer, herunder ændringer i projekt, tilsyn m.v. påtager de sig samtidig rådgiveransvaret.

Hvis vi skal lave en opretning af eks. Landskabsprojektet vil vi gerne høre herom, dette vil være ekstra og honoreret på medgået tid.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 57
hv@friis-moltke.dk



Aaboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk

[Facebook](#) · [LinkedIn](#)

LYTT Urban & Landscape
Architecture













RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

LYTT Urban & Landscape
Architecture

 FRIIS & MOLTKE
ARCHITECTS

Fra: Kasper Bornstein Larsen [kbl@taekker.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Sendt dato: 06-08-2020 11:36
Modtaget Dato: 06-08-2020 11:36
Vedrørende: SV: SSK - Lysninger ved vinduer og fjernvarme/CTS
Vedhæftninger: image001_12.gif
image002_9.gif
image003_2.gif
image010_53.png
image011_48.png
image012_39.png
image013_21.png
image014_21.png
image015_10.jpg

Hej Morten.

Jeg har netop indkaldt til møde d. 18 august for at snakke CTS.

Jeg har snakket med VVS om at vi ligeledes kigger på udslagsvaskene d. 18. Jeg indkalder til det nu her, så kan vi snakke om hvad der giver mest mening at gøre.

Jeg har snakket med VENT, og deres spørgsmål er afklaret.

De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Kasper Bornstein Larsen
Civilingeniør i energi, indeklima, VVS og ventilation
kbl@taekker.dk

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M +45 41711328
T +45 8619 1844

www.taekker.dk



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Sendt: 5. august 2020 09:38
Til: hv@friis-moltke.dk; Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; 'Arne Borum Linnet' <al@fmbyggningsdrift.dk>; Kasper Bornstein Larsen <kbl@taekker.dk>; Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SSK - Lysninger ved vinduer og fjernvarme/CTS

Hej Henrik og Morten H.

@Henrik – Ved gårdsdagens byggemøde meldte Henning ud, at han ikke har lysninger med til de resterende vinduer. Han siger det hverken fremgår af beskrivelsen eller tilbudslisten, at han skal have dem med. Arne har fundet lysninger på tegningerne dateret til 18', men jeg kan ikke finde det på hverken tilbudslisten eller arbejdsbeskrivelsen, udover at der henvises til tegningsmaterialet og basisbeskrivelser. Vil I granske om det er nævnt nogen steder af referater, rettelsesblade el. lign. – Ellers står bygherre givetvis igen med en væsentlig udgift.

@Morten H. – Der blev rejst et flag igen i går fra VVS angående fjernvarme i bygningen. De siger, at de ikke har mulighed for at sætte 'mere' varme på bygningen, da returløbet til netværket er alt for højt i forvejen. Derudover menes det, at der ikke er koordineret/beskrevet styring imellem CTS og fjernvarme og, at den dag bygning skal tages i brug kan systemet ikke indreguleres. Vil ifølge op på dette? Tag gerne fat i Jürgensen, men jeg har bedt dem fremsende igennem dalux, mail og ringe til Jer for et svar.

Vi er ligeledes uforstående for, hvorfor I ikke var ved byggemødet i går, der var flere væsentlig punkter, hvor I kunne være kommet med indput til, både på ventilation, Vvs og CTS. I havde i forvejen en mand der planlagde at deltage i et forudgående møde ang. CTS. Bravida og Jürgensen rykker for nyt møde hurtigst mulig.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

5221

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk





















RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5731502#0 - SV: Skærbæk skole - besparelser Udgørelse

Fra: Karen Marie Fisker Langkjer [kml@lytt.dk]
Til: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]; Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk) [hv@friis-moltke.dk]; Arne Borum Linnet (al@fmbyggningsdrift.dk) [al@fmbyggningsdrift.dk]
Sendt dato: 06-08-2020 11:54
Modtaget Dato: 06-08-2020 11:54
Vedrørende: SV: Skærbæk skole - besparelser
Vedhæftninger: image010_48.png
image011_47.png
image012_38.png
image013_20.png
image014_20.png
image015_14.png
image016_1.jpg
image017_3.png
image018_5.png
image019_5.png

Ja – lad os bare sige det.

Mød venlig hilsen / Best Regards

Karen Marie Fisker Langkjer

Arkitekt maa mdl
+45 2265 8902

www.lytt.dk / Aarhus / København

LYTT Urban & Landscape
Architecture

> Schyyy ... Arkitektfaglig fusion lytter til fremtiden

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen [mailto:kimkir@toender.dk]
Sendt: 6. august 2020 11:50
Til: Karen Marie Fisker Langkjer
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Sune Bundesen; Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk); Arne Borum Linnet (al@fmbyggningsdrift.dk)
Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Kan du være på byggepladsen kl. 09 ?

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Fra: Karen Marie Fisker Langkjer [mailto:kml@lytt.dk]
Sendt: 6. august 2020 11:18
Til: Kim Kirkegaard Sørensen
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Sune Bundesen; Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk); Arne Borum Linnet (al@fmbyggningsdrift.dk)
Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Hej Kim,

Ja – det kan jeg. Hvilket tidspunkt passer jer?

Mød venlig hilsen / Best Regards

5232

Karen Marie Fisker Langkjer

Arkitekt maa mdl
+45 2265 8902

www.lytt.dk / Aarhus / København

LYTT Urban & Landscape
Architecture

> [Schyyy ... Arkitektfaglig fusion lytter til fremtiden](#)

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen [mailto:kimkir@toender.dk]

Sendt: 6. august 2020 11:12

Til: Karen Marie Fisker Langkjer

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Sune Bundesen; Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk); Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk)

Emne: SV: Skærbæk skole - besparelses

Hej Karen Marie

Har du stadig mulighed for at deltage i et møde tirsdag i uge 33.

Tænker mødet har en varighed på en lille time, hvor vi kan gennemgå udearealet og besparelsesrunden.

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Fra: Karen Marie Fisker Langkjer [mailto:kml@lytt.dk]

Sendt: 3. august 2020 13:22

Til: Henrik Villefrance; Kim Kirkegaard Sørensen; Morten Bramstrup Jakobsen

Cc: Arne Borum Linnet; Mogens Husted Kristensen

Emne: SV: Skærbæk skole - besparelses

Hej Kim,

Det er desværre ikke muligt for mig at deltage i møde nu på onsdag.

Hvad med mandag eller tirsdag i uge 33 i stedet?

Mød venlig hilsen / Best Regards

Karen Marie Fisker Langkjer

Arkitekt maa mdl
+45 2265 8902

www.lytt.dk / Aarhus / København

LYTT Urban & Landscape
Architecture

> [Schyyy ... Arkitektfaglig fusion lytter til fremtiden](#)

Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk]

Sendt: 3. august 2020 11:59

Til: Kim Kirkegaard Sørensen; Morten Bramstrup Jakobsen

Cc: Arne Borum Linnet; Mogens Husted Kristensen; Karen Marie Fisker Langkjer

Emne: SV: Skærbæk skole - besparelses

Hej Kim

Alt det indvendige har vi jo løbende om projekteret (Det har i også fået faktura på) Der er overhoved ikke rettet noget på alt det udvendige mht.

Besparelser i landskabsprojekt.

Alle de besparelser i har lavet på det udvendige skal jo indarbejdes i tegningsarbejdet af landskabsarkitekten.

Jeg vil forslå at vi holder et møde med landskabsarkitekten hvor vi gennemgår alle besparelserne, så de kan indarbejdes i projektet.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Sendt: 3. august 2020 11:06

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Cc: Karen Marie Fisker Langkjer (kml@mgarkitekter.dk) <kml@mgarkitekter.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>

Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Hej Henrik

Vi har lige drøftet og vendt den på kontoret.

Du er nød til at uddybe hvad det er i mener der skal indarbejdes?

Er det hele besparelseslisten, indvendig og udvendig eller er det enkelte punkter fra listen?

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Fra: Henrik Villefrance [<mailto:hv@friis-moltke.dk>]

Sendt: 3. august 2020 10:40

Til: Kim Kirkegaard Sørensen; Morten Bramstrup Jakobsen

Cc: Karen Marie Fisker Langkjer (kml@mgarkitekter.dk); Arne Borum Linnet; Mogens Husted Kristensen; Morten Høier

Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Hej Kim

Alle de besparelser i har lavet skal indarbejdes i projektet så projektet tilsvaret det aftalte med Ent.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Sendt: 3. august 2020 10:13

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Cc: Karen Marie Fisker Langkjer (kml@mgarkitekter.dk) <kml@mgarkitekter.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>

Emne: SV: Skærbæk skole - besparelser

Hej Henrik

Kan jeg ikke få dig til at beskrive, hvad det er du mener der skal om projekteres?

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Fra: Henrik Villefrance [<mailto:hv@friis-moltke.dk>]

Sendt: 3. august 2020 10:02

Til: Kim Kirkegaard Sørensen; Morten Bramstrup Jakobsen

Cc: Karen Marie Fisker Langkjer (kml@mgarkitekter.dk); Arne Borum Linnet; Mogens Husted Kristensen; Morten Høier

Emne: SV: Skærbæk skole - besparelses

Hej Kim

Hvis landskabsarkitekten ikke får mulighed/honorar for at om projektere hele landskabsprojektet efter besparelses, så overtager Tønderkommune projekterings ansvaret for projekteringen og opfølgning.

Skal jeg igangsætte om projektering af landskabsprojektet på medgået tid ?

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Sendt: 29. juli 2020 11:03

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Karen Marie Fisker Langkjer (kml@mgarkitekter.dk) <kml@mgarkitekter.dk>; Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>

Emne: SV: Skærbæk skole - besparelses

Hej Henrik

Tønder Kommune ønsker ikke at overtage rådgivningsarbejdet i forbindelse med besparelsesrunden, derfor har Friis og Moltke også være inviteret til de afholdte besparelsesmøder på byggepladsen.

Vedr. Landskabsprojektet se Tønder kommune ikke at besparelserne ændre projektet i en sådan grad, at dette kræver en opretning eller omprojektering.

Hertil forventer Tønder Kommune at Friis og Moltke informere, såfremt besparelserne kræve opretning eller ikke kan godkendes.

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Fra: Henrik Villefrance [<mailto:hv@friis-moltke.dk>]

Sendt: 9. juli 2020 08:57

Til: Kim Kirkegaard Sørensen; Morten Bramstrup Jakobsen

Cc: Arne Borum Linnet; Karen Marie Fisker Langkjer (kml@mgarkitekter.dk); Mogens Husted Kristensen

Emne: Skærbæk skole - besparelses

Hej Kim

Som opfølgning på besparelses runden har vi forståelse for at kommunen gerne selv vil forestå dele af rådgiverarbejdet, og såfremt de selv forestår rådgivningsydelse vedr. ændringer, herunder ændringer i projekt, tilsyn m.v. påtager de sig samtidig rådgiveransvaret.

Hvis vi skal lave en opretning af eks. Landskabsprojektet vil vi gerne høre herom, dette vil være ekstra og honoreret på medgået tid.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 57
hv@friis-moltke.dk



Aaboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk

[Facebook](#) · [LinkedIn](#)

LYTT Urban & Landscape
Architecture













RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

LYTT Urban & Landscape
Architecture

LYTT Urban & Landscape
Architecture

 FRIIS & MOLTKE
ARCHITECTS

5731496#0 - VS SSK - Tækker, VVS, CTS, forkerte motorventiler

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]
Til: 'hv@friis-moltke.dk' [hv@friis-moltke.dk]; 'Mogens Husted Kristensen' [mhk@friis-moltke.dk]
Cc: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]; Palle Kudsk [PKU@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Ditte Lundgaard Jakobsen [dilja@toender.dk]; Lars-Erik Skydsbjerg [les@toender.dk]; Arne Borum Linnet' [al@fmbyggningsdrift.dk]
Sendt dato: 06-08-2020 14:15
Modtaget Dato: 06-08-2020 14:15
Vedrørende: VS: SSK - Tækker, VVS, CTS, forkerte motorventiler
Vedhæftninger: image001_11.gif
image002_8.gif
image003_1.gif
image005_451.png
image006_112.png
image007_65.png
image008_51.png
image009_48.png
image010_26.jpg

Hej Mogens og Henrik.

Mogens, jeg har lovet at sende denne mail på opfordring af en telefonisk samtale med Henrik og vores møde med Ditte i går.

Vi oplever gentagne gange på pladsen, at Bravida og Jürgensen rejser et flag for mangler i beskrivelsen til CTS, fjernvarme og ved sidste byggemøde også science lokalers gasinstallationer. Efter deres udsagn er disse problemstillinger ikke løst. Der kom ved seneste byggemøde i tirsdags igen en del tekniske forespørgsler, men Tækker mødte ikke op, selvom Henrik har rykket for deres deltagelse.

Iht. CTS er både Bravida og Jürgensen enige om, at der er en masse sorte huller mellem deres entrepriser. Der var aftalt teknikermøde i denne uge, men det er nu udskudt til d. 18 aug. Både Bravida og Jürgensen sagde før ferien, at det er alt for sent med mødet, da vi er vidt i projektet og største delen er monteret. - Det holder derfor ikke, at vi igen skal vente 14 dage. Det vil have økonomiske konsekvenser for bygherre i det omfang, det skal laves om. Både bygherre, entreprenør og byggeledelsen har bedt om afklaring på dette længe. Jeg finder spørgsmål tilbage fra august 2019 på ventiler mv., som stadig er et problem. Vi bliver nervøse når selv byggeledelsen melder om udfordringer angående svar på tekniske spørgsmål.

Iht. til Science lokaler. Jürgensen mener, at det bliver svært at få de videnskabelige lokaler godkendt grundet gasinstallationer etc. - Dette vil fremgå af seneste byggemøde referat.

Iht. til fjernvarme. Jürgensen melder ugentlig til os, at fjernvarme og deraf varmedelen ikke kommer til at fungere ved i ibrugtagelsen. Se nedenstående mail fra Tækker. Deres tilgang er, som jeg læser det, at enten fungerer det eller også fungerer det ikke. Derudover mener Jürgensen, at vi vil sende fjernvarme retur med 60 gr., hvor den burde ligge på 30 gr. Vi har en stærk forventning om, at vi står med en skole, der både er indreguleret og kan tages i brug til december.

Vi ser en stor udfordring tilknyttet de ovenstående punkter både økonomisk og at der ikke er taget hånd om det. Der skulle for lang tid siden have været et teknisk afklaringsmøde, der havde fået manet alle disse usikkerheder til jorden.

Entreprenørerne siger ofte, de ikke får et svar eller et svar i tide. Dette gælder også når de anvender Dalux. Vi har sagt til dem, at de bliver nødt til at skrive en mail, ringe og sende ind på Dalux. - Vi er godt klar over at Tækker siger, at de er i dialog med de forskellige entrepriser, men det er noget andet der bliver meldt ud ved byggemøde og den daglige gang på pladsen.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Kasper Bornstein Larsen <kbl@taekker.dk>

Sendt: 18. juni 2020 15:57

Til: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Thomas Kawaler <tk@jurgensen-vvs.dk>; Morthensen Michael Kenneth (Bravida) <Michael.k.Morthensen@bravida.dk>

Cc: Morten Høier <moh@taekker.dk>

Emne: VS: Skærbæk skole - CTS

5247

Hej alle.

Som I ved har det været oppe at vende at motorventilerne til blandekredsene er leveret i for små størrelser. Nedenfor kommer en redegørelse af situationen. I er meget velkomne til at skrive eller ringe (som nok er mere praktisk) hvis I har spørgsmål til det.

CTS har leveret motorventil til VVS som skal etablere disse i blandekredse, og efterfølgende i gang med at funktionsafprøve og indregulere varmeanlægget.

Motorventilerne har ikke samme dimensioner som anført på principdiagrammer udført af ING. Dette påpeger VVS og de melder ud at de er nødt til at fortsætte arbejdet for at overholde tidsplanen.

Motorventilerne er i en dimension der gør at de kan anvendes til at regulere varmeanlægget, men det er muligt at tryktabet over dem er for stort (grundet at de er mindre end anført). Der kan være 2 udfald af denne situation:

- 1: Varme anlægget virker fint og varmen kan styres som det er tiltænkt.
- 2: Varme anlægget har svært ved at levere varme til dele af varme anlægget grundet at trykket der er tilgængeligt er for lavt.

I tilfælde 2 vil der være behov for at der etableres motorventiler af den rigtige størrelse, eller måske at der etableres trykforøgelse. Det er op til CTS hvordan dette løses, da leverancen af motorventiler er deres ansvar. Jeg synes du skal give mig et kald Michael, da jeg ved at der er ingen som vil eller har brug for at det her bliver mere kompliceret end nødvendigt. Det er klart at der er risiko for at VVS skal udføre noget merarbejde i forbindelse med montering af motorventilerne eller trykforøger.

De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Kasper Bornstein Larsen
Civilingeniør i energi, indeklima, VVS og ventilation
kbl@taekker.dk

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M +45 41711328
T +45 8619 1844

www.taekker.dk





















RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5736140#0 - VS Vedr. aftaleseddel 7, 13, 17, 50, 51 og 52

Fra: Arne Borum Linnet [al@fmbyggningsdrift.dk]
hv@friis-moltke.dk [hv@friis-moltke.dk]; Lars Mathiesen [lm@fmbyggningsdrift.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]; Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Til:
Cc: Palle Kudsk [PKU@toender.dk]; Søren Aaby [saa@fmbyggningsdrift.dk]
Sendt dato: 06-08-2020 14:25
Modtaget Dato: 06-08-2020 14:25
Vedrørende: VS: Vedr. aftaleseddel 7, 13, 17, 50, 51 og 52
Vedhæftninger: aftaleseddel 13.pdf
aftaleseddel 17.pdf
aftaleseddel 50.pdf
aftaleseddel 51.pdf
aftaleseddel 52.pdf
aftaleseddel 7.pdf
SKM_C30820080613440.pdf
image001_261.jpg
image002_890.png

Hej alle

Hermed lidt fra Kraftman på diverse aftalesedler.

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet
Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbyggningsdrift.dk
Web: www.fmbyggningsdrift.dk



Hovedkontor: FM Byggningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige: FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Fra: Jan M. Løper <adm@kraftman.dk>
Sendt: 6. august 2020 13:35
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Emne: Vedr. aftaleseddel 7, 13, 17, 50, 51 og 52

Hej Arne

Jeg har disse aftalesedler hængende, hvoraf 7, 13 og 17 er fra vores sidste møde.

Mht. Aftaleseddel 7, den er blevet korrigeret i forhold til oprindeligt jf. vedhæftede i pdf.
Aftaleseddel 13, den blev godkendt på vores sidste møde i skurvognen.
Aftaleseddel 17, stadig ingen afklaring. Villefrance har arbejdet på den.
Aftaleseddel 50, fastholdes selvom Sune B. har afvist. Henviser til pdf mht. begrundelse.
Aftaleseddel 51, der er rykket for aftaleseddel hos jer. Gør endnu engang opmærksom på 8 ugers leveringstid.
Aftaleseddel 52, mangler aftaleseddel. Godkendt pr. mail

Ovenstående uafklarede aftalesedler udgør i alt tilsammen DKK 447.385,90. Et ikke ubetydeligt tal for Kraftman A/S.

Ovenstående skal medtages på økonomimødet på tirsdag i næste uge.

Med venlig hilsen
KRAFTMAN A/S
Jan M. Løper
Økonomichef

Tlf. 7462 2060 – Mobil 2163 4070

Fax. 7462 2080

www.kraftman.dk



BYGGEPLADS

Skærbæk skole

AFTALESEDDEL

Dato: 20.02.2020 Sagsnummer intern: 18.102
 Løbenummer: 17

Note:

Arbejdets omfang: **Rest vedr. ændring undertag/dampspærre m.v.**

Nr. Tekst	Delpris	Antal	Note:	Kr. excl. moms
Jf. ark				-
				-
				326.358,92
Som vedrører punkt 3, 7 og 12 jf. mail af 20/2 2020				-
Se vedhæftede				-
				-
Reduktion iht. oplæg / arbejds løn				-109.226,72
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Samlet pris excl. moms

kr. 217.132,20

<input type="checkbox"/> Tillæg	<input type="checkbox"/> Fast pris	Afregning efter:	<input type="checkbox"/> Timeløn
<input type="checkbox"/> Fradrag	<input type="checkbox"/> Overslag		<input type="checkbox"/> Materialer
			<input type="checkbox"/> Enhedspriser
			<input type="checkbox"/> Tilbud

For aftalen gælder AB-92 eller AB-forbruger aftale afhængig af projekt materiale og de ved kontakten indgående forbehold, ekstra arbejder udløser tidsfrist forlængelse.

Underskrift bygherre/hovedentreprenør
 Dato:

Underskrift entreprenør
 Henning Skriver
 Kraftman a/s
 20.02.2020

BYGGEPLADS

Skærbæk skole

AFTALESEDDEL

Dato 10.07.2020 Sagsnummer intern 18.102
Løbenummer 50

Note:

Arbejdets omfang: **Afdækning af vindspærre / udføres på opmålt m2**

Nr. Tekst	Delpris	Antal	Note:	Kr. excl. moms
afdækning og lægtesikring				-
afregnet på mængder (foreløbig 2500 m2)				-
Udført med Uv bestandig sort folie				-
Plastfolie Ekstra 6x50 mtr 150 my sort				-
løn og materialer	50,73	2500	m2	126.825,00
Andel af liftimer m/diesel	6,15	2500	m2	15.375,00
Begrundelse: (alle ting ført til referat/ nedfældet i skriv siden jan 2020)				-
Forlængelse af tidsplanen til 15.12.2020				-
manglende afklaring af stormclips				-
Ekstra levering på brandimprægneret underlag (ekstra arbejder)				-
afventning og afklaring træbeklædning, lysninger og inddækninger				-
AB-92 : §12 stk1. : Fornings, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktsmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren				-
				-
				-

Samlet pris excl. moms

kr. 142.200,00

<input checked="" type="checkbox"/> Tillæg	<input type="checkbox"/> Fast pris	Afregning efter:	<input type="checkbox"/> Timeløn
<input type="checkbox"/> Fradrag	<input type="checkbox"/> Overslag		<input type="checkbox"/> Materialer
			<input checked="" type="checkbox"/> Enhedspriser
			<input type="checkbox"/> Tilbud

For aftalen gælder AB-92 eller AB-forbrugeraftale afhængig af projektmateriale og de ved kontakten indgående forbehold, ekstra arbejder udløser tidsfrist forlængelse.

Underskrift bygherre/hovedentreprenør
Dato:

Underskrift entreprenør
Henning Skriver
Kraftman a/s

10.07.2020

BYGGEPLADS

Skærbæk skole

AFTALESEDDEL

Dato 10.07.20

Sagsnummer intern 18.102
Løbenummer 51

Note:

Arbejdets omfang: **Ændring besætning udvendige ståldøre**

Nr. Tekst	Delpris	Antal	Note:	Kr. excl. moms
Denne omhandler ikke indedøre				-
UD.0.012 + 61 + 005 + 006				-
Ikke ændret i forhold til udbud				-
UD.0.011, ny pris beslagsæt 12				8.692,00
pris tilbudsliste beslagsæt 28				-1.630,00
UD.0.026, ny pris beslagsæt 9				10.302,00
pris tilbudsliste beslagsæt 35				-6.051,00
Vi bestiller disse beslagsæt, når aftaleseddel er underskrevet.				-
				-
				-
				-

Samlet pris excl. moms

kr. 11.313,00

<input checked="" type="checkbox"/> Tillæg	<input checked="" type="checkbox"/> Fast pris	Afregning efter:	<input type="checkbox"/> Timeløn
<input type="checkbox"/> Fradrag	<input type="checkbox"/> Overslag		<input type="checkbox"/> Materialer
			<input type="checkbox"/> Enhedspriser
			<input checked="" type="checkbox"/> Tilbud

For aftalen gælder AB-92 eller AB-forbrugeraftale afhængig af projektmateriale og de ved kontakten indgående forbehold, ekstra arbejder udløser tidsfrist forlængelse.

Underskrift bygherre/hovedentreprenør
Dato:

Underskrift entreprenør
Henning Skriver
Kraftman a/s 10.07.20

BYGGEPLADS

Skærbæk skole

AFTALESEDDEL

Dato 04.08.20

Sagsnummer intern 18.102
Løbenummer 52

Note:

Arbejdets omfang: **KS 170 dalux , opbygning af 2 skørter**

Nr. Tekst	Delpris	Antal	Note:	Kr. excl. moms
Mål 110 cm x 250 cm				-
95 stål				-
4 lage gips i alt				-
Isolering				-
Akryl fugemasse rundt				-
Mål 60 cm x 300 cm				-
95 stål				-
4 lag gips i alt				-
Isolering rockwool				-
Brandfugemasse	4.322,00	1		4.322,00
				-
				-
				-
				-
				-

Samlet pris excl. moms

kr. 4.322,00

<input type="checkbox"/> Tillæg	<input type="checkbox"/> Fast pris	Afregning efter:	<input type="checkbox"/> Timeløn
<input type="checkbox"/> Fradrag	<input type="checkbox"/> Overslag		<input type="checkbox"/> Materialer
			<input type="checkbox"/> Enhedspriser
			<input type="checkbox"/> Tilbud

For aftalen gælder AB-92 eller AB-forbrugeraftale afhængig af projektmateriale og de ved kontakten indgående forbehold, ekstra arbejder udløser tidsfrist forlængelse.

Underskrift bygherre/hovedentreprenør
Dato:

Underskrift entreprenør
Henning Skriver
Kraftman a/s 04.08.20

BYGGEPLADS

Skærbæk skole

AFTALESEDDEL

Dato 13.11.2019 Sagsnummer intern 18.102
Løbenummer 7

Note:

Arbejdets omfang: ændringer af vinduer i træ/alu

Nr. Tekst	Delpris	Antal	Note:	Kr. excl. moms
Ekstra sprosser i 51 vinduer	688,15	58		-
Ekstra motor	1.638,00	-3		39.912,70
ekstra fuger og opdelinger	22.420,00	1		-4.914,00
				22.420,00
				-
				-
Ændringer facadetegninger A.1.120 EXA + A2.241 EXA-C				-
19/10 2018 til 2/5 2019.				-
				-
Der tages forbehold for styring og komponenter				-
arkitekt materialer ikke fyldesgørende med zoneopdelinger og tryk				-
ideal combi har kun motor med				-
dette er gældende ved vinduer, ovenlys (blot 2 zoner) og alu/alu facader				-
				-
				-
				-
				-

Samlet pris excl. moms

kr. 57.418,70

<input checked="" type="checkbox"/> Tillæg	<input type="checkbox"/> Fast pris	Afregning efter:	<input type="checkbox"/> Timeløn
<input type="checkbox"/> Fradrag	<input type="checkbox"/> Overslag		<input type="checkbox"/> Materialer
			<input type="checkbox"/> Enhedspriser
			<input checked="" type="checkbox"/> Tilbud

For aftalen gælder AB-92 eller AB-forbruger aftale afhængig af projekt materiale og de ved kontakten indgående forbehold, ekstra arbejder udløser tidsfrist forlængelse.

Underskrift bygherre/hovedentreprenør

Dato:

Underskrift entreprenør

Henning Skriver

Kraftman a/s

13.11.2019

Kunde / Tlf: _____

Sagsnummer: _____

Initialer: _____

Tilbud Overslag Ordre Andet _____

Dato: _____

Tegning Facade, indskalling, mellemtrin

odbud Rev.
A. 1. 120 Ex A

A
19/10-2018

C
2/5-2019

Sydvest Facade
gl. 8 stk.
Ny. 7 stk

spise 6 stk

= 1

|| - indskalling.
gl. 4.
Ny 4.

4 stk

Nordøst indskalling
gl. 6
Ny 6

6 stk.

|| - Mellemtrin
gl. 6
Ny. 6

6 stk.

Nordvest mellemtrin
gl. 6
Ny. 6

2 stk.

Sydøst indskalling
gl. 9.
Ny 9

1.



Kunde / Tlf: _____

Sagsnummer: _____

Initialer: _____

Tilbud Overslag Ordre Andet

Dato: _____

Nordvest Kvec

gl. 1

Ny 1

1.

Nord øst Kvec

gl. 6

Ny 6

Sydøst Færdige Kvec

gl. 1

Ny 1

Nordvest Mellembygning

gl. 7 stk

Ny 6

2 ÷ 1.

Sydøst Mellembygning

gl. 7

Ny 7

1

÷ 2.

Ny-tegning. A.2.241
EX-1.

Sydøst Færdige udskalling

gl. 6 stk

Ny 6 stk.

5.

11 - Cassiopeia

GL 13.

Ny 12

÷ 1.

8

Kunde / Tlf: _____

Sagsnummer: _____
Initialer: _____

Tilbud Overslag Ordre Andet _____

Dato: _____

Nordøst administration Gl. 6 stk Ny 6 stk.	2.
II - vaskering. Gl. 8 stk. Ny 8 stk.	6
Sydøst administration Gl 5 Ny 5	2
Nordvest vaskering. Gl. 5. Ny. 5	3
Sydøst sciencekomme Gl. 1 Ny 1	1
Nordvest - II - Gl. 2 Ny 2	1



FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

5732359#0 - SV:SSK - Tækker, VVS, CTS, forkerte motorventiler

Fra: Mogens Husted Kristensen [mhk@friis-moltke.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Cc: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]; Morten Høier [moh@taekker.dk]; Peter Boe Hauggaard-Nielsen [phn@taekker.dk] [phn@taekker.dk]
Sendt dato: 06-08-2020 14:34
Modtaget Dato: 06-08-2020 14:34
Vedrørende: SV: SSK - Tækker, VVS, CTS, forkerte motorventiler
Vedhæftninger: image004_524.png
image005_527.png
image006_133.png
image007_77.png
image008_58.png
image009_36.jpg
image010.gif
image011.gif
image012.gif

Hej Morten

Tak for din mail. Henrik havde orienteret mig om, at der sikkert kom "noget".

Indholdet ærgrer mig naturligvis, og jeg beder vores underrådgiver om straks at tage hånd om forholdene. Jeg har sat dem og Henrik Villefrance Cc på denne mail. Jeg har ikke sat de øvrige fra din mail cc, går ud fra at det er OK i denne omgang.

Jeg vender hurtigst muligt tilbage.

Venlig hilsen / Kind regards

Mogens Husted Kristensen
Arkitekt MAA, Partner

<image003.jpg>

Direkte / Mobile: (+45) 41 94 70 20 · Hovednummer: (+45) 72 10 00 52

Aarhus: Aaboulevarden 1, DK-8000 Aarhus C
Aalborg: Strandvejen 20, DK-9000 Aalborg

mhk@friis-moltke.dk · www.friis-moltke.dk

[Facebook](#) · [LinkedIn](#)

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 6. august 2020 14:16

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>

Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Ditte Lundgaard Jakobsen <dilja@toender.dk>; Lars-Erik Skydsbjerg <les@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Emne: VS: SSK - Tækker, VVS, CTS, forkerte motorventiler

Hej Mogens og Henrik.

Mogens, jeg har lovet at sende denne mail på opfordring af en telefonisk samtale med Henrik og vores møde med Ditte i går.

Vi oplever gentagne gange på pladsen, at Bravida og Jürgensen rejser et flag for mangler i beskrivelsen til CTS, fjernvarme og ved sidste byggemøde også science lokalers gasinstallationer. Efter deres udsagn er disse problemstillinger ikke løst. Der kom ved seneste byggemøde i tirsdags igen en del tekniske forespørgsler, men Tækker mødte ikke op, selvom Henrik har rykket for deres deltagelse.

Iht. CTS er både Bravida og Jürgensen enige om, at der er en masse sorte huller mellem deres entrepriser. Der var aftalt teknikermøde i denne uge, men det er nu udskudt til d. 18 aug. Både Bravida og Jürgensen sagde før ferien, at det er alt for sent med mødet, da vi er vidt i projektet og største delen er monteret. – Det holder derfor ikke, at vi igen skal vente 14 dage. Det vil have økonomiske konsekvenser for bygherre i det omfang, det skal laves om. Både bygherre, entreprenør og byggeledelsen har bedt om afklaring på dette længe. Jeg finder spørgsmål tilbage fra august 2019 på ventiler mv., som stadig er et problem. Vi bliver nervøse når selv byggeledelsen melder om udfordringer angående svar på tekniske spørgsmål.

Iht. til Science lokaler. Jürgensen mener, at det bliver svært at få de videnskabelige lokaler godkendt grundet gasinstallationer etc. – Dette vil fremgå af seneste byggemøde referat.

Iht. til fjernvarme. Jürgensen melder ugentlig til os, at fjernvarme og deraf varmedelen ikke kommer til at fungere ved i ibrugtagelsen. Se nedenstående mail fra Tækker. Deres tilgang er, som jeg læser det, at enten fungerer det eller også fungerer det ikke. Derudover mener Jürgensen, at vi vil sende fjernvarme retur med 60 gr., hvor den burde ligge på 30 gr. Vi har en stærk forventning om, at vi står med en skole, der både er indreguleret og kan tages i brug til december.

Vi ser en stor udfordring tilknyttet de ovenstående punkter både økonomisk og at der ikke er taget hånd om det. Der skulle for lang tid siden have været et teknisk afklaringsmøde, der havde fået manet alle disse usikkerheder til jorden.

Entreprenørerne siger ofte, de ikke får et svar eller et svar i tide. Dette gælder også når de anvender Dalux. Vi har sagt til dem, at de bliver nødt til at skrive en mail, ringe og sende ind på Dalux. – Vi er godt klar over at Tækker siger, at de er i dialog med de forskellige entrepriser, men det er noget andet der bliver meldt ud ved byggemøde og den daglige gang på pladsen.

5272
Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Kasper Bornstein Larsen <kbl@taekker.dk>

Sendt: 18. juni 2020 15:57

Til: Arne Borum Linnét <al@fmbyggningsdrift.dk>; Thomas Kawaler <tk@jurgensen-vvs.dk>; Morthensen Michael Kenneth (Bravida) <Michael.k.Morthensen@bravida.dk>

Cc: Morten Høier <moh@taekker.dk>

Emne: VS: Skærbæk skole - CTS

Hej alle.

Som I ved har det været oppe at vende at motorventilerne til blandekredsene er leveret i for små størrelser. Nedenfor kommer en redegørelse af situationen. I er meget velkomne til at skrive eller ringe (som nok er mere praktisk) hvis I har spørgsmål til det.

CTS har leveret motorventil til VVS som skal etablere disse i blandekredse, og efterfølgende i gang med at funktionsafprøve og indregulere varmeanlægget.

Motorventilerne har ikke samme dimensioner som anført på principdiagrammer udført af ING. Dette påpeger VVS og de melder ud at de er nødt til at fortsætte arbejdet for at overholde tidsplanen.

Motorventilerne er i en dimension der gør at de kan anvendes til at regulere varmeanlægget, men det er muligt at tryktabet over dem er for stort (grundet at de er mindre end anført). Der kan være 2 udfald af denne situation:

- 1: Varme anlægget virker fint og varmen kan styres som det er tiltænkt.
- 2: Varme anlægget har svært ved at levere varme til dele af varme anlægget grundet at trykket der er tilgængeligt er for lavt.

I tilfælde 2 vil der være behov for at der etableres motorventiler af den rigtige størrelse, eller måske at der etableres trykforøgelse. Det er op til CTS hvordan dette løses, da leverancen af motorventiler er deres ansvar. Jeg synes du skal give mig et kald Michael, da jeg ved at der er ingen som vil eller har brug for at det her bliver mere kompliceret end nødvendigt. Det er klart at der er risiko for at VVS skal udføre noget merarbejde i forbindelse med montering af motorventilerne eller trykforøger.

De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Kasper Bornstein Larsen
Civilingeniør i energi, indeklimateknik, VVS og ventilation
kbl@taekker.dk

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M +45 41711328
T +45 8619 1844

www.taekker.dk





















5732364#0 - SV:SSK - Tækker, VVS, CTS, forkerte motorventiler

Fra: Morten Høier [moh@taekker.dk]
Til: Mogens Husted Kristensen [mhk@friis-moltke.dk];Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Cc: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk];Peter Boe Hauggaard-Nielsen [phn@taekker.dk];Kasper Bornstein Larsen [kbl@taekker.dk]
Sendt dato: 06-08-2020 15:52
Modtaget Dato: 06-08-2020 15:52
Vedrørende: SV: SSK - Tækker, VVS, CTS, forkerte motorventiler
Vedhæftninger: image001_13.gif
image002_10.gif
image003_3.gif
image004_525.png
image005_528.png
image006_134.png
image007_78.png
image008_59.png
image009_37.jpg

Hej Mogens og Morten,

Vi må rykke mødet frem fra d. 18., dette var dog fordi CTS havde mulighed for at deltage her. Vi har desværre ikke mulighed for mødes om formiddagen, men kan mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 14 i næste uge.

@Morten J – Vil du høre entreprenørerne hvornår de har tid, og indkalde til møde?

Vedr. motorventiler, så har vi fulgt op på dette tilbage i juni jf. nedenstående mail, hvor vi også påpeger at CTS ikke har bestilt de rigtige motorventiler – heraf konsekvensen. Kasper beskriver de to udfald der kan være ved at bruge mindre ventiler end projekteret – dette for at fremme processen og at VVS ikke går i stå fordi CTS har bestilt forkerte ventiler. AT VVS er sikre på at det ikke kommer til at virke, må vi så drøfte på mødet og finde en løsning.

Mailen som Kasper sender bliver desuden heller ikke besvaret af entreprenørerne, ligesom at CTS er meget svære at få fat i. De deltog heller ikke på byggemødet hvor vi ellers ville kunne have taget snakken vedr. dette problem, så jeg mener ikke skylden for at det har trukket ud kan påføres os alene.

Derudover kan jeg oplyse at Kasper så sent som i dag har snakket med VVS og spurgt dem om der var noget udestående. Det mente de ikke der var, men jeg kan forstå at de siger noget andet til Jer.

Vedr. byggemødet i tirsdags, så var Kasper desværre syg og jeg kunne ikke nå at deltage – dette er hvad der kan ske, men det er selvfølgelig ærgerligt.

Som jeg påpegede i telefonen mener jeg at ALLE tekniske forespørgsler og mangler fremover oprettes gennem Dalux. Dette er påpeget mange gange og fremgår også af byggemødereferater. Hvis ikke det ligger på Dalux, så anser vi det som rådgiver som at der ikke er et problem. Forhåbentligt kommer alt frem i lyset og ingenting bliver tabt mellem to stole – jeg kan forstå på dig at entreprenørerne melder forskelligt ud til BH og rådgiver.

Mit forslag til en dagsorden for mødet ud fra de problemer du oplister i nedenstående er:

- Fjernvarmeanlæg, herunder
 - Motorventiler
 - Indregulering
 - Gennemgang af tegninger og beskrivelser
- Gasanlæg i science
- Koordinering mellem CTS/VVS
 - Gennemgang af grænsefladeskema og evt. beskrivelse
- Procesventilation (CTS)

Vil I supplere, hvis der er andet som skal tilføjes.

De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M +45 4171 1319
T +45 8619 1844

www.taekker.dk

5283



Fra: Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>

Sendt: 6. august 2020 14:35

Til: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Cc: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>; Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk>

Emne: SV: SSK - Tækker, VVS, CTS, forkerte motorventiler

Hej Morten

Tak for din mail. Henrik havde orienteret mig om, at der sikkert kom "noget".

Indholdet ærgrer mig naturligvis, og jeg beder vores underrådgiver om straks at tage hånd om forholdene. Jeg har sat dem og Henrik Villefrance Cc på denne mail. Jeg har ikke sat de øvrige fra din mail cc, går ud fra at det er OK i denne omgang.

Jeg vender hurtigst muligt tilbage.

Venlig hilsen / Kind regards

Mogens Husted Kristensen
Arkitekt MAA, Partner

<image003.jpg>

Direkte / Mobile: (+45) 41 94 70 20 · Hovednummer: (+45) 72 10 00 52

Aarhus: Aaboulevarden 1, DK-8000 Aarhus C
Aalborg: Strandvejen 20, DK-9000 Aalborg

mhk@friis-moltke.dk · www.friis-moltke.dk

[Facebook](#) · [LinkedIn](#)

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 6. august 2020 14:16

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>

Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Ditte Lundgaard Jakobsen <dilja@toender.dk>; Lars-Erik Skydsbjerg <les@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Emne: VS: SSK - Tækker, VVS, CTS, forkerte motorventiler

Hej Mogens og Henrik.

Mogens, jeg har lovet at sende denne mail på opfordring af en telefonisk samtale med Henrik og vores møde med Ditte i går.

Vi oplever gentagne gange på pladsen, at Bravida og Jürgensen rejser et flag for mangler i beskrivelsen til CTS, fjernvarme og ved sidste byggemøde også science lokalers gasinstallationer. Efter deres udsagn er disse problemstillinger ikke løst. Der kom ved seneste byggemøde i tirsdags igen en del tekniske forespørgsler, men Tækker mødte ikke op, selvom Henrik har rykket for deres deltagelse.

Iht. CTS er både Bravida og Jürgensen enige om, at der er en masse sorte huller mellem deres entrepriser. Der var aftalt teknikermøde i denne uge, men det er nu udskudt til d. 18 aug. Både Bravida og Jürgensen sagde før ferien, at det er alt for sent med mødet, da vi er vidt i projektet og største delen er monteret. – Det holder derfor ikke, at vi igen skal vente 14 dage. Det vil have økonomiske konsekvenser for bygherre i det omfang, det skal laves om. Både bygherre, entreprenør og byggeledelsen har bedt om afklaring på dette længe. Jeg finder spørgsmål tilbage fra august 2019 på ventiler mv., som stadig er et problem. Vi bliver nervøse når selv byggeledelsen melder om udfordringer angående svar på tekniske spørgsmål.

Iht. til Science lokaler. Jürgensen mener, at det bliver svært at få de videnskabelige lokaler godkendt grundet gasinstallationer etc. – Dette vil fremgå af seneste byggemøde referat.

Iht. til fjernvarme. Jürgensen melder ugentlig til os, at fjernvarme og deraf varmedelen ikke kommer til at fungere ved i ibrugtagelsen. Se nedenstående mail fra Tækker. Deres tilgang er, som jeg læser det, at enten fungerer det eller også fungerer det ikke. Derudover mener Jürgensen, at vi vil sende fjernvarme retur med 60 gr., hvor den burde ligge på 30 gr. Vi har en stærk forventning om, at vi står med en skole, der både er indreguleret og kan tages i brug til december.

Vi ser en stor udfordring tilknyttet de ovenstående punkter både økonomisk og at der ikke er taget hånd om det. Der skulle for lang tid siden have været et teknisk afklaringsmøde, der havde fået manet alle disse usikkerheder til jorden.

Entreprenørerne siger ofte, de ikke får et svar eller et svar i tide. Dette gælder også når de anvender Dalux. Vi har sagt til dem, at de bliver nødt til at skrive en mail, ringe og sende ind på Dalux. – Vi er godt klar over at Tækker siger, at de er i dialog med de forskellige entrepriser, men det er noget andet der bliver meldt ud ved byggemøde og den daglige gang på pladsen.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Kasper Bornstein Larsen <kbl@taekker.dk>

Sendt: 18. juni 2020 15:57

Til: Arne Borum Linnét <al@fmbyggningsdrift.dk>; Thomas Kawaler <tk@jurgensen-vvs.dk>; Morthensen Michael Kenneth (Bravida) <Michael.k.Morthensen@bravida.dk>

Cc: Morten Høier <moh@taekker.dk>

Emne: VS: Skærbæk skole - CTS

Hej alle.

Som I ved har det været oppe at vende at motorventilerne til blandekredsene er leveret i for små størrelser. Nedenfor kommer en redegørelse af situationen. I er meget velkomne til at skrive eller ringe (som nok er mere praktisk) hvis I har spørgsmål til det.

CTS har leveret motorventil til VVS som skal etablere disse i blandekredse, og efterfølgende i gang med at funktionsafprøve og indregulere varmeanlægget.

Motorventilerne har ikke samme dimensioner som anført på principdiagrammer udført af ING. Dette påpeger VVS og de melder ud at de er nødt til at fortsætte arbejdet for at overholde tidsplanen.

Motorventilerne er i en dimension der gør at de kan anvendes til at regulere varmeanlægget, men det er muligt at tryktabet over dem er for stort (grundet at de er mindre end anført). Der kan være 2 udfald af denne situation:

1: Varme­anlægget virker fint og varmen kan styres som det er tiltænkt.

2: Varme­anlægget har svært ved at levere varme til dele af varme­anlægget grundet at trykket der er tilgængeligt er for lavt.

I tilfælde 2 vil der være behov for at der etableres motorventiler af den rigtige størrelse, eller måske at der etableres trykforøgelse. Det er op til CTS hvordan dette løses, da leverancen af motorventiler er deres ansvar. Jeg synes du skal give mig et kald Michael, da jeg ved at der er ingen som vil eller har brug for at det her bliver mere kompliceret end nødvendigt. Det er klart at der er risiko for at VVS skal udføre noget merarbejde i forbindelse med montering af motorventilerne eller trykforøger.

De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Kasper Bornstein Larsen
Civilingeniør i energi, indeklima, VVS og ventilation
kbl@taekker.dk

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M +45 41711328
T +45 8619 1844

www.taekker.dk





















RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5732213#0 - SV:SSK - manglende eller forkerte huller i syd

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]
Til: 'Arne Borum Linnet' [al@fmbygningsdrift.dk]
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 07-08-2020 09:28
Modtaget Dato: 07-08-2020 09:28
Vedrørende: SV: SSK - manglende eller forkerte huller i syd
Vedhæftninger: image002_504.png
image003_505.png
image004_507.png
image005_510.png
image006_127.png
image007_150.jpg
image008_56.png

Hej Arne.

Har de et overblik over økonomien på dette?

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Arne Borum Linnet [mailto:al@fmbygningsdrift.dk]
Sendt: 6. august 2020 09:25
Til: Morten Bramstrup Jakobsen; Morten Højer (moh@taekker.dk)
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen
Emne: SSK - manglende eller forkerte huller i syd

Hej Morten og Morten

Jeg ser ingen udvej for ikke at acceptere deres forespørgsel på disse huller til deres føringsvej.

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbygningsdrift.dk
Web: www.fmbygningsdrift.dk



Hovedkontor: FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige: FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Fra: Kjems Flemming (Bravida) <flemming.kjems@bravida.dk>
Sendt: 5. august 2020 13:39
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>

Cc: Christensen Thomas (Bravida) <t.christensen@bravida.dk>

Emne: manglende eller forkerte huller i syd

Hej Arne.

Som aftalt en mail på, at vi får boret de huller som mangler i syd, eller som er forkert boret forhold til vores føringsvej. Vi starter arbejdet i næste uge på en aftaleseddel, hvis vi ikke høre andet er det ok.

Med venlig hilsen

Bravida Danmark A/S

Flemming Kjems

Mobil 25253709

E-mail flemming.kjems@bravida.dk

Jernet 4F

6000 Kolding













RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

5732369#0 - SV: Skærbæk skole: udv. vask ved natur/teknologi

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [mailto:ibl@friis-moltke.dk]
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]
Til: 'Ingri B. Løvsbogen' [ibl@friis-moltke.dk]
Cc: 'Henrik Villefrance' [hv@friis-moltke.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Sendt dato: 07-08-2020 10:38
Modtaget Dato: 07-08-2020 10:38
Vedrørende: SV: Skærbæk skole: udv. vask ved natur/teknologi
Vedhæftninger: image001_164.jpg
image002_522.png
image003_522.png
image004_527.png
image005_530.png
image006_135.png
image007_158.jpg
image011_14.jpg

Hej Ingri.

Vi ser heller ikke rigtig andre muligheder så det accepterer vi, men ingeniøren mangler også at afklare, hvordan de får vand- og afløbsinstallationer derud.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune


Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Ingri B. Løvsbogen [mailto:ibl@friis-moltke.dk]
Sendt: 7. august 2020 09:47
Til: Morten Bramstrup Jakobsen
Cc: Henrik Villefrance; Sune Bundesen; Kim Kirkegaard Sørensen
Emne: Skærbæk skole: udv. vask ved natur/teknologi

Hej Morten,

Vi har blevet opmærksom på at den inderste af de udv. vaske ved natur/teknologi vil komme i karambolage med dør til udv. depot. Er I med på at denne vask fjernes, da depotdør ikke kan flyttes?

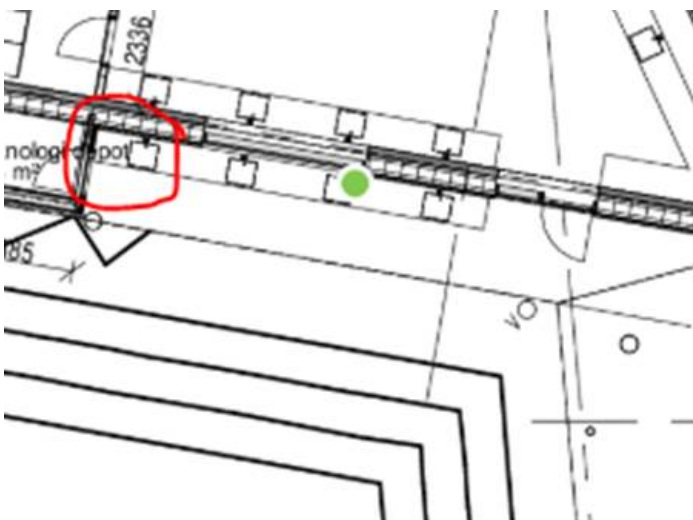

Med venlig hilsen | Kind regards
8364 MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvsbogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ibl@friis-moltke.dk



 **Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail**
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!

Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Sendt: 3. juli 2020 12:26
Til: Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>
Cc: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: SV: Skærbæk skole:

Hej Ingri

De rum du lister op definerer vi som fællesrum.

Venlig hilsen

Sune Bundesen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk



Fra: Ingri B. Løvsbogen [<mailto:ibl@friis-moltke.dk>]
Sendt: 2. juli 2020 13:46
Til: Sune Bundesen
Cc: Henrik Villefrance; Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen
Emne: Skærbæk skole:

Hej Sune,


I forhold til akustikberegninger, vil jeg høre om 0.12 Hjemmeområde Melletrin, samt 0.06 Gruppeniche, 0.07 Stjernen og 0.08 Gruppeniche kan defineres som fællesrum? Eller skal dette regnes som undervisningsrum?
Det er Tækker der spørg, og dette vil have indvirkning på lydkrav på døre.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvsbogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ibl@friis-moltke.dk



 **Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail**
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!

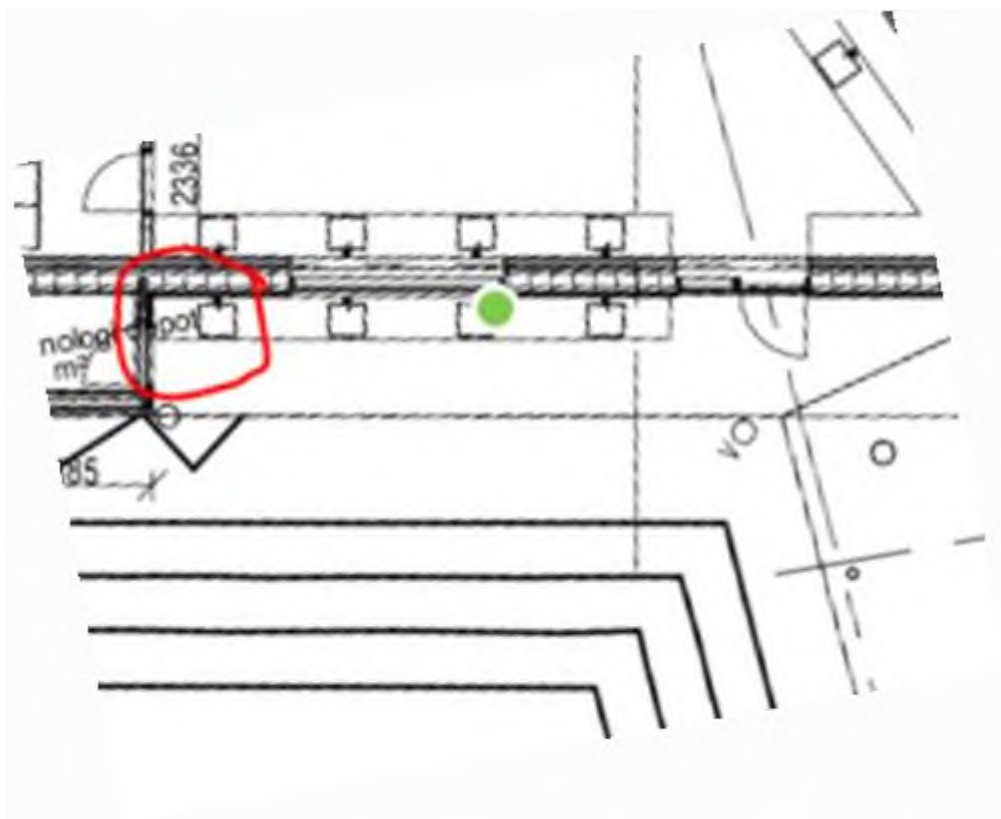













RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

 FRIIS & MOLTKE
ARCHITECTS

5739397#0 - SSK - Økonomien er på den kritiske vej

Fra: Arne Borum Linnet [al@fmbyggningsdrift.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Cc: 'Mogens Husted Kristensen' [mhk@friis-moltke.dk]; Søren Aaby [saa@fmbyggningsdrift.dk]; Lars Mathiesen [lm@fmbyggningsdrift.dk]; Palle Kudsk [PKU@toender.dk]
Sendt dato: 07-08-2020 14:17
Modtaget Dato: 07-08-2020 14:17
Vedrørende: SSK - Økonomien er på den kritiske vej.
Vedhæftninger: Byggebudget revideret 07-08, ABL.xlsx
image001_186.png

Hej Sune m.fl.

Til jeres orientering er vi gået i negativ beløb. Dog skal det siges at vi forventer, at der kommer en besparelse på 1.100.000 kr. fra anlæg ind i budget.

Men jeg synes at det er meget kritisk at restbeløbet er på +600.000 kr., hvis man gør alt ting op.

Pt. har vi et minus på -487.725,53 kr. TK og jeg er langt hen af vejen enige om at budgettet ser sådan her ud (se vedhæftet bilag), lige på nær 3.000 kr.

Det er sker pga. at der er kommet en del punkter på ekstra arbejde, som der er mærket med gult i bilaget.

Som tidligere nævnt ved sidste aconto runde, er det meget vigtigt at der findes en løsning på økonomien. - Håber at vi kan finde en løsning til vores møde på mandag.

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923

Mail: al@fmbyggningsdrift.dk

Web: www.fmbyggningsdrift.dk



Hovedkontor:

FM Byggningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:

FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg



TeamEjendomme - Teknik og Miljø
 Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Byggebudget 04.08.2020 Rev.: 04-08-2020			Byggesag: Ny skærbæk Skole				
Entreprise	Firma navn	Kontrakt sumner	Ekstra arbejder	Udbetalt		CVR-nr Bemærkninger	
1.	Totalrådgiver	Friis & Moltke	9.000.000,00	1.052.525,00	5.702.525,00	56,7%	
2.	Rådgiver	Ekstra byggetid	0,00	0,00	0,00	0,0%	
2.	Rådgiver	---	0,00	0,00	0,00	0,0%	
1.	Råhus	Bo Michelsen	26.091.910,00	1.714.405,35	kr 25.734.375,10	92,5%	ok OBS på fakturering næste gang
2.	Murer	Peter S Nielsen	375.000,00	70.578,00	275.878,00	61,9%	ok
3.	Tømrer	Kraftman	22.397.820,20	3.829.541,81	16.602.971,60	63,3%	ok
4.	Tagdækning	Phenix tag	2.770.600,00	74.603,00	2.636.709,80	92,7%	ok OBS på fakturering næste gang
5.	Smed	---	0,00	0,00	0,00	0,0%	ok
6.	Gulv	Garant Haderslev	1.780.090,00	0,00	0,00	0,0%	ok
7.	Maler	Egon Hofsted & Søn	2.271.993,00	452.153,00	0,00	0,0%	ok
8.	Elektriker	Bravida	9.456.796,00	101.275,00	6.891.463,25	72,1%	ok
9.	Elevator	Bravida	744.000,00	0,00	0,00	0,0%	ok
10.	VVS	Jørgensen VVS	4.322.900,00	563.578,00	1.826.378,00	37,4%	ok
11.	Ventilation	GK Danmark	4.851.800,00	533.550,00	3.949.074,01	73,3%	ok
12.	CTS	Bravida	2.447.585,00	333.978,00	1.676.040,75	60,3%	ok
13.	Gartner/belægning	Mads Vejrup	5.249.709,00	192.778,00	601.216,80	11,9%	ok
14.	Inventar	ST Skoleinventar	2.205.172,00	0,00	0,00	0,0%	ok
Sum af aftaler entreprenører + rådgivere			93.965.375,20	8.533.409,16	65.896.632,31	64,3%	
3.	Bygherre omkostninger		1.855.410,17	0,00	1.688.391,56	91,0%	
3.	Bygherre leverancer		513.735,00	0,00	384.734,00	74,9%	Cykelstativer ca 129.000,- + ADK 254.412,-
4.	Team Ejendomme Honorar		0,00	0,00	0,00	0,0%	
I alt eks. moms			96.334.520,37	8.533.409,16	67.969.757,87	64,8%	

Status	
I alt efter TK har godkendt nyt budget - samlede udgifter	kr. 105.699.089,00
Bevilling	kr. 87.000.000,00
Fremskrivning	kr. 2.800.000,00
Ekstra bevilling	kr. 9.900.000,00
Fremskrivning	kr. 309.089,00
Ekstra bevilling	kr. 7.200.000,00
Besparelse på tid	kr. 880.000,00
Ekstra på rådgiv	kr. 630.000,00
Twist med TØ	kr. 0,00
Samlede udgifter	99,2% kr. 104.867.929,53
Samlede udbetalinger	64,8% kr. 67.969.757,87
Rest anlæg / Uforudsete	29,7% kr. 831.159,47

INTERNET BRUG:
 Uforudsete listen pr 07-08-2020:
 Afsat i budget 831.159,47 kr.
 Fra Uforudsete listen 1.318.885,00 kr.
 I alt 487.725,53 kr.
 Status pr dags dato, 07-08-2020

Versions nr: 3.1.1

Versions dato: 23-08-2016

Print dato: 14-08-2020

RAHUS:		
Reparation Betongulve, estimeret	50.000,00 kr.	SKØN
Dæk på Sciencetårnet	200.000,00 kr.	SKØN
Indeksregulering	???	
TØMRER:		
Sikkerhedsglas ved vinduerne	50.000,00 kr.	SKØN
Stormkroge til Skifferbeklædning	0,00 kr.	Twist
Vinduesskema ændret fra udbud til nyt	0,00 kr.	er i budget
Fradrag for beslagssæt G-L	0,00 kr.	er i budget
Beslagssæt rev G	0,00 kr.	er i budget
Alu-inddækning ved skurene udvendig	kr. 25.000,00	SKØN
BH - indvendige lysninger		
Montering og levering af indvendige lysninger	kr. 375.000,00	SKØN
VVS:		
Ekstra til lydisolering af UV-rør (aftalt 609,- pr lbr)	145.000,00 kr.	Skøn, enhedspris er aftalt
Ventilation:		
Etablering af procesudsugning i tag	3.855,00 kr.	
Ekstra huller til føringsvej i mellembygning	kr. 30.000,00	SKØN
EL:		
Flytning af kabelbakker ifm kollision med vent.-kan	50.000,00 kr.	SKØN
Ekstra huller til føringsvej	kr. 35.000,00	SKØN
CTS:		
Diverse	kr. 40.000,00	SKØN
GULV:		
Ekstra ifm gulvbelægning i Samlingsrum	95.030,00 kr.	Krav fra GU
MALER:		
Leje af stillads ved ovenlys-vinduerne (3 platform	40.000,00 kr.	??
I alt ekstra arb. tilbage fra de 1.400.000		kr. 258.214,00
VINTERFORANSTALTNINGER:		
Interimsopvarmning, manglende opgørelser	180.000,00 kr.	

UFO posterne i alt 1.318.885,00 kr.

Rådgiver Ekstra byggetid kr. 1.400.000,00

Ligger under 1.Totalrådgiver

Ny skærbæk Skole					
Totalrådgiver		Friis & Moltke			
Fordelingsliste nr. 1					
Pos.	Aktivitet/Arbejde	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
1.1	Konkurrenceforslag	200.000,00	100%	kr 200.000,00	kr 0,00
1.2	Dispositionsforslag	1.150.000,00	100%	kr 1.150.000,00	kr 0,00
1.3	Projektforslag	900.000,00	100%	kr 900.000,00	kr 0,00
1.4	Forprojekt	450.000,00	100%	kr 450.000,00	kr 0,00
1.5	Hovedprojekt	3.150.000,00	90%	kr 2.850.000,00	kr 300.000,00
1.6	Udførsel	2.800.000,00		kr 0,00	kr 2.800.000,00
1.7	1 års	175.000,00		kr 0,00	kr 175.000,00
1.8	5 års	175.000,00		kr 0,00	kr 175.000,00
1.9	Totalrådgiver diff. TK 2.792.900	0,00		kr 0,00	kr 0,00
1.10				kr 0,00	kr 0,00
1.11				kr 0,00	kr 0,00
1.12				kr 0,00	kr 0,00
1.13				kr 0,00	kr 0,00
1.14				kr 0,00	kr 0,00
1.15				kr 0,00	kr 0,00
1.16				kr 0,00	kr 0,00
1.17				kr 0,00	kr 0,00
		kr 9.000.000,00	62%	kr 5.550.000,00	kr 3.450.000,00
	Ekstra aftaler				
1-E.01	Nedslag	-500.000,00	70%	kr -350.000,00	kr -150.000,00
1-E.02	Loop og vendeplads	44.775,00	100%	44.775,00	kr 0,00
1-E.03	ADK	17.000,00	100%	17.000,00	kr 0,00
1-E.04	Tilpasning af trafiksituation	68.500,00	100%	68.500,00	kr 0,00
1-E.05	Vejprojekt udenfor projektgrænse	4.350,00	100%	4.350,00	kr 0,00
1-E.06	Ekstra byggetid - rådgiver	1.400.000,00	25%	kr 350.000,00	kr 1.050.000,00
1-E.07	Ekstra gangbro	17.900,00	100%	kr 17.900,00	kr 0,00
1-E.08				kr 0,00	kr 0,00
1-E.09				kr 0,00	kr 0,00
1-E.10				kr 0,00	kr 0,00
1-E.11				kr 0,00	kr 0,00
1-E.12				kr 0,00	kr 0,00
1-E.13				kr 0,00	kr 0,00
1-E.14				kr 0,00	kr 0,00
1-E.15				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
Versions dato: 23-08-2016
Print dato: 14-08-2020

1-E.16				kr 0,00	kr 0,00
1-E.17				kr 0,00	kr 0,00
1-E.18				kr 0,00	kr 0,00
1-E.19				kr 0,00	kr 0,00
1-E.20				kr 0,00	kr 0,00
1-E.21				kr 0,00	kr 0,00
1-E.22				kr 0,00	kr 0,00
1-E.23				kr 0,00	kr 0,00
1-E.24				kr 0,00	kr 0,00
1-E.25				kr 0,00	kr 0,00
1-E.26				kr 0,00	kr 0,00
1-E.27				kr 0,00	kr 0,00
1-E.28				kr 0,00	kr 0,00
1-E.29				kr 0,00	kr 0,00
1-E.30				kr 0,00	kr 0,00
1-E.31				kr 0,00	kr 0,00
1-E.32				kr 0,00	kr 0,00
1-E.33				kr 0,00	kr 0,00
		kr 1.052.525,00	14%	kr 152.525,00	kr 900.000,00

Versions nr: 3.1.1
 Versions dato: 23-08-2016
 Print dato: 14-08-2020

Ny skærbæk Skole					
Rådgiver		Ekstra byggetid			
Fordelingsliste nr. 2					
Pos.	Aktivitet/Arbejde	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
2.1				kr 0,00	kr 0,00
2.2				kr 0,00	kr 0,00
2.3				kr 0,00	kr 0,00
2.4				kr 0,00	kr 0,00
2.5				kr 0,00	kr 0,00
2.6				kr 0,00	kr 0,00
2.7				kr 0,00	kr 0,00
2.8				kr 0,00	kr 0,00
2.9				kr 0,00	kr 0,00
2.10				kr 0,00	kr 0,00
2.11				kr 0,00	kr 0,00
2.12				kr 0,00	kr 0,00
2.13				kr 0,00	kr 0,00
2.14				kr 0,00	kr 0,00
2.15				kr 0,00	kr 0,00
2.16				kr 0,00	kr 0,00
2.17				kr 0,00	kr 0,00
		kr 0,00		kr 0,00	kr 0,00
	Ekstra aftaler				
2E.01				kr 0,00	kr 0,00
2E.02				kr 0,00	kr 0,00
2E.03				kr 0,00	kr 0,00
2E.04				kr 0,00	kr 0,00
2E.05				kr 0,00	kr 0,00
2E.06				kr 0,00	kr 0,00
2E.07				kr 0,00	kr 0,00
2E.08				kr 0,00	kr 0,00
2E.09				kr 0,00	kr 0,00
2E.10				kr 0,00	kr 0,00
2E.11				kr 0,00	kr 0,00
2E.12				kr 0,00	kr 0,00
2E.13				kr 0,00	kr 0,00
2E.14				kr 0,00	kr 0,00
2E.15				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
 Versions dato: 23-08-2016
 Print dato: 14-08-2020

2E.16				kr 0,00	kr 0,00
2E.17				kr 0,00	kr 0,00
2E.18				kr 0,00	kr 0,00
2E.19				kr 0,00	kr 0,00
2E.20				kr 0,00	kr 0,00
2E.21				kr 0,00	kr 0,00
2E.22				kr 0,00	kr 0,00
2E.23				kr 0,00	kr 0,00
2E.24				kr 0,00	kr 0,00
2E.25				kr 0,00	kr 0,00
2E.26				kr 0,00	kr 0,00
2E.27				kr 0,00	kr 0,00
2E.28				kr 0,00	kr 0,00
2E.29				kr 0,00	kr 0,00
2E.30				kr 0,00	kr 0,00
2E.31				kr 0,00	kr 0,00
2E.32				kr 0,00	kr 0,00
2E.33				kr 0,00	kr 0,00
			kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00

Ny skærbæk Skole

Rådgiver ---

Fordelingsliste nr. 2a

Pos.	Aktivitet/Arbejde	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
2a.1				kr 0,00	kr 0,00
2a.2				kr 0,00	kr 0,00
2a.3				kr 0,00	kr 0,00
2a.4				kr 0,00	kr 0,00
2a.5				kr 0,00	kr 0,00
2a.6				kr 0,00	kr 0,00
2a.7				kr 0,00	kr 0,00
2a.8				kr 0,00	kr 0,00
2a.9				kr 0,00	kr 0,00
2a.10				kr 0,00	kr 0,00
2a.11				kr 0,00	kr 0,00
2a.12				kr 0,00	kr 0,00
2a.13				kr 0,00	kr 0,00
2a.14				kr 0,00	kr 0,00
2a.15				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
 Versions dato: 23-08-2016
 Print dato: 14-08-2020

2a.16				kr 0,00	kr 0,00
2a.17				kr 0,00	kr 0,00
		kr 0,00		kr 0,00	kr 0,00
	Ekstra aftaler				
2ae.01	Udlæg			kr 0,00	kr 0,00
2ae.02				kr 0,00	kr 0,00
2ae.03				kr 0,00	kr 0,00
2ae.04				kr 0,00	kr 0,00
2ae.05				kr 0,00	kr 0,00
2ae.06				kr 0,00	kr 0,00
2ae.07				kr 0,00	kr 0,00
2ae.08				kr 0,00	kr 0,00
2ae.09				kr 0,00	kr 0,00
2ae.10				kr 0,00	kr 0,00
2ae.11				kr 0,00	kr 0,00
2ae.12				kr 0,00	kr 0,00
2ae.13				kr 0,00	kr 0,00
2ae.14				kr 0,00	kr 0,00
2ae.15				kr 0,00	kr 0,00
2ae.16				kr 0,00	kr 0,00
2ae.17				kr 0,00	kr 0,00
2ae.18				kr 0,00	kr 0,00
2ae.19				kr 0,00	kr 0,00
2ae.20				kr 0,00	kr 0,00
2ae.21				kr 0,00	kr 0,00
2ae.22				kr 0,00	kr 0,00
2ae.23				kr 0,00	kr 0,00
2ae.24				kr 0,00	kr 0,00
2ae.25				kr 0,00	kr 0,00
2ae.26				kr 0,00	kr 0,00
2ae.27				kr 0,00	kr 0,00
2ae.28				kr 0,00	kr 0,00
2ae.29				kr 0,00	kr 0,00
2ae.30				kr 0,00	kr 0,00
2ae.31				kr 0,00	kr 0,00
2ae.32				kr 0,00	kr 0,00
2ae.33				kr 0,00	kr 0,00
		kr 0,00		kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
 Versions dato: 23-08-2016
 Print dato: 14-08-2020

Ny skærbæk Skole

Bygherre **Rev.: 04-08-2020**

Brugerdata

Dato

Pejling				
Bevilling	TE honorar %	TE honorar	Gennemsnits time	antal timer
2.800.000,00	0,00%	0,00	0,00	#DIV/0!

Timepris	Timeforbrug Forventet													Planlagt forbrug	
	År	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Sept.	Oktober	Nov.	Dec.	timer	kr.
kr. 0	2016													0,00	0,00
kr. 0	2017													0,00	0,00
kr. 0	2018													0,00	0,00
kr. 0	2019													0,00	0,00
kr. 0	2020													0,00	0,00
I alt														0,00	0,00

Timepris	Timeforbrug Reelt (brugerdata)													Forbrug	
	År	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Sept.	Oktober	Nov.	Dec.	timer	kr.
kr. 0	2016													0,00	0,00
kr. 0	2017													0,00	0,00
kr. 0	2018													0,00	0,00
kr. 0	2019													0,00	0,00
kr. 0	2020													0,00	0,00
I alt														0,00	0,00

Forventet slut				
Bevilling	TE honorar %	TE honorar	Gennemsnits time	antal timer
2.800.000,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00

4.	Team Ejendomme Honorar	kr. 0,00		kr. 0,00	kr. 0,00
----	------------------------	----------	--	----------	----------

Versions nr: 3.1.1

Versions dato: 23-08-2016

Print dato: 14-08-2020

Ny skærbæk Skole					
Entrep. Råhus		Bo Michelsen			
Fordelingsliste A					
Pos.	Aktivitet/Arbejde	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
A.01	Aconto nr 01	953.572,10	100%	kr 953.572,10	kr 0,00
A.02	Aconto nr 02	1.392.972,75	100%	kr 1.392.972,75	kr 0,00
A.03	Aconto nr 03	3.201.836,22	100%	kr 3.201.836,22	kr 0,00
A.04	Aconto nr 04	1.343.349,41	100%	kr 1.343.349,41	kr 0,00
A.05	Aconto nr 05	3.772.617,65	100%	kr 3.772.617,65	kr 0,00
A.06	Aconto nr 06	5.988.003,46	100%	kr 5.988.003,46	kr 0,00
A.07	Aconto nr 07	2.138.899,45	100%	kr 2.138.899,45	kr 0,00
A.08	Aconto nr 08	1.631.897,21	100%	kr 1.631.897,21	kr 0,00
A.09	Aconto nr 09	539.808,45	100%	kr 539.808,45	kr 0,00
A.10	Aconto nr 10	422.880,00	100%	kr 422.880,00	kr 0,00
A.11	Aconto nr 11	483.400,00	100%	kr 483.400,00	kr 0,00
A.12	Aconto nr 12	798.849,72	100%	kr 798.849,72	kr 0,00
A.13	Aconto nr 13	734.833,33	100%	kr 734.833,33	kr 0,00
A.14	Aconto nr 14	617.050,00	100%	kr 617.050,00	kr 0,00
A.15				kr 0,00	kr 0,00
A.16				kr 0,00	kr 0,00
A.17				kr 0,00	kr 0,00
A.18				kr 0,00	kr 0,00
A.19				kr 0,00	kr 0,00
A.20				kr 0,00	kr 0,00
A.21				kr 0,00	kr 0,00
A.22				kr 0,00	kr 0,00
A.23				kr 0,00	kr 0,00
A.24				kr 0,00	kr 0,00
A.25				kr 0,00	kr 0,00
A.26				kr 0,00	kr 0,00
A.27				kr 0,00	kr 0,00
A.28				kr 0,00	kr 0,00
A.29				kr 0,00	kr 0,00
A.30				kr 0,00	kr 0,00
A.31				kr 0,00	kr 0,00
A.32				kr 0,00	kr 0,00
A.33				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1

Versions dato: 23-08-2016

Print dato: 14-08-2020

A.34				kr 0,00	kr 0,00
A.35				kr 0,00	kr 0,00
A.36				kr 0,00	kr 0,00
A.37				kr 0,00	kr 0,00
A.38				kr 0,00	kr 0,00
A.39				kr 0,00	kr 0,00
A.40				kr 0,00	kr 0,00
A.41				kr 0,00	kr 0,00
A.42				kr 0,00	kr 0,00
A.43				kr 0,00	kr 0,00
A.44				kr 0,00	kr 0,00
A.45				kr 0,00	kr 0,00
A.46				kr 0,00	kr 0,00
A.47				kr 0,00	kr 0,00
A.48				kr 0,00	kr 0,00
A.49				kr 0,00	kr 0,00
A.50				kr 0,00	kr 0,00
A.51				kr 0,00	kr 0,00
			kr 24.019.969,75	100%	kr 24.019.969,75
					kr 0,00

Ny skærbæk Skole

Entrep. **Råhus** **Bo Michelsen**

Fordelingsliste AE

Pos.	Ekstraarbejder	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
AE.01	Toiletvogn ved 1. spadestik	3.780,00	100%	kr 3.780,00	kr 0,00
AE.02	Bortskaffelse af jord og flytning	93.185,00	100%	kr 93.185,00	kr 0,00
AE.03	Vildthejn ved byggeplads	44.100,00	100%	kr 44.100,00	kr 0,00
AE.04	Bortskaffelse af affaldsjord fra jordbunke	109.500,00	100%	kr 109.500,00	kr 0,00
AE.05	Mindre udgravning + sandpude ifm værft	-13.220,48	100%	kr -13.220,48	kr 0,00
AE.06	Fradrag for udgået stål i facadekonstr.	-377.500,00	100%	kr -377.500,00	kr 0,00
AE.07	Ekstra byggepladsveje + byggehegn	124.720,00	100%	kr 124.720,00	kr 0,00
AE.08	Leje af stålplader (570,- / døgn)	570,00	100%	kr 570,00	kr 0,00
AE.09	Fradrag for andel af Byggepladsskilt	-922,00	100%	kr -922,00	kr 0,00
AE.10	Byggepladsdrift, Juni 2019	6.400,00	100%	kr 6.400,00	kr 0,00
AE.11	Tilgået trappefundament	9.819,00	100%	kr 9.819,00	kr 0,00
AE.12	Byggepladsdrift, Juli 2019	14.260,00	100%	kr 14.260,00	kr 0,00
AE.13	Vigepladser på Midl. Tilkørselsvej	4.425,00	100%	kr 4.425,00	kr 0,00
AE.14	Ændring af isolering i terrændæk	88.292,49	75%	kr 66.219,37	kr 22.073,12

Versions nr: 3.1.1

Versions dato: 23-08-2016

Print dato: 14-08-2020

AE.15	Byggepladsdrift, August 2019	23.146,06	100%	kr 23.146,06	kr 0,00
AE.16	Byggepladsdrift, September 2019	39.658,44	100%	kr 39.658,44	kr 0,00
AE.17	Ekstra dækelementer i Udeværksted	19.955,00	100%	kr 19.955,00	kr 0,00
AE.18	Fradrag for facade-stålsøjler/fundamente	-53.220,00	100%	kr -53.220,00	kr 0,00
AE.19	El-indstøbning i trappe-element	18.457,50	100%	kr 18.457,50	kr 0,00
AE.20	Byggepladsdrift for Oktober 2019	56.231,11	100%	kr 56.231,11	kr 0,00
AE.21	Byggepladsdrift for November 2019	53.551,62	100%	kr 53.551,62	kr 0,00
AE.22	Ekstra stålbjælke SB022	4.400,00	100%	kr 4.400,00	kr 0,00
AE.23	UDGÅET	0,00		kr 0,00	kr 0,00
AE.24	Byggepladsveje udført dec 2019	469.710,00	100%	kr 469.710,00	kr 0,00
AE.25	Diverse skæringer og borer	21.062,50	100%	kr 21.062,50	kr 0,00
AE.26	UDGÅET			kr 0,00	kr 0,00
AE.27	Byggepladsdrift December 2019	34.949,22	100%	kr 34.949,22	kr 0,00
AE.28	Ekstra-arbejder , Stål	52.687,50	100%	kr 52.687,50	kr 0,00
AE.29	Omprojektering, ventilation i elementer	34.500,00	100%	kr 34.500,00	kr 0,00
AE.30	Byggepladsdrift, januar 2020	37.401,92	100%	kr 37.401,92	kr 0,00
AE.31	Ekstra ifm AE24 , byggepladsveje	9.240,00	100%	kr 9.240,00	kr 0,00
AE.32	Byggepladsdrift, februar 2020	44.938,89	100%	kr 44.938,89	kr 0,00
AE.33	Genopsætning af adgangstårn, mellem	18.700,00	50%	kr 9.350,00	kr 9.350,00
AE.34	Stål, ekstraarbejder	49.900,00	100%	kr 49.900,00	kr 0,00
AE.35	Byggepladsdrift, marts 2020	45.463,41	100%	kr 45.463,41	kr 0,00
AE.36	Stål-ændringer på Science-tårnet	103.513,00	100%	kr 103.513,00	kr 0,00
AE.37	Byggepladsdrift, april 2020	43.827,74	100%	kr 43.827,74	kr 0,00
AE.38	5 ekstra indstøbte el-dåser i betonvæg	9.000,00	100%	kr 9.000,00	kr 0,00
AE.39	Udgår	0,00		kr 0,00	kr 0,00
AE.40	BP-Arbejder iht AMK-B `s instrukser			kr 0,00	kr 0,00
AE.41	BP-Drift for maj 2020	39.851,44	100%	kr 39.851,44	kr 0,00
AE.42	Forlænget BP-drift til 15-12-2020	344.256,78		kr 0,00	kr 344.256,78
AE.43	Indeksregulering, juni 2020			kr 0,00	kr 0,00
AE.44	Flytning af 24 stk el-dåser i betonvægge	41.745,00		kr 0,00	kr 41.745,00
AE.45	BP Drift juni 2020	35.569,21		kr 0,00	kr 35.569,21
AE.46	Lukning af huller i vægge, 135 stk v gulv	8.500,00		kr 0,00	kr 8.500,00
AE.47				kr 0,00	kr 0,00
AE.48				kr 0,00	kr 0,00
AE.49				kr 0,00	kr 0,00
AE.50				kr 0,00	kr 0,00
AE.51				kr 0,00	kr 0,00
		kr 1.714.405,35	73%	kr 1.252.911,24	kr 461.494,11

Versions nr: 3.1.1
Versions dato: 23-08-2016
Print dato: 14-08-2020

Ny skærbæk Skole					
Entrep. Murer		Peter S Nielsen			
Fordelingsliste B					
Pos.	Aktivitet/Arbejde	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
B.01	Aconto nr 01	152.100,00	100%	kr 152.100,00	kr 0,00
B.02	Aconto nr 02	65.700,00	100%	kr 65.700,00	kr 0,00
B.03	Aconto nr 03	14.000,00	100%	kr 14.000,00	kr 0,00
B.04				kr 0,00	kr 0,00
B.05				kr 0,00	kr 0,00
B.06				kr 0,00	kr 0,00
B.07				kr 0,00	kr 0,00
B.08				kr 0,00	kr 0,00
B.09				kr 0,00	kr 0,00
B.10				kr 0,00	kr 0,00
B.11				kr 0,00	kr 0,00
B.12				kr 0,00	kr 0,00
B.13				kr 0,00	kr 0,00
B.14				kr 0,00	kr 0,00
B.15				kr 0,00	kr 0,00
B.16				kr 0,00	kr 0,00
B.17				kr 0,00	kr 0,00
B.18				kr 0,00	kr 0,00
B.19				kr 0,00	kr 0,00
B.20				kr 0,00	kr 0,00
B.21				kr 0,00	kr 0,00
B.22				kr 0,00	kr 0,00
B.23				kr 0,00	kr 0,00
B.24				kr 0,00	kr 0,00
B.25				kr 0,00	kr 0,00
B.26				kr 0,00	kr 0,00
B.27				kr 0,00	kr 0,00
B.28				kr 0,00	kr 0,00
B.29				kr 0,00	kr 0,00
B.30				kr 0,00	kr 0,00
B.31				kr 0,00	kr 0,00
B.32				kr 0,00	kr 0,00
B.33				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1

Versions dato: 23-08-2016

Print dato: 14-08-2020

B.34				kr 0,00	kr 0,00
B.35				kr 0,00	kr 0,00
B.36				kr 0,00	kr 0,00
B.37				kr 0,00	kr 0,00
B.38				kr 0,00	kr 0,00
B.39				kr 0,00	kr 0,00
B.40				kr 0,00	kr 0,00
B.41				kr 0,00	kr 0,00
B.42				kr 0,00	kr 0,00
B.43				kr 0,00	kr 0,00
B.44				kr 0,00	kr 0,00
B.45				kr 0,00	kr 0,00
B.46				kr 0,00	kr 0,00
B.47				kr 0,00	kr 0,00
B.48				kr 0,00	kr 0,00
B.49				kr 0,00	kr 0,00
B.50				kr 0,00	kr 0,00
B.51				kr 0,00	kr 0,00
			kr 231.800,00	100%	kr 231.800,00
					kr 0,00

Ny skærbæk Skole
 Entrep. **Murer** **Peter S Nielsen**

Fordelingsliste BE

Pos.	Ekstraarbejder	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
BE.01	Fradrag for andel af byggepladsskilt	-922,00	100%	kr -922,00	kr 0,00
BE.02	Tillæg for ekstra ifm letklinkerblokke	45.000,00	100%	kr 45.000,00	kr 0,00
BE.03	Montering af ekstra porebetonblokke	26.500,00		kr 0,00	kr 26.500,00
BE.04				kr 0,00	kr 0,00
BE.05				kr 0,00	kr 0,00
BE.06				kr 0,00	kr 0,00
BE.07				kr 0,00	kr 0,00
BE.08				kr 0,00	kr 0,00
BE.09				kr 0,00	kr 0,00
BE.10				kr 0,00	kr 0,00
BE.11				kr 0,00	kr 0,00
BE.12				kr 0,00	kr 0,00
BE.13				kr 0,00	kr 0,00
BE.14				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
Versions dato: 23-08-2016
Print dato: 14-08-2020

BE.15				kr 0,00	kr 0,00
BE.16				kr 0,00	kr 0,00
BE.17				kr 0,00	kr 0,00
BE.18				kr 0,00	kr 0,00
BE.19				kr 0,00	kr 0,00
BE.20				kr 0,00	kr 0,00
BE.21				kr 0,00	kr 0,00
BE.22				kr 0,00	kr 0,00
BE.23				kr 0,00	kr 0,00
BE.24				kr 0,00	kr 0,00
BE.25				kr 0,00	kr 0,00
BE.26				kr 0,00	kr 0,00
BE.27				kr 0,00	kr 0,00
BE.28				kr 0,00	kr 0,00
BE.29				kr 0,00	kr 0,00
BE.30				kr 0,00	kr 0,00
BE.31				kr 0,00	kr 0,00
BE.32				kr 0,00	kr 0,00
BE.33				kr 0,00	kr 0,00
BE.34				kr 0,00	kr 0,00
BE.35				kr 0,00	kr 0,00
BE.36				kr 0,00	kr 0,00
BE.37				kr 0,00	kr 0,00
BE.38				kr 0,00	kr 0,00
BE.39				kr 0,00	kr 0,00
BE.40				kr 0,00	kr 0,00
BE.41				kr 0,00	kr 0,00
BE.42				kr 0,00	kr 0,00
BE.43				kr 0,00	kr 0,00
BE.44				kr 0,00	kr 0,00
BE.45				kr 0,00	kr 0,00
BE.46				kr 0,00	kr 0,00
BE.47				kr 0,00	kr 0,00
BE.48				kr 0,00	kr 0,00
BE.49				kr 0,00	kr 0,00
BE.50				kr 0,00	kr 0,00
BE.51				kr 0,00	kr 0,00
		kr 70.578,00	62%	kr 44.078,00	kr 26.500,00

Versions nr: 3.1.1
 Versions dato: 23-08-2016
 Print dato: 14-08-2020

Ny skærbæk Skole					
Entrep. Tømrer		Kraftman			
Fordelingsliste C					
Pos.	Aktivitet/Arbejde	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
C.01	Aconto nr 01	811.974,93	100%	kr 811.974,93	kr 0,00
C.02	Aconto nr 02	1.331.101,53	100%	kr 1.331.101,53	kr 0,00
C.03	Aconto nr 03	858.126,39	100%	kr 858.126,39	kr 0,00
C.04	Aconto nr 04	1.455.692,51	100%	kr 1.455.692,51	kr 0,00
C.05	Aconto nr 05	1.901.669,78	100%	kr 1.901.669,78	kr 0,00
C.06	Aconto nr 06	1.866.943,44	100%	kr 1.866.943,44	kr 0,00
C.07	Aconto nr 07	1.861.800,14	100%	kr 1.861.800,14	kr 0,00
C.08	Aconto nr 08	1.303.953,30	100%	kr 1.303.953,30	kr 0,00
C.09	Aconto nr 09	1.037.575,89	100%	kr 1.037.575,89	kr 0,00
C.10	Aconto nr 10	1.085.673,50	100%	kr 1.085.673,50	kr 0,00
C.11				kr 0,00	kr 0,00
C.12				kr 0,00	kr 0,00
C.13				kr 0,00	kr 0,00
C.14				kr 0,00	kr 0,00
C.15				kr 0,00	kr 0,00
C.16				kr 0,00	kr 0,00
C.17				kr 0,00	kr 0,00
C.18				kr 0,00	kr 0,00
C.19				kr 0,00	kr 0,00
C.20				kr 0,00	kr 0,00
C.21				kr 0,00	kr 0,00
C.22				kr 0,00	kr 0,00
C.23				kr 0,00	kr 0,00
C.24				kr 0,00	kr 0,00
C.25				kr 0,00	kr 0,00
C.26				kr 0,00	kr 0,00
C.27				kr 0,00	kr 0,00
C.28				kr 0,00	kr 0,00
C.29				kr 0,00	kr 0,00
C.30				kr 0,00	kr 0,00
C.31				kr 0,00	kr 0,00
C.32				kr 0,00	kr 0,00
C.33				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
 Versions dato: 23-08-2016
 Print dato: 14-08-2020

C.34				kr 0,00	kr 0,00
C.35				kr 0,00	kr 0,00
C.36				kr 0,00	kr 0,00
C.37				kr 0,00	kr 0,00
C.38				kr 0,00	kr 0,00
C.39				kr 0,00	kr 0,00
C.40				kr 0,00	kr 0,00
C.41				kr 0,00	kr 0,00
C.42				kr 0,00	kr 0,00
C.43				kr 0,00	kr 0,00
C.44				kr 0,00	kr 0,00
C.45				kr 0,00	kr 0,00
C.46				kr 0,00	kr 0,00
C.47				kr 0,00	kr 0,00
C.48				kr 0,00	kr 0,00
C.49				kr 0,00	kr 0,00
C.50				kr 0,00	kr 0,00
C.51				kr 0,00	kr 0,00
			kr 13.514.511,41	100%	kr 13.514.511,41

kr 13.514.511,41 100% kr 13.514.511,41 kr 0,00

Ny skærbæk Skole

Entrep. **Tømrer** **Kraftman**

Fordelingsliste CE

Pos.	Ekstraarbejder	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
CE.01	Interimslukninger, Nordbygning	130.000,00	100%	kr 130.000,00	kr 0,00
CE.02	Ændringer på lofter	112.676,00	100%	kr 112.676,00	kr 0,00
CE.03	Montering af gips med tilbagegang	27.300,00	100%	kr 27.300,00	kr 0,00
CE.04	Montering af stålskelet med tilbagegang	21.177,00	100%	kr 21.177,00	kr 0,00
CE.05	Demontage af interimslukninger	26.500,00	100%	kr 26.500,00	kr 0,00
CE.06	Forsinket opstart på udv arbejder	200.000,00	100%	kr 200.000,00	kr 0,00
CE.07	Ekstra inddækninger på tag og facader	38.448,00	90%	kr 34.603,20	kr 3.844,80
CE.10	Alunæse ved knæk i facader	20.480,00	85%	kr 17.408,00	kr 3.072,00
CE.09	Fejl i facadekonstr. Efter montage	672.533,85	100%	kr 672.533,85	kr 0,00
CE.08	Ændret facadekonstruktion ift brand	932.481,75	100%	kr 932.481,75	kr 0,00
CE.11	Interimslukninger, Sydbygning	67.300,00	100%	kr 67.300,00	kr 0,00
CE.12	Montagebeslag ved stort alupart	10.340,00	100%	kr 10.340,00	kr 0,00
CE.13	Diverse	98.187,00	100%	kr 98.187,00	kr 0,00
CE.14	Tilbagegang ved gipsvægge, Nord stuen	21.919,00	100%	kr 21.919,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1

Versions dato: 23-08-2016

Print dato: 14-08-2020

CE.15	Støbeforskallingsarbejder u/vinduer	12.935,00	100%	kr 12.935,00	kr 0,00
CE.16	Opbygning ved vent-hætter sydbygning	5.265,00	100%	kr 5.265,00	kr 0,00
CE.17	Beslag til alupartier i mellebygning	21.714,00	100%	kr 21.714,00	kr 0,00
CE.18	Levering og montering af stormclips	271.560,19	80%	kr 217.248,15	kr 54.312,04
CE.19	2 ekstra ovenlys-styrecentraler	10.400,00		kr 0,00	kr 10.400,00
CE.20	Resterende punkter ifm facadearbejder	217.132,20		kr 0,00	kr 217.132,20
CE.21	Vægge m.m. ændret ift tilbud	44.427,90	100%	kr 44.427,90	kr 0,00
CE.22	Dørskema rev G	61.947,00	100%	kr 61.947,00	kr 0,00
CE.23	Vinduesskema ændret fra udbud til nyt	25.494,00		kr 0,00	kr 25.494,00
CE.24	Beslagssæt rev G	17.941,00		kr 0,00	kr 17.941,00
CE.25	Fradrag for beslagssæt G-L	-19.106,00		kr 0,00	kr -19.106,00
CE.26	Ekstra alu-afslutninger ved vinduer	19.830,00	100%	kr 19.830,00	kr 0,00
CE.27	Generelt, nye tegninger	6.850,00	100%	kr 6.850,00	kr 0,00
CE.28	Udgår ??	0,00		kr 0,00	kr 0,00
CE.29	Omygning ved huller i 1.17 + 1.22	34.170,00	10%	kr 3.417,00	kr 30.753,00
CE.30	Lysninger Alupartier	43.875,00		kr 0,00	kr 43.875,00
CE.31	Lameller i nicher rum 0.09-0.11/.45-.47 ??			kr 0,00	kr 0,00
CE.32	Udgår ??			kr 0,00	kr 0,00
CE.33	Døre til skure, males sorte	11.050,00	100%	kr 11.050,00	kr 0,00
CE.34	Skillevæg Nord ud mod Krea-lommen	19.087,50	100%	kr 19.087,50	kr 0,00
CE.35	Fjernelse af spær + tag , modul 7-F	5.875,00	100%	kr 5.875,00	kr 0,00
CE.36	Fælles stillads i 3 trappehuller	28.102,00		kr 0,00	kr 28.102,00
CE.37	Fjernelse af spær + tag, Sciencelommen	5.875,00	100%	kr 5.875,00	kr 0,00
CE.38	Opgradering af underlag for band	96.834,07	80%	kr 77.467,26	kr 19.366,81
CE.39	Tillægspris ifm byg.-del 377004	216.078,20	50%	kr 108.039,10	kr 108.039,10
CE.40	Tillægspris ifm byg.-del 317009	97.180,80	50%	kr 48.590,40	kr 48.590,40
CE.41	Tidsfristforlængelse til 15-12-2020	185.000,00	20%	kr 37.000,00	kr 148.000,00
CE.42	Lukning af Huller for EL	6.326,35	80%	kr 5.061,08	kr 1.265,27
CE.43	Gipskasser ved toiletter	4.355,00	100%	kr 4.355,00	kr 0,00
CE.44				kr 0,00	kr 0,00
CE.45				kr 0,00	kr 0,00
CE.46				kr 0,00	kr 0,00
CE.47				kr 0,00	kr 0,00
CE.48				kr 0,00	kr 0,00
CE.49				kr 0,00	kr 0,00
CE.50				kr 0,00	kr 0,00
CE.51				kr 0,00	kr 0,00
		kr 3.829.541,81	81%	kr 3.088.460,19	kr 741.081,62

Versions nr: 3.1.1
 Versions dato: 23-08-2016
 Print dato: 14-08-2020

Ny skærbæk Skole					
Entrep. Tagdækning		Phønix tag			
Fordelingsliste D					
Pos.	Aktivitet/Arbejde	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
D.01	Aconto nr 01	100.000,00	100%	kr 100.000,00	kr 0,00
D.02	Aconto nr 02	200.000,00	100%	kr 200.000,00	kr 0,00
D.03	Aconto nr 03	290.552,50	100%	kr 290.552,50	kr 0,00
D.04	Aconto nr 04	580.682,00	100%	kr 580.682,00	kr 0,00
D.05	Aconto nr 05	488.049,00	100%	kr 488.049,00	kr 0,00
D.06	Aconto nr 06	172.110,50	100%	kr 172.110,50	kr 0,00
D.07	Aconto nr 07	451.131,50	100%	kr 451.131,50	kr 0,00
D.08	Aconto nr 08	283.436,30	100%	kr 283.436,30	kr 0,00
D.09				kr 0,00	kr 0,00
D.10				kr 0,00	kr 0,00
D.11				kr 0,00	kr 0,00
D.12				kr 0,00	kr 0,00
D.13				kr 0,00	kr 0,00
D.14				kr 0,00	kr 0,00
D.15				kr 0,00	kr 0,00
D.16				kr 0,00	kr 0,00
D.17				kr 0,00	kr 0,00
D.18				kr 0,00	kr 0,00
D.19				kr 0,00	kr 0,00
D.20				kr 0,00	kr 0,00
D.21				kr 0,00	kr 0,00
D.22				kr 0,00	kr 0,00
D.23				kr 0,00	kr 0,00
D.24				kr 0,00	kr 0,00
D.25				kr 0,00	kr 0,00
D.26				kr 0,00	kr 0,00
D.27				kr 0,00	kr 0,00
D.28				kr 0,00	kr 0,00
D.29				kr 0,00	kr 0,00
D.30				kr 0,00	kr 0,00
D.31				kr 0,00	kr 0,00
D.32				kr 0,00	kr 0,00
D.33				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1

Versions dato: 23-08-2016

Print dato: 14-08-2020

D.34				kr 0,00	kr 0,00
D.35				kr 0,00	kr 0,00
D.36				kr 0,00	kr 0,00
D.37				kr 0,00	kr 0,00
D.38				kr 0,00	kr 0,00
D.39				kr 0,00	kr 0,00
D.40				kr 0,00	kr 0,00
D.41				kr 0,00	kr 0,00
D.42				kr 0,00	kr 0,00
D.43				kr 0,00	kr 0,00
D.44				kr 0,00	kr 0,00
D.45				kr 0,00	kr 0,00
D.46				kr 0,00	kr 0,00
D.47				kr 0,00	kr 0,00
D.48				kr 0,00	kr 0,00
D.49				kr 0,00	kr 0,00
D.50				kr 0,00	kr 0,00
D.51				kr 0,00	kr 0,00
			kr 2.565.961,80	100%	kr 2.565.961,80
					kr 0,00

Ny skærbæk Skole
 Entrep. **Tagdækning** **Phønix tag**
 Fordelingsliste DE

Pos.	Ekstraarbejder	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
DE.01	Fradrag for andel af byggepladsskilt	-922,00	100%	kr -922,00	kr 0,00
DE.02	Ekstra ifm udtørring og vandsugning	24.222,50	100%	kr 24.222,50	kr 0,00
DE.03	Ekstra ifm udtørring og vandsugning	17.237,50	100%	kr 17.237,50	kr 0,00
DE.04	Ekstra ifm udtørring og vandsugning	30.210,00	100%	kr 30.210,00	kr 0,00
DE.05	Etablering af procesudsugning i tag	3.855,00		kr 0,00	kr 3.855,00
DE.06				kr 0,00	kr 0,00
DE.07				kr 0,00	kr 0,00
DE.08				kr 0,00	kr 0,00
DE.09				kr 0,00	kr 0,00
DE.10				kr 0,00	kr 0,00
DE.11				kr 0,00	kr 0,00
DE.12				kr 0,00	kr 0,00
DE.13				kr 0,00	kr 0,00
DE.14				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
Versions dato: 23-08-2016
Print dato: 14-08-2020

DE.15				kr 0,00	kr 0,00
DE.16				kr 0,00	kr 0,00
DE.17				kr 0,00	kr 0,00
DE.18				kr 0,00	kr 0,00
DE.19				kr 0,00	kr 0,00
DE.20				kr 0,00	kr 0,00
DE.21				kr 0,00	kr 0,00
DE.22				kr 0,00	kr 0,00
DE.23				kr 0,00	kr 0,00
DE.24				kr 0,00	kr 0,00
DE.25				kr 0,00	kr 0,00
DE.26				kr 0,00	kr 0,00
DE.27				kr 0,00	kr 0,00
DE.28				kr 0,00	kr 0,00
DE.29				kr 0,00	kr 0,00
DE.30				kr 0,00	kr 0,00
DE.31				kr 0,00	kr 0,00
DE.32				kr 0,00	kr 0,00
DE.33				kr 0,00	kr 0,00
DE.34				kr 0,00	kr 0,00
DE.35				kr 0,00	kr 0,00
DE.36				kr 0,00	kr 0,00
DE.37				kr 0,00	kr 0,00
DE.38				kr 0,00	kr 0,00
DE.39				kr 0,00	kr 0,00
DE.40				kr 0,00	kr 0,00
DE.41				kr 0,00	kr 0,00
DE.42				kr 0,00	kr 0,00
DE.43				kr 0,00	kr 0,00
DE.44				kr 0,00	kr 0,00
DE.45				kr 0,00	kr 0,00
DE.46				kr 0,00	kr 0,00
DE.47				kr 0,00	kr 0,00
DE.48				kr 0,00	kr 0,00
DE.49				kr 0,00	kr 0,00
DE.50				kr 0,00	kr 0,00
DE.51				kr 0,00	kr 0,00
		kr 74.603,00	95%	kr 70.748,00	kr 3.855,00

Versions nr: 3.1.1
Versions dato: 23-08-2016
Print dato: 14-08-2020

Ny skærbæk Skole					
Entrep. Smed		---			
Fordelingsliste E					
Pos.	Aktivitet/Arbejde	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
E.01				kr 0,00	kr 0,00
E.02				kr 0,00	kr 0,00
E.03				kr 0,00	kr 0,00
E.04				kr 0,00	kr 0,00
E.05				kr 0,00	kr 0,00
E.06				kr 0,00	kr 0,00
E.07				kr 0,00	kr 0,00
E.08				kr 0,00	kr 0,00
E.09				kr 0,00	kr 0,00
E.10				kr 0,00	kr 0,00
E.11				kr 0,00	kr 0,00
E.12				kr 0,00	kr 0,00
E.13				kr 0,00	kr 0,00
E.14				kr 0,00	kr 0,00
E.15				kr 0,00	kr 0,00
E.16				kr 0,00	kr 0,00
E.17				kr 0,00	kr 0,00
E.18				kr 0,00	kr 0,00
E.19				kr 0,00	kr 0,00
E.20				kr 0,00	kr 0,00
E.21				kr 0,00	kr 0,00
E.22				kr 0,00	kr 0,00
E.23				kr 0,00	kr 0,00
E.24				kr 0,00	kr 0,00
E.25				kr 0,00	kr 0,00
E.26				kr 0,00	kr 0,00
E.27				kr 0,00	kr 0,00
E.28				kr 0,00	kr 0,00
E.29				kr 0,00	kr 0,00
E.30				kr 0,00	kr 0,00
E.31				kr 0,00	kr 0,00
E.32				kr 0,00	kr 0,00
E.33				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
 Versions dato: 23-08-2016
 Print dato: 14-08-2020

E.34				kr 0,00	kr 0,00
E.35				kr 0,00	kr 0,00
E.36				kr 0,00	kr 0,00
E.37				kr 0,00	kr 0,00
E.38				kr 0,00	kr 0,00
E.39				kr 0,00	kr 0,00
E.40				kr 0,00	kr 0,00
E.41				kr 0,00	kr 0,00
E.42				kr 0,00	kr 0,00
E.43				kr 0,00	kr 0,00
E.44				kr 0,00	kr 0,00
E.45				kr 0,00	kr 0,00
E.46				kr 0,00	kr 0,00
E.47				kr 0,00	kr 0,00
E.48				kr 0,00	kr 0,00
E.49				kr 0,00	kr 0,00
E.50				kr 0,00	kr 0,00
E.51				kr 0,00	kr 0,00
			kr 0,00	#DIV/0!	kr 0,00

kr 0,00 #DIV/0! kr 0,00 kr 0,00

Ny skærbæk Skole

Entrep. **Smed** ---

Fordelingsliste EE

Pos.	Ekstraarbejder	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
EE.01				kr 0,00	kr 0,00
EE.02				kr 0,00	kr 0,00
EE.03				kr 0,00	kr 0,00
EE.04				kr 0,00	kr 0,00
EE.05				kr 0,00	kr 0,00
EE.06				kr 0,00	kr 0,00
EE.07				kr 0,00	kr 0,00
EE.08				kr 0,00	kr 0,00
EE.09				kr 0,00	kr 0,00
EE.10				kr 0,00	kr 0,00
EE.11				kr 0,00	kr 0,00
EE.12				kr 0,00	kr 0,00
EE.13				kr 0,00	kr 0,00
EE.14				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
 Versions dato: 23-08-2016
 Print dato: 14-08-2020

EE.15				kr 0,00	kr 0,00
EE.16				kr 0,00	kr 0,00
EE.17				kr 0,00	kr 0,00
EE.18				kr 0,00	kr 0,00
EE.19				kr 0,00	kr 0,00
EE.20				kr 0,00	kr 0,00
EE.21				kr 0,00	kr 0,00
EE.22				kr 0,00	kr 0,00
EE.23				kr 0,00	kr 0,00
EE.24				kr 0,00	kr 0,00
EE.25				kr 0,00	kr 0,00
EE.26				kr 0,00	kr 0,00
EE.27				kr 0,00	kr 0,00
EE.28				kr 0,00	kr 0,00
EE.29				kr 0,00	kr 0,00
EE.30				kr 0,00	kr 0,00
EE.31				kr 0,00	kr 0,00
EE.32				kr 0,00	kr 0,00
EE.33				kr 0,00	kr 0,00
EE.34				kr 0,00	kr 0,00
EE.35				kr 0,00	kr 0,00
EE.36				kr 0,00	kr 0,00
EE.37				kr 0,00	kr 0,00
EE.38				kr 0,00	kr 0,00
EE.39				kr 0,00	kr 0,00
EE.40				kr 0,00	kr 0,00
EE.41				kr 0,00	kr 0,00
EE.42				kr 0,00	kr 0,00
EE.43				kr 0,00	kr 0,00
EE.44				kr 0,00	kr 0,00
EE.45				kr 0,00	kr 0,00
EE.46				kr 0,00	kr 0,00
EE.47				kr 0,00	kr 0,00
EE.48				kr 0,00	kr 0,00
EE.49				kr 0,00	kr 0,00
EE.50				kr 0,00	kr 0,00
EE.51				kr 0,00	kr 0,00
		kr 0,00	#DIV/0!	kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
Versions dato: 23-08-2016
Print dato: 14-08-2020

Ny skærbæk Skole					
Entrep. Gulv		Garant Haderslev			
Fordelingsliste F					
Pos.	Aktivitet/Arbejde	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
F.01				kr 0,00	kr 0,00
F.02				kr 0,00	kr 0,00
F.03				kr 0,00	kr 0,00
F.04				kr 0,00	kr 0,00
F.05				kr 0,00	kr 0,00
F.06				kr 0,00	kr 0,00
F.07				kr 0,00	kr 0,00
F.08				kr 0,00	kr 0,00
F.09				kr 0,00	kr 0,00
F.10				kr 0,00	kr 0,00
F.11				kr 0,00	kr 0,00
F.12				kr 0,00	kr 0,00
F.13				kr 0,00	kr 0,00
F.14				kr 0,00	kr 0,00
F.15				kr 0,00	kr 0,00
F.16				kr 0,00	kr 0,00
F.17				kr 0,00	kr 0,00
F.18				kr 0,00	kr 0,00
F.19				kr 0,00	kr 0,00
F.20				kr 0,00	kr 0,00
F.21				kr 0,00	kr 0,00
F.22				kr 0,00	kr 0,00
F.23				kr 0,00	kr 0,00
F.24				kr 0,00	kr 0,00
F.25				kr 0,00	kr 0,00
F.26				kr 0,00	kr 0,00
F.27				kr 0,00	kr 0,00
F.28				kr 0,00	kr 0,00
F.29				kr 0,00	kr 0,00
F.30				kr 0,00	kr 0,00
F.31				kr 0,00	kr 0,00
F.32				kr 0,00	kr 0,00
F.33				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1

Versions dato: 23-08-2016

Print dato: 14-08-2020

F.34				kr 0,00	kr 0,00
F.35				kr 0,00	kr 0,00
F.36				kr 0,00	kr 0,00
F.37				kr 0,00	kr 0,00
F.38				kr 0,00	kr 0,00
F.39				kr 0,00	kr 0,00
F.40				kr 0,00	kr 0,00
F.41				kr 0,00	kr 0,00
F.42				kr 0,00	kr 0,00
F.43				kr 0,00	kr 0,00
F.44				kr 0,00	kr 0,00
F.45				kr 0,00	kr 0,00
F.46				kr 0,00	kr 0,00
F.47				kr 0,00	kr 0,00
F.48				kr 0,00	kr 0,00
F.49				kr 0,00	kr 0,00
F.50				kr 0,00	kr 0,00
F.51				kr 0,00	kr 0,00
			kr 0,00	#DIV/0!	kr 0,00

Ny skærbæk Skole

Entrep. **Gulv**

Garant Haderslev

Fordelingsliste FE

Pos.	Ekstraarbejder	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
FE.01		0,00		kr 0,00	kr 0,00
FE.02				kr 0,00	kr 0,00
FE.03				kr 0,00	kr 0,00
FE.04				kr 0,00	kr 0,00
FE.05				kr 0,00	kr 0,00
FE.06				kr 0,00	kr 0,00
FE.07				kr 0,00	kr 0,00
FE.08				kr 0,00	kr 0,00
FE.09				kr 0,00	kr 0,00
FE.10				kr 0,00	kr 0,00
FE.11				kr 0,00	kr 0,00
FE.12				kr 0,00	kr 0,00
FE.13				kr 0,00	kr 0,00
FE.14				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
Versions dato: 23-08-2016
Print dato: 14-08-2020

FE.15				kr 0,00	kr 0,00
FE.16				kr 0,00	kr 0,00
FE.17				kr 0,00	kr 0,00
FE.18				kr 0,00	kr 0,00
FE.19				kr 0,00	kr 0,00
FE.20				kr 0,00	kr 0,00
FE.21				kr 0,00	kr 0,00
FE.22				kr 0,00	kr 0,00
FE.23				kr 0,00	kr 0,00
FE.24				kr 0,00	kr 0,00
FE.25				kr 0,00	kr 0,00
FE.26				kr 0,00	kr 0,00
FE.27				kr 0,00	kr 0,00
FE.28				kr 0,00	kr 0,00
FE.29				kr 0,00	kr 0,00
FE.30				kr 0,00	kr 0,00
FE.31				kr 0,00	kr 0,00
FE.32				kr 0,00	kr 0,00
FE.33				kr 0,00	kr 0,00
FE.34				kr 0,00	kr 0,00
FE.35				kr 0,00	kr 0,00
FE.36				kr 0,00	kr 0,00
FE.37				kr 0,00	kr 0,00
FE.38				kr 0,00	kr 0,00
FE.39				kr 0,00	kr 0,00
FE.40				kr 0,00	kr 0,00
FE.41				kr 0,00	kr 0,00
FE.42				kr 0,00	kr 0,00
FE.43				kr 0,00	kr 0,00
FE.44				kr 0,00	kr 0,00
FE.45				kr 0,00	kr 0,00
FE.46				kr 0,00	kr 0,00
FE.47				kr 0,00	kr 0,00
FE.48				kr 0,00	kr 0,00
FE.49				kr 0,00	kr 0,00
FE.50				kr 0,00	kr 0,00
FE.51				kr 0,00	kr 0,00
		kr 0,00	#DIV/0!	kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
Versions dato: 23-08-2016
Print dato: 14-08-2020

Ny skærbæk Skole					
Entrep. Maler		Egon Hofsted & Søn			
Fordelingsliste G					
Pos.	Aktivitet/Arbejde	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
G.01				kr 0,00	kr 0,00
G.02				kr 0,00	kr 0,00
G.03				kr 0,00	kr 0,00
G.04				kr 0,00	kr 0,00
G.05				kr 0,00	kr 0,00
G.06				kr 0,00	kr 0,00
G.07				kr 0,00	kr 0,00
G.08				kr 0,00	kr 0,00
G.09				kr 0,00	kr 0,00
G.10				kr 0,00	kr 0,00
G.11				kr 0,00	kr 0,00
G.12				kr 0,00	kr 0,00
G.13				kr 0,00	kr 0,00
G.14				kr 0,00	kr 0,00
G.15				kr 0,00	kr 0,00
G.16				kr 0,00	kr 0,00
G.17				kr 0,00	kr 0,00
G.18				kr 0,00	kr 0,00
G.19				kr 0,00	kr 0,00
G.20				kr 0,00	kr 0,00
G.21				kr 0,00	kr 0,00
G.22				kr 0,00	kr 0,00
G.23				kr 0,00	kr 0,00
G.24				kr 0,00	kr 0,00
G.25				kr 0,00	kr 0,00
G.26				kr 0,00	kr 0,00
G.27				kr 0,00	kr 0,00
G.28				kr 0,00	kr 0,00
G.29				kr 0,00	kr 0,00
G.30				kr 0,00	kr 0,00
G.31				kr 0,00	kr 0,00
G.32				kr 0,00	kr 0,00
G.33				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1

Versions dato: 23-08-2016

Print dato: 14-08-2020

G.34				kr 0,00	kr 0,00
G.35				kr 0,00	kr 0,00
G.36				kr 0,00	kr 0,00
G.37				kr 0,00	kr 0,00
G.38				kr 0,00	kr 0,00
G.39				kr 0,00	kr 0,00
G.40				kr 0,00	kr 0,00
G.41				kr 0,00	kr 0,00
G.42				kr 0,00	kr 0,00
G.43				kr 0,00	kr 0,00
G.44				kr 0,00	kr 0,00
G.45				kr 0,00	kr 0,00
G.46				kr 0,00	kr 0,00
G.47				kr 0,00	kr 0,00
G.48				kr 0,00	kr 0,00
G.49				kr 0,00	kr 0,00
G.50				kr 0,00	kr 0,00
G.51				kr 0,00	kr 0,00
			kr 0,00	#DIV/0!	kr 0,00

Ny skærbæk Skole
 Entrep. **Maler** **Egon Hofsted & Søn**

Fordelingsliste GE

Pos.	Ekstraarbejder	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
GE.01	Andel af byggepladsskilt	-922,00		kr 0,00	kr -922,00
GE.02	Malerbehandling af ovenlys-lysninger	61.050,00		kr 0,00	kr 61.050,00
GE.03	Malerbehandling på facade-bagvægge	278.025,00		kr 0,00	kr 278.025,00
GE.04	Tidsfristforlængelse til 15-12-2020	114.000,00		kr 0,00	kr 114.000,00
GE.05				kr 0,00	kr 0,00
GE.06				kr 0,00	kr 0,00
GE.07				kr 0,00	kr 0,00
GE.08				kr 0,00	kr 0,00
GE.09				kr 0,00	kr 0,00
GE.10				kr 0,00	kr 0,00
GE.11				kr 0,00	kr 0,00
GE.12				kr 0,00	kr 0,00
GE.13				kr 0,00	kr 0,00
GE.14				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
Versions dato: 23-08-2016
Print dato: 14-08-2020

GE.15				kr 0,00	kr 0,00
GE.16				kr 0,00	kr 0,00
GE.17				kr 0,00	kr 0,00
GE.18				kr 0,00	kr 0,00
GE.19				kr 0,00	kr 0,00
GE.20				kr 0,00	kr 0,00
GE.21				kr 0,00	kr 0,00
GE.22				kr 0,00	kr 0,00
GE.23				kr 0,00	kr 0,00
GE.24				kr 0,00	kr 0,00
GE.25				kr 0,00	kr 0,00
GE.26				kr 0,00	kr 0,00
GE.27				kr 0,00	kr 0,00
GE.28				kr 0,00	kr 0,00
GE.29				kr 0,00	kr 0,00
GE.30				kr 0,00	kr 0,00
GE.31				kr 0,00	kr 0,00
GE.32				kr 0,00	kr 0,00
GE.33				kr 0,00	kr 0,00
GE.34				kr 0,00	kr 0,00
GE.35				kr 0,00	kr 0,00
GE.36				kr 0,00	kr 0,00
GE.37				kr 0,00	kr 0,00
GE.38				kr 0,00	kr 0,00
GE.39				kr 0,00	kr 0,00
GE.40				kr 0,00	kr 0,00
GE.41				kr 0,00	kr 0,00
GE.42				kr 0,00	kr 0,00
GE.43				kr 0,00	kr 0,00
GE.44				kr 0,00	kr 0,00
GE.45				kr 0,00	kr 0,00
GE.46				kr 0,00	kr 0,00
GE.47				kr 0,00	kr 0,00
GE.48				kr 0,00	kr 0,00
GE.49				kr 0,00	kr 0,00
GE.50				kr 0,00	kr 0,00
GE.51				kr 0,00	kr 0,00
		kr 452.153,00	0%	kr 0,00	kr 452.153,00

Versions nr: 3.1.1

Versions dato: 23-08-2016

Print dato: 14-08-2020

Ny skærbæk Skole					
Entrep. Elektriker		Bravida			
Fordelingsliste H					
Pos.	Aktivitet/Arbejde	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
H.01	Aconto nr 01	91.262,80	100%	kr 91.262,80	kr 0,00
H.02	Aconto nr 02	113.081,75	100%	kr 113.081,75	kr 0,00
H.03	Aconto nr 03	164.088,90	100%	kr 164.088,90	kr 0,00
H.04	Aconto nr 04	200.261,90	100%	kr 200.261,90	kr 0,00
H.05	Aconto nr 05	494.997,65	100%	kr 494.997,65	kr 0,00
H.06	Aconto nr 06	771.124,50	100%	kr 771.124,50	kr 0,00
H.07	Aconto nr 07	236.650,00	100%	kr 236.650,00	kr 0,00
H.08	Aconto nr 08	229.534,50	100%	kr 229.534,50	kr 0,00
H.09	Aconto nr 09	412.353,00	100%	kr 412.353,00	kr 0,00
H.10	Aconto nr 10	986.584,75	100%	kr 986.584,75	kr 0,00
H.11	Aconto nr 11	1.423.197,25	100%	kr 1.423.197,25	kr 0,00
H.12	Aconto nr 12	902.915,25	100%	kr 902.915,25	kr 0,00
H.13	Aconto nr 13	764.136,00	100%	kr 764.136,00	kr 0,00
H.14				kr 0,00	kr 0,00
H.15				kr 0,00	kr 0,00
H.16				kr 0,00	kr 0,00
H.17				kr 0,00	kr 0,00
H.18				kr 0,00	kr 0,00
H.19				kr 0,00	kr 0,00
H.20				kr 0,00	kr 0,00
H.21				kr 0,00	kr 0,00
H.22				kr 0,00	kr 0,00
H.23				kr 0,00	kr 0,00
H.24				kr 0,00	kr 0,00
H.25				kr 0,00	kr 0,00
H.26				kr 0,00	kr 0,00
H.27				kr 0,00	kr 0,00
H.28				kr 0,00	kr 0,00
H.29				kr 0,00	kr 0,00
H.30				kr 0,00	kr 0,00
H.31				kr 0,00	kr 0,00
H.32				kr 0,00	kr 0,00
H.33				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1

Versions dato: 23-08-2016

Print dato: 14-08-2020

H.34				kr 0,00	kr 0,00
H.35				kr 0,00	kr 0,00
H.36				kr 0,00	kr 0,00
H.37				kr 0,00	kr 0,00
H.38				kr 0,00	kr 0,00
H.39				kr 0,00	kr 0,00
H.40				kr 0,00	kr 0,00
H.41				kr 0,00	kr 0,00
H.42				kr 0,00	kr 0,00
H.43				kr 0,00	kr 0,00
H.44				kr 0,00	kr 0,00
H.45				kr 0,00	kr 0,00
H.46				kr 0,00	kr 0,00
H.47				kr 0,00	kr 0,00
H.48				kr 0,00	kr 0,00
H.49				kr 0,00	kr 0,00
H.50				kr 0,00	kr 0,00
H.51				kr 0,00	kr 0,00
			kr 6.790.188,25	100%	kr 6.790.188,25
					kr 0,00

Ny skærbæk Skole

Entrep. **Elektriker** **Bravida**

Fordelingsliste AE

Pos.	Ekstraarbejder	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
HE.01	Kamera til byggepladsvisning	6.000,00	100%	kr 6.000,00	kr 0,00
HE.02	Fradrag for andel af byggepladsskilt	-922,00	100%	kr -922,00	kr 0,00
HE.03	Arbejds løn , mont. af udv byggestrøm	6.000,00		kr 0,00	kr 6.000,00
HE.04	Tillæg EU Materiel/Fradrag belysning	-165.100,00		kr 0,00	kr -165.100,00
HE.05	4 Punkter (2 tillæg / 2 fradrag)	-17.135,00		kr 0,00	kr -17.135,00
HE.06	Diverse ekstrainstall. Aftalt med BH	26.236,00		kr 0,00	kr 26.236,00
HE.07	Boringer for el-gennemføringer i vægge	4.768,00		kr 0,00	kr 4.768,00
HE.08	Ændring af føringsveje, nord+syd	16.500,00		kr 0,00	kr 16.500,00
HE.09	Ændring af forsyning til CTS	6.896,00		kr 0,00	kr 6.896,00
HE.10	Interimsvarme i nord + syd	18.500,00		kr 0,00	kr 18.500,00
HE.11	Kabling ifm fejlplac. el-dåser i beton	18.492,00		kr 0,00	kr 18.492,00
HE.12	Ændring af lysinstall.for flugtveje	9.926,00		kr 0,00	kr 9.926,00
HE.13	Tidsfristforlængelse til 15-12-2020	171.114,00		kr 0,00	kr 171.114,00
HE.14				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
Versions dato: 23-08-2016
Print dato: 14-08-2020

HE.15				kr 0,00	kr 0,00
HE.16				kr 0,00	kr 0,00
HE.17				kr 0,00	kr 0,00
HE.18				kr 0,00	kr 0,00
HE.19				kr 0,00	kr 0,00
HE.20				kr 0,00	kr 0,00
HE.21				kr 0,00	kr 0,00
HE.22				kr 0,00	kr 0,00
HE.23				kr 0,00	kr 0,00
HE.24				kr 0,00	kr 0,00
HE.25				kr 0,00	kr 0,00
HE.26				kr 0,00	kr 0,00
HE.27				kr 0,00	kr 0,00
HE.28				kr 0,00	kr 0,00
HE.29				kr 0,00	kr 0,00
HE.30				kr 0,00	kr 0,00
HE.31				kr 0,00	kr 0,00
HE.32				kr 0,00	kr 0,00
HE.33				kr 0,00	kr 0,00
HE.34				kr 0,00	kr 0,00
HE.35				kr 0,00	kr 0,00
HE.36				kr 0,00	kr 0,00
HE.37				kr 0,00	kr 0,00
HE.38				kr 0,00	kr 0,00
HE.39				kr 0,00	kr 0,00
HE.40				kr 0,00	kr 0,00
HE.41				kr 0,00	kr 0,00
HE.42				kr 0,00	kr 0,00
HE.43				kr 0,00	kr 0,00
HE.44				kr 0,00	kr 0,00
HE.45				kr 0,00	kr 0,00
HE.46				kr 0,00	kr 0,00
HE.47				kr 0,00	kr 0,00
HE.48				kr 0,00	kr 0,00
HE.49				kr 0,00	kr 0,00
HE.50				kr 0,00	kr 0,00
HE.51				kr 0,00	kr 0,00
		kr 101.275,00	5%	kr 5.078,00	kr 96.197,00

Versions nr: 3.1.1
Versions dato: 23-08-2016
Print dato: 14-08-2020

Ny skærbæk Skole					
Entrep. Elevator		Bravida			
Fordelingsliste I					
Pos.	Aktivitet/Arbejde	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
I.01				kr 0,00	kr 0,00
I.02				kr 0,00	kr 0,00
I.03				kr 0,00	kr 0,00
I.04				kr 0,00	kr 0,00
I.05				kr 0,00	kr 0,00
I.06				kr 0,00	kr 0,00
I.07				kr 0,00	kr 0,00
I.08				kr 0,00	kr 0,00
I.09				kr 0,00	kr 0,00
I.10				kr 0,00	kr 0,00
I.11				kr 0,00	kr 0,00
I.12				kr 0,00	kr 0,00
I.13				kr 0,00	kr 0,00
I.14				kr 0,00	kr 0,00
I.15				kr 0,00	kr 0,00
I.16				kr 0,00	kr 0,00
I.17				kr 0,00	kr 0,00
I.18				kr 0,00	kr 0,00
I.19				kr 0,00	kr 0,00
I.20				kr 0,00	kr 0,00
I.21				kr 0,00	kr 0,00
I.22				kr 0,00	kr 0,00
I.23				kr 0,00	kr 0,00
I.24				kr 0,00	kr 0,00
I.25				kr 0,00	kr 0,00
I.26				kr 0,00	kr 0,00
I.27				kr 0,00	kr 0,00
I.28				kr 0,00	kr 0,00
I.29				kr 0,00	kr 0,00
I.30				kr 0,00	kr 0,00
I.31				kr 0,00	kr 0,00
I.32				kr 0,00	kr 0,00
I.33				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
 Versions dato: 23-08-2016
 Print dato: 14-08-2020

I.34				kr 0,00	kr 0,00
I.35				kr 0,00	kr 0,00
I.36				kr 0,00	kr 0,00
I.37				kr 0,00	kr 0,00
I.38				kr 0,00	kr 0,00
I.39				kr 0,00	kr 0,00
I.40				kr 0,00	kr 0,00
I.41				kr 0,00	kr 0,00
I.42				kr 0,00	kr 0,00
I.43				kr 0,00	kr 0,00
I.44				kr 0,00	kr 0,00
I.45				kr 0,00	kr 0,00
I.46				kr 0,00	kr 0,00
I.47				kr 0,00	kr 0,00
I.48				kr 0,00	kr 0,00
I.49				kr 0,00	kr 0,00
I.50				kr 0,00	kr 0,00
I.51				kr 0,00	kr 0,00
			kr 0,00	#DIV/0!	kr 0,00

Ny skærbæk Skole

Entrep. **Elevator** **Bravida**

Fordelingsliste IE

Pos.	Ekstraarbejder	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
IE.01				kr 0,00	kr 0,00
IE.02				kr 0,00	kr 0,00
IE.03				kr 0,00	kr 0,00
IE.04				kr 0,00	kr 0,00
IE.05				kr 0,00	kr 0,00
IE.06				kr 0,00	kr 0,00
IE.07				kr 0,00	kr 0,00
IE.08				kr 0,00	kr 0,00
IE.09				kr 0,00	kr 0,00
IE.10				kr 0,00	kr 0,00
IE.11				kr 0,00	kr 0,00
IE.12				kr 0,00	kr 0,00
IE.13				kr 0,00	kr 0,00
IE.14				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1

Versions dato: 23-08-2016

Print dato: 14-08-2020

Ny skærbæk Skole					
Entrep. VVS		Jürgensen VVS			
Fordelingsliste J					
Pos.	Aktivitet/Arbejde	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
J.01	Aconto nr 01	101.000,00	100%	kr 101.000,00	kr 0,00
J.02	Aconto nr 02	50.000,00	100%	kr 50.000,00	kr 0,00
J.03	Aconto nr 03	46.000,00	100%	kr 46.000,00	kr 0,00
J.04	Aconto nr 04	87.000,00	100%	kr 87.000,00	kr 0,00
J.05	Aconto nr 05	521.000,00	100%	kr 521.000,00	kr 0,00
J.06	Aconto nr 06	192.000,00	100%	kr 192.000,00	kr 0,00
J.07	Aconto nr 07	318.000,00	100%	kr 318.000,00	kr 0,00
J.08	Aconto nr 08	225.000,00	100%	kr 225.000,00	kr 0,00
J.09				kr 0,00	kr 0,00
J.10				kr 0,00	kr 0,00
J.11				kr 0,00	kr 0,00
J.12				kr 0,00	kr 0,00
J.13				kr 0,00	kr 0,00
J.14				kr 0,00	kr 0,00
J.15				kr 0,00	kr 0,00
J.16				kr 0,00	kr 0,00
J.17				kr 0,00	kr 0,00
J.18				kr 0,00	kr 0,00
J.19				kr 0,00	kr 0,00
J.20				kr 0,00	kr 0,00
J.21				kr 0,00	kr 0,00
J.22				kr 0,00	kr 0,00
J.23				kr 0,00	kr 0,00
J.24				kr 0,00	kr 0,00
J.25				kr 0,00	kr 0,00
J.26				kr 0,00	kr 0,00
J.27				kr 0,00	kr 0,00
J.28				kr 0,00	kr 0,00
J.29				kr 0,00	kr 0,00
J.30				kr 0,00	kr 0,00
J.31				kr 0,00	kr 0,00
J.32				kr 0,00	kr 0,00
J.33				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1

Versions dato: 23-08-2016

Print dato: 14-08-2020

J.34				kr 0,00	kr 0,00
J.35				kr 0,00	kr 0,00
J.36				kr 0,00	kr 0,00
J.37				kr 0,00	kr 0,00
J.38				kr 0,00	kr 0,00
J.39				kr 0,00	kr 0,00
J.40				kr 0,00	kr 0,00
J.41				kr 0,00	kr 0,00
J.42				kr 0,00	kr 0,00
J.43				kr 0,00	kr 0,00
J.44				kr 0,00	kr 0,00
J.45				kr 0,00	kr 0,00
J.46				kr 0,00	kr 0,00
J.47				kr 0,00	kr 0,00
J.48				kr 0,00	kr 0,00
J.49				kr 0,00	kr 0,00
J.50				kr 0,00	kr 0,00
J.51				kr 0,00	kr 0,00
			kr 1.540.000,00	100%	kr 1.540.000,00
					kr 0,00

Ny skærbæk Skole

Entrep. **VVS**

Jürgensen VVS

Fordelingsliste JE

Pos.	Ekstraarbejder	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
JE.01	Fradrag for Byggepladsskilt	-922,00	100%	kr -922,00	kr 0,00
JE.02	Tillæg for interimsvarme i Nordfløjen	74.000,00	100%	kr 74.000,00	kr 0,00
JE.03	Tillæg for UV-Ændring i Nordbygning	68.000,00	100%	kr 68.000,00	kr 0,00
JE.04	Tillæg for UV-Ændring i Sydbygning	69.800,00	100%	kr 69.800,00	kr 0,00
JE.05	Tillæg for UV-Ændring i Midtbygning	42.400,00		kr 0,00	kr 42.400,00
JE.06	Tillæg for lydisolering af UV-rør			kr 0,00	kr 0,00
JE.07	Interims tv - og gulvvarmetilslutn. N+S	69.700,00	100%	kr 69.700,00	kr 0,00
JE.08	Diverse ekstra aftalt med ING+BH	73.200,00		kr 0,00	kr 73.200,00
JE.09	Diverse huller	5.800,00	100%	kr 5.800,00	kr 0,00
JE.10	Interimsvarme i sydbygningen	25.000,00		kr 0,00	kr 25.000,00
JE.11	Brandlukninger af huller i dæk ved UV	60.000,00		kr 0,00	kr 60.000,00
JE.12	Hulboring for UV-rør i elementvægge	52.400,00		kr 0,00	kr 52.400,00
JE.13	Manglende brandskab i sydbygningen	4.700,00		kr 0,00	kr 4.700,00
JE.14	Fremføring af varmerør til GVF 2.1	19.500,00		kr 0,00	kr 19.500,00

Versions nr: 3.1.1
Versions dato: 23-08-2016
Print dato: 14-08-2020

JE.15				kr 0,00	kr 0,00
JE.16				kr 0,00	kr 0,00
JE.17				kr 0,00	kr 0,00
JE.18				kr 0,00	kr 0,00
JE.19				kr 0,00	kr 0,00
JE.20				kr 0,00	kr 0,00
JE.21				kr 0,00	kr 0,00
JE.22				kr 0,00	kr 0,00
JE.23				kr 0,00	kr 0,00
JE.24				kr 0,00	kr 0,00
JE.25				kr 0,00	kr 0,00
JE.26				kr 0,00	kr 0,00
JE.27				kr 0,00	kr 0,00
JE.28				kr 0,00	kr 0,00
JE.29				kr 0,00	kr 0,00
JE.30				kr 0,00	kr 0,00
JE.31				kr 0,00	kr 0,00
JE.32				kr 0,00	kr 0,00
JE.33				kr 0,00	kr 0,00
JE.34				kr 0,00	kr 0,00
JE.35				kr 0,00	kr 0,00
JE.36				kr 0,00	kr 0,00
JE.37				kr 0,00	kr 0,00
JE.38				kr 0,00	kr 0,00
JE.39				kr 0,00	kr 0,00
JE.40				kr 0,00	kr 0,00
JE.41				kr 0,00	kr 0,00
JE.42				kr 0,00	kr 0,00
JE.43				kr 0,00	kr 0,00
JE.44				kr 0,00	kr 0,00
JE.45				kr 0,00	kr 0,00
JE.46				kr 0,00	kr 0,00
JE.47				kr 0,00	kr 0,00
JE.48				kr 0,00	kr 0,00
JE.49				kr 0,00	kr 0,00
JE.50				kr 0,00	kr 0,00
JE.51				kr 0,00	kr 0,00
		kr 563.578,00	51%	kr 286.378,00	kr 277.200,00

Versions nr: 3.1.1

Versions dato: 23-08-2016

Print dato: 14-08-2020

Ny skærbæk Skole					
Entrep. Ventilation		GK Danmark			
Fordelingsliste K					
Pos.	Aktivitet/Arbejde	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
K.01	Aconto nr 01	980.000,01	100%	kr 980.000,01	kr 0,00
K.02	Aconto nr 02	430.110,00	100%	kr 430.110,00	kr 0,00
K.03	Aconto nr 03	293.820,00	100%	kr 293.820,00	kr 0,00
K.04	Aconto nr 04	518.130,00	100%	kr 518.130,00	kr 0,00
K.05	Aconto nr 05	353.550,00	100%	kr 353.550,00	kr 0,00
K.06	Aconto nr 06	397.725,00	100%	kr 397.725,00	kr 0,00
K.07	Aconto nr 07	153.435,00	100%	kr 153.435,00	kr 0,00
K.08	Aconto nr 08	172.485,00	100%	kr 172.485,00	kr 0,00
K.09	Aconto nr 09	385.335,00	100%	kr 385.335,00	kr 0,00
K.10	Aconto nr 10	75.501,00	100%	kr 75.501,00	kr 0,00
K.11				kr 0,00	kr 0,00
K.12				kr 0,00	kr 0,00
K.13				kr 0,00	kr 0,00
K.14				kr 0,00	kr 0,00
K.15				kr 0,00	kr 0,00
K.16				kr 0,00	kr 0,00
K.17				kr 0,00	kr 0,00
K.18				kr 0,00	kr 0,00
K.19				kr 0,00	kr 0,00
K.20				kr 0,00	kr 0,00
K.21				kr 0,00	kr 0,00
K.22				kr 0,00	kr 0,00
K.23				kr 0,00	kr 0,00
K.24				kr 0,00	kr 0,00
K.25				kr 0,00	kr 0,00
K.26				kr 0,00	kr 0,00
K.27				kr 0,00	kr 0,00
K.28				kr 0,00	kr 0,00
K.29				kr 0,00	kr 0,00
K.30				kr 0,00	kr 0,00
K.31				kr 0,00	kr 0,00
K.32				kr 0,00	kr 0,00
K.33				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1

Versions dato: 23-08-2016

Print dato: 14-08-2020

K.34				kr 0,00	kr 0,00
K.35				kr 0,00	kr 0,00
K.36				kr 0,00	kr 0,00
K.37				kr 0,00	kr 0,00
K.38				kr 0,00	kr 0,00
K.39				kr 0,00	kr 0,00
K.40				kr 0,00	kr 0,00
K.41				kr 0,00	kr 0,00
K.42				kr 0,00	kr 0,00
K.43				kr 0,00	kr 0,00
K.44				kr 0,00	kr 0,00
K.45				kr 0,00	kr 0,00
K.46				kr 0,00	kr 0,00
K.47				kr 0,00	kr 0,00
K.48				kr 0,00	kr 0,00
K.49				kr 0,00	kr 0,00
K.50				kr 0,00	kr 0,00
K.51				kr 0,00	kr 0,00
			kr 3.760.091,01	100%	kr 3.760.091,01
					kr 0,00

Ny skærbæk Skole
 Entrep. **Ventilation** **GK Danmark**

Fordelingsliste KE

Pos.	Ekstraarbejder	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
KE.01	Fradrag for andel af BP-Skilt	-922,00	100%	kr -922,00	kr 0,00
KE.02	Tillæg ifm ændringer i projekt for VE01	19.775,00	100%	kr 19.775,00	kr 0,00
KE.03	Tillæg for VAV-Motorer	262.000,00	50%	kr 131.000,00	kr 131.000,00
KE.04	Ændringer under udførelse for VE01+02	39.130,00	100%	kr 39.130,00	kr 0,00
KE.05	Tillæg ifm ændringer i projekt for VE02	19.775,00		kr 0,00	kr 19.775,00
KE.06	Tillæg ifm ændring i proj. for VE03+04	39.550,00		kr 0,00	kr 39.550,00
KE.07	Ekstra ifm specialløsninger-montage	14.650,00		kr 0,00	kr 14.650,00
KE.08	Gener ifm UV-rør, kabelbakker etc	25.000,00		kr 0,00	kr 25.000,00
KE.09	Diverse genprojektering + huller i tag	12.942,00		kr 0,00	kr 12.942,00
KE.10	Gennembrydninger af gipsvægge i nord	19.200,00		kr 0,00	kr 19.200,00
KE.11	Tidsfristforlængelse til 15-12-2020	57.000,00		kr 0,00	kr 57.000,00
KE.12	Hultagning i sydbygning	8.450,00		kr 0,00	kr 8.450,00
KE.13	Hultagning i Mellebygning, overslag	17.000,00		kr 0,00	kr 17.000,00
KE.14				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
Versions dato: 23-08-2016
Print dato: 14-08-2020

KE.15				kr 0,00	kr 0,00
KE.16				kr 0,00	kr 0,00
KE.17				kr 0,00	kr 0,00
KE.18				kr 0,00	kr 0,00
KE.19				kr 0,00	kr 0,00
KE.20				kr 0,00	kr 0,00
KE.21				kr 0,00	kr 0,00
KE.22				kr 0,00	kr 0,00
KE.23				kr 0,00	kr 0,00
KE.24				kr 0,00	kr 0,00
KE.25				kr 0,00	kr 0,00
KE.26				kr 0,00	kr 0,00
KE.27				kr 0,00	kr 0,00
KE.28				kr 0,00	kr 0,00
KE.29				kr 0,00	kr 0,00
KE.30				kr 0,00	kr 0,00
KE.31				kr 0,00	kr 0,00
KE.32				kr 0,00	kr 0,00
KE.33				kr 0,00	kr 0,00
KE.34				kr 0,00	kr 0,00
KE.35				kr 0,00	kr 0,00
KE.36				kr 0,00	kr 0,00
KE.37				kr 0,00	kr 0,00
KE.38				kr 0,00	kr 0,00
KE.39				kr 0,00	kr 0,00
KE.40				kr 0,00	kr 0,00
KE.41				kr 0,00	kr 0,00
KE.42				kr 0,00	kr 0,00
KE.43				kr 0,00	kr 0,00
KE.44				kr 0,00	kr 0,00
KE.45				kr 0,00	kr 0,00
KE.46				kr 0,00	kr 0,00
KE.47				kr 0,00	kr 0,00
KE.48				kr 0,00	kr 0,00
KE.49				kr 0,00	kr 0,00
KE.50				kr 0,00	kr 0,00
KE.51				kr 0,00	kr 0,00
		kr 533.550,00	35%	kr 188.983,00	kr 344.567,00

Versions nr: 3.1.1
 Versions dato: 23-08-2016
 Print dato: 14-08-2020

Ny skærbæk Skole					
Entrep. CTS		Bravida			
Fordelingsliste L					
Pos.	Aktivitet/Arbejde	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
L.01	Aconto nr 01	41.518,95	100%	kr 41.518,95	kr 0,00
L.02	Aconto nr 02	68.104,75	100%	kr 68.104,75	kr 0,00
L.03	Aconto nr 03	137.303,00	100%	kr 137.303,00	kr 0,00
L.04	Aconto nr.04	123.463,35	100%	kr 123.463,35	kr 0,00
L.05	Aconto nr 05	383.306,80	100%	kr 383.306,80	kr 0,00
L.06	Aconto nr 06	302.970,70	100%	kr 302.970,70	kr 0,00
L.07	Aconto nr 07	270.675,75	100%	kr 270.675,75	kr 0,00
L.08	Aconto nr 08	348.697,45	100%	kr 348.697,45	kr 0,00
L.09				kr 0,00	kr 0,00
L.10				kr 0,00	kr 0,00
L.11				kr 0,00	kr 0,00
L.12				kr 0,00	kr 0,00
L.13				kr 0,00	kr 0,00
L.14				kr 0,00	kr 0,00
L.15				kr 0,00	kr 0,00
L.16				kr 0,00	kr 0,00
L.17				kr 0,00	kr 0,00
L.18				kr 0,00	kr 0,00
L.19				kr 0,00	kr 0,00
L.20				kr 0,00	kr 0,00
L.21				kr 0,00	kr 0,00
L.22				kr 0,00	kr 0,00
L.23				kr 0,00	kr 0,00
L.24				kr 0,00	kr 0,00
L.25				kr 0,00	kr 0,00
L.26				kr 0,00	kr 0,00
L.27				kr 0,00	kr 0,00
L.28				kr 0,00	kr 0,00
L.29				kr 0,00	kr 0,00
L.30				kr 0,00	kr 0,00
L.31				kr 0,00	kr 0,00
L.32				kr 0,00	kr 0,00
L.33				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1

Versions dato: 23-08-2016

Print dato: 14-08-2020

L.34				kr 0,00	kr 0,00
L.35				kr 0,00	kr 0,00
L.36				kr 0,00	kr 0,00
L.37				kr 0,00	kr 0,00
L.38				kr 0,00	kr 0,00
L.39				kr 0,00	kr 0,00
L.40				kr 0,00	kr 0,00
L.41				kr 0,00	kr 0,00
L.42				kr 0,00	kr 0,00
L.43				kr 0,00	kr 0,00
L.44				kr 0,00	kr 0,00
L.45				kr 0,00	kr 0,00
L.46				kr 0,00	kr 0,00
L.47				kr 0,00	kr 0,00
L.48				kr 0,00	kr 0,00
L.49				kr 0,00	kr 0,00
L.50				kr 0,00	kr 0,00
L.51				kr 0,00	kr 0,00
			kr 1.676.040,75	100%	kr 1.676.040,75
					kr 0,00

Ny skærbæk Skole

Entrep. **CTS** **Bravida**

Fordelingsliste LE

Pos.	Ekstraarbejder	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
LE.01	Fradrag for BP-Skilt	-922,00		kr 0,00	kr -922,00
LE.02	Fradrag for VAV-Motorer	-163.000,00		kr 0,00	kr -163.000,00
LE.03	Ændringer i vinduesstyringer	497.900,00		kr 0,00	kr 497.900,00
LE.04				kr 0,00	kr 0,00
LE.05				kr 0,00	kr 0,00
LE.06				kr 0,00	kr 0,00
LE.07				kr 0,00	kr 0,00
LE.08				kr 0,00	kr 0,00
LE.09				kr 0,00	kr 0,00
LE.10				kr 0,00	kr 0,00
LE.11				kr 0,00	kr 0,00
LE.12				kr 0,00	kr 0,00
LE.13				kr 0,00	kr 0,00
LE.14				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
Versions dato: 23-08-2016
Print dato: 14-08-2020

LE.15				kr 0,00	kr 0,00
LE.16				kr 0,00	kr 0,00
LE.17				kr 0,00	kr 0,00
LE.18				kr 0,00	kr 0,00
LE.19				kr 0,00	kr 0,00
LE.20				kr 0,00	kr 0,00
LE.21				kr 0,00	kr 0,00
LE.22				kr 0,00	kr 0,00
LE.23				kr 0,00	kr 0,00
LE.24				kr 0,00	kr 0,00
LE.25				kr 0,00	kr 0,00
LE.26				kr 0,00	kr 0,00
LE.27				kr 0,00	kr 0,00
LE.28				kr 0,00	kr 0,00
LE.29				kr 0,00	kr 0,00
LE.30				kr 0,00	kr 0,00
LE.31				kr 0,00	kr 0,00
LE.32				kr 0,00	kr 0,00
LE.33				kr 0,00	kr 0,00
LE.34				kr 0,00	kr 0,00
LE.35				kr 0,00	kr 0,00
LE.36				kr 0,00	kr 0,00
LE.37				kr 0,00	kr 0,00
LE.38				kr 0,00	kr 0,00
LE.39				kr 0,00	kr 0,00
LE.40				kr 0,00	kr 0,00
LE.41				kr 0,00	kr 0,00
LE.42				kr 0,00	kr 0,00
LE.43				kr 0,00	kr 0,00
LE.44				kr 0,00	kr 0,00
LE.45				kr 0,00	kr 0,00
LE.46				kr 0,00	kr 0,00
LE.47				kr 0,00	kr 0,00
LE.48				kr 0,00	kr 0,00
LE.49				kr 0,00	kr 0,00
LE.50				kr 0,00	kr 0,00
LE.51				kr 0,00	kr 0,00
		kr 333.978,00	0%	kr 0,00	kr 333.978,00

Versions nr: 3.1.1
 Versions dato: 23-08-2016
 Print dato: 14-08-2020

Ny skærbæk Skole					
Entrep. Gartner/belægnin Mads Vejrup					
Fordelingsliste L					
Pos.	Aktivitet/Arbejde	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
L.01	Aconto nr 01	175.975,30		kr 175.975,30	kr 0,00
L.02	Aconto nr 02	248.194,20		kr 248.194,20	kr 0,00
L.03	Aconto nr 03	177.047,30	100%	kr 177.047,30	kr 0,00
L.04				kr 0,00	kr 0,00
L.05				kr 0,00	kr 0,00
L.06				kr 0,00	kr 0,00
L.07				kr 0,00	kr 0,00
L.08				kr 0,00	kr 0,00
L.09				kr 0,00	kr 0,00
L.10				kr 0,00	kr 0,00
L.11				kr 0,00	kr 0,00
L.12				kr 0,00	kr 0,00
L.13				kr 0,00	kr 0,00
L.14				kr 0,00	kr 0,00
L.15				kr 0,00	kr 0,00
L.16				kr 0,00	kr 0,00
L.17				kr 0,00	kr 0,00
L.18				kr 0,00	kr 0,00
L.19				kr 0,00	kr 0,00
L.20				kr 0,00	kr 0,00
L.21				kr 0,00	kr 0,00
L.22				kr 0,00	kr 0,00
L.23				kr 0,00	kr 0,00
L.24				kr 0,00	kr 0,00
L.25				kr 0,00	kr 0,00
L.26				kr 0,00	kr 0,00
L.27				kr 0,00	kr 0,00
L.28				kr 0,00	kr 0,00
L.29				kr 0,00	kr 0,00
L.30				kr 0,00	kr 0,00
L.31				kr 0,00	kr 0,00
L.32				kr 0,00	kr 0,00
L.33				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1

Versions dato: 23-08-2016

Print dato: 14-08-2020

L.34				kr 0,00	kr 0,00
L.35				kr 0,00	kr 0,00
L.36				kr 0,00	kr 0,00
L.37				kr 0,00	kr 0,00
L.38				kr 0,00	kr 0,00
L.39				kr 0,00	kr 0,00
L.40				kr 0,00	kr 0,00
L.41				kr 0,00	kr 0,00
L.42				kr 0,00	kr 0,00
L.43				kr 0,00	kr 0,00
L.44				kr 0,00	kr 0,00
L.45				kr 0,00	kr 0,00
L.46				kr 0,00	kr 0,00
L.47				kr 0,00	kr 0,00
L.48				kr 0,00	kr 0,00
L.49				kr 0,00	kr 0,00
L.50				kr 0,00	kr 0,00
L.51				kr 0,00	kr 0,00
			kr 601.216,80	100%	kr 601.216,80
					kr 0,00

Ny skærbæk Skole

Entrep. **Gartner/belægning Mads Vejrup**

Fordelingsliste LE

Pos.	Ekstraarbejder	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
LE.01	Fradrag for udgåede cykelstativer	-191.856,00		kr 0,00	kr -191.856,00
LE.02	Fradrag for andel af byggepladsskilt	-922,00		kr 0,00	kr -922,00
LE.03	Fradrag/tillæg ifm detailprojekt			kr 0,00	kr 0,00
LE.04				kr 0,00	kr 0,00
LE.05				kr 0,00	kr 0,00
LE.06				kr 0,00	kr 0,00
LE.07				kr 0,00	kr 0,00
LE.08				kr 0,00	kr 0,00
LE.09				kr 0,00	kr 0,00
LE.10				kr 0,00	kr 0,00
LE.11				kr 0,00	kr 0,00
LE.12				kr 0,00	kr 0,00
LE.13				kr 0,00	kr 0,00
LE.14				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
Versions dato: 23-08-2016
Print dato: 14-08-2020

LE.15				kr 0,00	kr 0,00
LE.16				kr 0,00	kr 0,00
LE.17				kr 0,00	kr 0,00
LE.18				kr 0,00	kr 0,00
LE.19				kr 0,00	kr 0,00
LE.20				kr 0,00	kr 0,00
LE.21				kr 0,00	kr 0,00
LE.22				kr 0,00	kr 0,00
LE.23				kr 0,00	kr 0,00
LE.24				kr 0,00	kr 0,00
LE.25				kr 0,00	kr 0,00
LE.26				kr 0,00	kr 0,00
LE.27				kr 0,00	kr 0,00
LE.28				kr 0,00	kr 0,00
LE.29				kr 0,00	kr 0,00
LE.30				kr 0,00	kr 0,00
LE.31				kr 0,00	kr 0,00
LE.32				kr 0,00	kr 0,00
LE.33				kr 0,00	kr 0,00
LE.34				kr 0,00	kr 0,00
LE.35				kr 0,00	kr 0,00
LE.36				kr 0,00	kr 0,00
LE.37				kr 0,00	kr 0,00
LE.38				kr 0,00	kr 0,00
LE.39				kr 0,00	kr 0,00
LE.40				kr 0,00	kr 0,00
LE.41				kr 0,00	kr 0,00
LE.42				kr 0,00	kr 0,00
LE.43				kr 0,00	kr 0,00
LE.44				kr 0,00	kr 0,00
LE.45				kr 0,00	kr 0,00
LE.46				kr 0,00	kr 0,00
LE.47				kr 0,00	kr 0,00
LE.48				kr 0,00	kr 0,00
LE.49				kr 0,00	kr 0,00
LE.50				kr 0,00	kr 0,00
LE.51				kr 0,00	kr 0,00
		kr -192.778,00	0%	kr 0,00	kr -192.778,00

Versions nr: 3.1.1
Versions dato: 23-08-2016
Print dato: 14-08-2020

Ny skærbæk Skole					
Entrep. Inventar		ST Skoleinventar			
Fordelingsliste L					
Pos.	Aktivitet/Arbejde	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
L.01				kr 0,00	kr 0,00
L.02				kr 0,00	kr 0,00
L.03				kr 0,00	kr 0,00
L.04				kr 0,00	kr 0,00
L.05				kr 0,00	kr 0,00
L.06				kr 0,00	kr 0,00
L.07				kr 0,00	kr 0,00
L.08				kr 0,00	kr 0,00
L.09				kr 0,00	kr 0,00
L.10				kr 0,00	kr 0,00
L.11				kr 0,00	kr 0,00
L.12				kr 0,00	kr 0,00
L.13				kr 0,00	kr 0,00
L.14				kr 0,00	kr 0,00
L.15				kr 0,00	kr 0,00
L.16				kr 0,00	kr 0,00
L.17				kr 0,00	kr 0,00
L.18				kr 0,00	kr 0,00
L.19				kr 0,00	kr 0,00
L.20				kr 0,00	kr 0,00
L.21				kr 0,00	kr 0,00
L.22				kr 0,00	kr 0,00
L.23				kr 0,00	kr 0,00
L.24				kr 0,00	kr 0,00
L.25				kr 0,00	kr 0,00
L.26				kr 0,00	kr 0,00
L.27				kr 0,00	kr 0,00
L.28				kr 0,00	kr 0,00
L.29				kr 0,00	kr 0,00
L.30				kr 0,00	kr 0,00
L.31				kr 0,00	kr 0,00
L.32				kr 0,00	kr 0,00
L.33				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1

Versions dato: 23-08-2016

Print dato: 14-08-2020

L.34				kr 0,00	kr 0,00
L.35				kr 0,00	kr 0,00
L.36				kr 0,00	kr 0,00
L.37				kr 0,00	kr 0,00
L.38				kr 0,00	kr 0,00
L.39				kr 0,00	kr 0,00
L.40				kr 0,00	kr 0,00
L.41				kr 0,00	kr 0,00
L.42				kr 0,00	kr 0,00
L.43				kr 0,00	kr 0,00
L.44				kr 0,00	kr 0,00
L.45				kr 0,00	kr 0,00
L.46				kr 0,00	kr 0,00
L.47				kr 0,00	kr 0,00
L.48				kr 0,00	kr 0,00
L.49				kr 0,00	kr 0,00
L.50				kr 0,00	kr 0,00
L.51				kr 0,00	kr 0,00
			kr 0,00	#DIV/0!	kr 0,00

kr 0,00 #DIV/0! kr 0,00 kr 0,00

Ny skærbæk Skole

Entrep. **Inventar** **ST Skoleinventar**

Fordelingsliste LE

Pos.	Ekstraarbejder	Aftalt pris kr.	Stade %	Betalt kr.	Rest kr.
LE.01				kr 0,00	kr 0,00
LE.02				kr 0,00	kr 0,00
LE.03				kr 0,00	kr 0,00
LE.04				kr 0,00	kr 0,00
LE.05				kr 0,00	kr 0,00
LE.06				kr 0,00	kr 0,00
LE.07				kr 0,00	kr 0,00
LE.08				kr 0,00	kr 0,00
LE.09				kr 0,00	kr 0,00
LE.10				kr 0,00	kr 0,00
LE.11				kr 0,00	kr 0,00
LE.12				kr 0,00	kr 0,00
LE.13				kr 0,00	kr 0,00
LE.14				kr 0,00	kr 0,00

Versions nr: 3.1.1
Versions dato: 23-08-2016
Print dato: 14-08-2020

LE.15				kr 0,00	kr 0,00
LE.16				kr 0,00	kr 0,00
LE.17				kr 0,00	kr 0,00
LE.18				kr 0,00	kr 0,00
LE.19				kr 0,00	kr 0,00
LE.20				kr 0,00	kr 0,00
LE.21				kr 0,00	kr 0,00
LE.22				kr 0,00	kr 0,00
LE.23				kr 0,00	kr 0,00
LE.24				kr 0,00	kr 0,00
LE.25				kr 0,00	kr 0,00
LE.26				kr 0,00	kr 0,00
LE.27				kr 0,00	kr 0,00
LE.28				kr 0,00	kr 0,00
LE.29				kr 0,00	kr 0,00
LE.30				kr 0,00	kr 0,00
LE.31				kr 0,00	kr 0,00
LE.32				kr 0,00	kr 0,00
LE.33				kr 0,00	kr 0,00
LE.34				kr 0,00	kr 0,00
LE.35				kr 0,00	kr 0,00
LE.36				kr 0,00	kr 0,00
LE.37				kr 0,00	kr 0,00
LE.38				kr 0,00	kr 0,00
LE.39				kr 0,00	kr 0,00
LE.40				kr 0,00	kr 0,00
LE.41				kr 0,00	kr 0,00
LE.42				kr 0,00	kr 0,00
LE.43				kr 0,00	kr 0,00
LE.44				kr 0,00	kr 0,00
LE.45				kr 0,00	kr 0,00
LE.46				kr 0,00	kr 0,00
LE.47				kr 0,00	kr 0,00
LE.48				kr 0,00	kr 0,00
LE.49				kr 0,00	kr 0,00
LE.50				kr 0,00	kr 0,00
LE.51				kr 0,00	kr 0,00
		kr 0,00	#DIV/0!	kr 0,00	kr 0,00

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

Fra: Arne Borum Linnét [al@fmbyggningsdrift.dk]
Til: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Cc: Palle Kudsk [PKU@toender.dk]; Søren Aaby [saa@fmbyggningsdrift.dk]; hv@friis-moltke.dk [hv@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 09-08-2020 22:15
Modtaget Dato: 09-08-2020 22:15
Vedrørende: SSK - Status uge 32 -
Vedhæftninger: image001_187.png

Hej med jer

Hermed status på uge 32

- MA venter på udtørring af væggene i stueplan nord, forventer at maler starter på onsdag/torsdag i uge 33 med væv på stueplan nord.
- MA er færdig med spartle vægge på 1. sal syd og halv færdig i stueplan.
- TØ mangler kun at beklæde på side 2 i mellembygningen. Alt gips arbejde bliver færdig i uge 33
- TØ er i gang med lofterne på 1. sal nord bygning. Her følger TØ nogenlunde planen, dog lidt bremset af, at de har lavet lysningerne om i ovenlysvinduerne et par gange nu. I store træk mangler de hele gangarealet. Efter tidsplanen skulle de have været i gang på stueplan nord, men pga. fugtudfordringer for maler påvirker det også TØ delen.
- VEN/EL/VVS følger med alle steder.
- Tidsplan - Undertegnet ser forsat positivt på planen, selvom vi er efter på maler delen. Vi skal blot have gulvmanden i gang før TØ pga. TØ leveringstid på indvendige døre. Hvis det er muligt ser det ok fornuftigt ud, fordi MA laver hans del færdig i første omgang og ikke som tidsplanen siger, at MA skal tilbage og male anden gang, dvs. at EL m.fl. slutmonterer også på væggene i første omgang og skal heller ikke tilbage. Det som kan ødelægge planen er TØ og deres leveringstider plus hvis deres fremdrift går helt i stå. Pt. følger de nogenlunde efter planen, i hvert fald ikke noget de ikke kan mand op til endnu, når væggene er klar fra MA.
- I uge 33 vil Råhus begynde at klargøre til risterne på tårnet, derefter øverste dæk.
- Økonomien er på den kritiske vej, som I kunne se på fremsendt i fredags. Det skyldes at der er kommet en del punkter på UFU listen som undertegnet ser det, heriblandt en stor post på indvendige lysninger. Men også ventilation og EL, de melder at de mangler en del gennemføringer i betonelementer, CTS kender vi ikke, så det er et skøn. Yderligere skal der tillægges økonomi på afdækning af gulvet i og med er er en del faggrupper som skal udføre arbejde efter gulvmontage.

Forsat uafklaret

- Økonomien
 - Beparelserne. Ønsker I nogle af besparelserne som er fremsendt til jer indarbejdet i projektet? I har forsat ikke meldt noget ud omkring hvad I ønsker af besparelse. I nævnte på mødet i onsdags, men det taler vi nærmere omkring i morgen på økonomi mødet.
- Tidsplanen er meget udfordret pga. diverse leveringstider på følgende ting;
 1. Indvendige døre er ikke bestilt – forsat ukendt hvem HS vælger som leverandør samt leveringstiden. *Gentagelse 2 – Forventer Henning har bestilt dem, han melder levering imellem uge 37 og 39 så det er meget kritisk for tidsplanen.*
 2. Afstandslisten til underlaget til beklædningen – *leveringstid uge 28 og igen i 33, de mangler forsat at beklæde i begge lommer ved tårnet og maskinværksted.*
 3. Beklædning til facaden – leveringstid uge 39 – *Gentagelse 2 – Henning forventer stadig levering uge 39*
 4. Fugtigheden på betonvæggene i syd bygning.
- Jeg ser det helt umuligt at tømreren er færdig til slutdato udvendig med beklædning i og med at beklædning først kommer uge 39. Samtidig er jeg meget bekymret for indvendige døre idet de ikke er bestilt endnu pga. polemik omkring farver og beslag m.m. som for længst burde være besluttet. Det påvirker tidsplanen negativt da indregulering ikke kan udføres uden døre i den færdige bygning.

Afklaringspunkter TØ

- a. Rest arbejde facaden – TØ vil fremsende dokumentation på hans økonomiske krav til HV – HV har fremsendt alt dokumentation på facade-påforingen. HS er vendt tilbage på HV mails, dog med et mindre beløb som de mener de skal have. HV er i gang med at se alle TØ aftalesedler igennem som handler om facaden ift. om prisen er korrekt fra TØ side. *Forsat ingen afklaring på aftaleseddel.*
- b. Indvendige døre – Vi skal acceptere prisen fra TØ inden Henning bestiller dørene – Forespørgsel er fremsendt til HS efter en pris på alm. låsekasse vs. ADK – RUKO har afleveret skema d. 10. juni til TØ - *Indvendige døre er forsat ikke bestilt, hvilket er kritiske for tidsplanen. Gentagelse 3, Henning forventer levering uge 37 til uge 39, punktet lukkes, men dog uden at have dem bestilt.*

Afklaringspunkter GU

- a. Aftaleseddel fremsendt til jer på gulv prisen. ARK er ikke enig med Garant ift. prisen. Så vi kan ikke anbefale at I skriver den under medmindre, at I læser deres tilbud anderledes end ARK. *Gentagelse 5 – Der afholdes torsdag d. 13. aug.*

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnét

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923

Mail: al@fmbyggningsdrift.dk

Web: www.fmbyggningsdrift.dk

5538

FM Bygningsdrift

Logistik & Rådgivning

Hovedkontor:

FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:

FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

5733229#0 - SV:SSK - Tækker, VVS, CTS, forkerte motorventiler

Fra: Morten Høier [moh@taekker.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Cc: hv@friis-moltke.dk [hv@friis-moltke.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Kasper Bornstein Larsen [kbl@taekker.dk]; Peter Boe Hauggaard-Nielsen [phn@taekker.dk]
Sendt dato: 10-08-2020 08:14
Modtaget Dato: 10-08-2020 08:14
Vedrørende: SV: SSK - Tækker, VVS, CTS, forkerte motorventiler
Vedhæftninger: image001_14.gif
image002_11.gif
image003_4.gif
image004_593.png
image005_597.png
image006_154.png
image007_94.png
image008_65.png
image009_48.jpg

Hej Morten,

OK – det var blot fordi du selv på byggemødet inden sommer foreslog at du ville indkalde såfremt det ville hjælpe.

Kasper hører CTS og VVS hvornår de kan i indeværende uge.

De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M +45 4171 1319
T +45 8619 1844

www.taekker.dk



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Sendt: 7. august 2020 08:49
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: hv@friis-moltke.dk; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: SV: SSK - Tækker, VVS, CTS, forkerte motorventiler

Hej Morten.

Tak for mailen.

Jeg indkalder ikke til et møde. Den ligger ved Jer eller Friis og Moltke.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



5371

Fra: Morten Høier [<mailto:moh@taekker.dk>]
Sendt: 6. august 2020 15:52
Til: Mogens Husted Kristensen; Morten Bramstrup Jakobsen
Cc: Henrik Villefrance; Peter Boe Hauggaard-Nielsen; Kasper Bornstein Larsen
Emne: SV: SSK - Tækker, VVS, CTS, forkerte motorventiler

Hej Mogens og Morten,

Vi må rykke mødet frem fra d. 18., dette var dog fordi CTS havde mulighed for at deltage her. Vi har desværre ikke mulighed for mødes om formiddagen, men kan mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 14 i næste uge.
@Morten J – Vil du høre entreprenørerne hvornår de har tid, og indkalde til møde?

Vedr. motorventiler, så har vi fulgt op på dette tilbage i juni jf. nedenstående mail, hvor vi også påpeger at CTS ikke har bestilt de rigtige motorventiler – heraf konsekvensen. Kasper beskriver de to udfald der kan være ved at bruge mindre ventiler end projekteret – dette for at fremme processen og at VVS ikke går i stå fordi CTS har bestilt forkerte ventiler. AT VVS er sikre på at det ikke kommer til at virke, må vi så drøfte på mødet og finde en løsning.

Mailen som Kasper sender bliver desuden heller ikke besvaret af entreprenørerne, ligesom at CTS er meget svære at få fat i. De deltog heller ikke på byggemødet hvor vi ellers ville kunne have taget snakken vedr. dette problem, så jeg mener ikke skylden for at det har trukket ud kan påføres os alene.

Derudover kan jeg oplyse at Kasper så sent som i dag har snakket med VVS og spurgt dem om der var noget udestående. Det mente de ikke der var, men jeg kan forstå at de siger noget andet til Jer.

Vedr. byggemødet i tirsdags, så var Kasper desværre syg og jeg kunne ikke nå at deltage – dette er hvad der kan ske, men det er selvfølgelig ærgerligt.

Som jeg påpegede i telefonen mener jeg at ALLE tekniske forespørgsler og mangler fremover oprettes gennem Dalux. Dette er påpeget mange gange og fremgår også af byggemødereferater. Hvis ikke det ligger på Dalux, så anser vi det som rådgiver som at der ikke er et problem. Forhåbentligt kommer alt frem i lyset og ingenting bliver tabt mellem to stole – jeg kan forstå på dig at entreprenørerne melder forskelligt ud til BH og rådgiver.

Mit forslag til en dagsorden for mødet ud fra de problemer du oplister i nedenstående er:

- Fjernvarmeanlæg, herunder
 - Motorventiler
 - Indregulering
 - Gennemgang af tegninger og beskrivelser
- Gasanlæg i science
- Koordinering mellem CTS/VVS
 - Gennemgang af grænsefladeskema og evt. beskrivelse
- Procesventilation (CTS)

Vil I supplere, hvis der er andet som skal tilføjes.

De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M +45 4171 1319
T +45 8619 1844

www.taekker.dk



Fra: Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>
Sendt: 6. august 2020 14:35
Til: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Cc: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>; Peter Boe Hauggaard-Nielsen <pbn@taekker.dk>
Emne: SV: SSK - Tækker, VVS, CTS, forkerte motorventiler

Hej Morten

Tak for din mail. Henrik havde orienteret mig om, at der sikkert kom "noget".

Indholdet ærgrer mig naturligvis, og jeg beder vores underrådgiver om straks at tage hånd om forholdene. Jeg har sat dem og Henrik Villefrance Cc på denne mail. Jeg har ikke sat de øvrige fra din mail cc, går ud fra at det er OK i denne omgang. Jeg vender hurtigst muligt tilbage.

5372
Venlig hilsen / Kind regards

Mogens Husted Kristensen

Arkitekt MAA, Partner

<image003.jpg>

Direkte / Mobile: (+45) 41 94 70 20 · Hovednummer: (+45) 72 10 00 52

Aarhus: Aaboulevarden 1, DK-8000 Aarhus C

Aalborg: Strandvejen 20, DK-9000 Aalborg

mhk@friis-moltke.dk · www.friis-moltke.dk[Facebook](#) · [LinkedIn](#)**Fra:** Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>**Sendt:** 6. august 2020 14:16**Til:** Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>**Cc:** Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Ditte Lundgaard Jakobsen <dilja@toender.dk>; Lars-Erik Skydsbjerg <les@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>**Emne:** VS: SSK - Tækker, VVS, CTS, forkerte motorventiler

Hej Mogens og Henrik.

Mogens, jeg har lovet at sende denne mail på opfordring af en telefonisk samtale med Henrik og vores møde med Ditte i går.

Vi oplever gentagne gange på pladsen, at Bravida og Jürgensen rejser et flag for mangler i beskrivelsen til CTS, fjernvarme og ved sidste byggemøde også science lokalers gasinstallationer. Efter deres udsagn er disse problemstillinger ikke løst. Der kom ved seneste byggemøde i tirsdags igen en del tekniske forespørgsler, men Tækker mødte ikke op, selvom Henrik har rykket for deres deltagelse.

Iht. CTS er både Bravida og Jürgensen enige om, at der er en masse sorte huller mellem deres entrepriser. Der var aftalt teknikermøde i denne uge, men det er nu udskudt til d. 18. aug. Både Bravida og Jürgensen sagde før ferien, at det er alt for sent med mødet, da vi er vidt i projektet og største delen er monteret. – Det holder derfor ikke, at vi igen skal vente 14 dage. Det vil have økonomiske konsekvenser for bygherre i det omfang, det skal laves om. Både bygherre, entreprenør og byggeledelsen har bedt om afklaring på dette længe. Jeg finder spørgsmål tilbage fra august 2019 på ventiler mv., som stadig er et problem. Vi bliver nervøse når selv byggeledelsen melder om udfordringer angående svar på tekniske spørgsmål.

Iht. til Science lokaler. Jürgensen mener, at det bliver svært at få de videnskabelige lokaler godkendt grundet gasinstallationer etc. – Dette vil fremgå af seneste byggemøde referat.

Iht. til fjernvarme. Jürgensen melder ugentlig til os, at fjernvarme og deraf varmedelen ikke kommer til at fungere ved i ibrugtagelsen. Se nedenstående mail fra Tækker. Deres tilgang er, som jeg læser det, at enten fungerer det eller også fungerer det ikke. Derudover mener Jürgensen, at vi vil sende fjernvarme retur med 60 gr., hvor den burde ligge på 30 gr. Vi har en stærk forventning om, at vi står med en skole, der både er indreguleret og kan tages i brug til december.

Vi ser en stor udfordring tilknyttet de ovenstående punkter både økonomisk og at der ikke er taget hånd om det. Der skulle for lang tid siden have været et teknisk afklaringsmøde, der havde fået manet alle disse usikkerheder til jorden.

Entreprenørerne siger ofte, de ikke får et svar eller et svar i tide. Dette gælder også når de anvender Dalux. Vi har sagt til dem, at de bliver nødt til at skrive en mail, ringe og sende ind på Dalux. – Vi er godt klar over at Tækker siger, at de er i dialog med de forskellige entrepriser, men det er noget andet der bliver meldt ud ved byggemøde og den daglige gang på pladsen.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent

Ejendomme

Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk**Fra:** Kasper Bornstein Larsen <kbl@taekker.dk>**Sendt:** 18. juni 2020 15:57**Til:** Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>; Thomas Kawaler <tk@jurgensen-vvs.dk>; Morthensen Michael Kenneth (Bravida)<Michael.k.Morthensen@bravida.dk>**Cc:** Morten Høier <moh@taekker.dk>**Emne:** VS: Skærbæk skole - CTS

Hej alle.

Som I ved har det været oppe at vende at motorventilerne til blandekredsene er leveret i for små størrelser. Nedenfor kommer en redegørelse af situationen. I er meget velkomne til at skrive eller ringe (som nok er mere praktisk) hvis I har spørgsmål til det.

5373

CTS har leveret motorventil til VVS som skal etablere disse i blandekredse, og efterfølgende i gang med at funktionsafprøve og indregulere varmeanlægget.

Motorventilerne har ikke samme dimensioner som anført på principdiagrammer udført af ING. Dette påpeger VVS og de melder ud at de er nødt til at fortsætte arbejdet for at overholde tidsplanen.

Motorventilerne er i en dimension der gør at de kan anvendes til at regulere varmeanlægget, men det er muligt at tryktabet over dem er for stort (grundet at de er mindre end anført). Der kan være 2 udfald af denne situation:

1: Varme anlægget virker fint og varmen kan styres som det er tiltænkt.

2: Varme anlægget har svært ved at levere varme til dele af varme anlægget grundet at trykket der er tilgængeligt er for lavt.

I tilfælde 2 vil der være behov for at der etableres motorventiler af den rigtige størrelse, eller måske at der etableres trykforøgelse. Det er op til CTS hvordan dette løses, da leverancen af motorventiler er deres ansvar. Jeg synes du skal give mig et kald Michael, da jeg ved at der er ingen som vil eller har brug for at det her bliver mere kompliceret end nødvendigt. Det er klart at der er risiko for at VVS skal udføre noget merarbejde i forbindelse med montering af motorventilerne eller trykforøger.

De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Kasper Bornstein Larsen
Civilingeniør i energi, indeklimateknik, VVS og ventilation
kbl@taekker.dk

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M +45 41711328
T +45 8619 1844

www.taekker.dk





















RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5733202#0 - SV:SSK - Dørfarvetegninger KS Skærbæk skole

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]
Til: 'Henrik Villefrance' [hv@friis-moltke.dk]; 'Henning Skriver' [hs@kraftman.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; 'Arne Borum Linnet' [al@fmbyggningsdrift.dk]
Cc: 'Esben Jessen' [beregner@kraftman.dk]; 'Johan Juul Larsen (johan@trehoeje.dk)' [johan@trehoeje.dk]; 'Jesper S. Hansen' [jh@kraftman.dk]
Sendt dato: 10-08-2020 09:18
Modtaget Dato: 10-08-2020 09:18
Vedrørende: SV: SSK - Dørfarve/tegninger KS Skærbæk skole
Vedhæftninger: image011_55.png
image012_46.png
image013_27.png
image014_25.png
image015_17.png
image016_12.png
image017_9.jpg
image018_4.jpg
image019_1.jpg
image020_2.jpg
image021_3.png

Hej Henning.

Som Henrik nævner, så fremgår det af materialeskemaet. Se nedestående.

Foldevægge BD.nr. 327001	Mellem undervisningsrum iht. tegningsmateriale	100 mm tykke, dør i sidste fag, 48 dB Top/centrisk hængt uden gulvskinne	Hvid RAL 9016 Laminat Skal overholde brand- og lydkrav		
------------------------------------	--	--	--	--	--

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk]
Sendt: 10. august 2020 08:31
Til: Henning Skriver; Kim Kirkegaard Sørensen; 'Arne Borum Linnet'
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Esben Jessen; Johan Juul Larsen (johan@trehoeje.dk); Jesper S. Hansen
Emne: SV: SSK - Dørfarve/tegninger KS Skærbæk skole

Hej Henning

Se farve og materiale skema på Dalux.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Sendt: 10. august 2020 08:08
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; 'Arne Borum Linnet' <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>; Johan Juul Larsen (johan@trehoeje.dk) <johan@trehoeje.dk>; Jesper S. Hansen <jh@kraftman.dk>
Emne: SV: SSK - Dørfarve/tegninger KS Skærbæk skole

Hej henrik

Skal jeg bruge den fra udbud – mig bekendt lægger den ikke på dalux _ eller og mange ting er rettet siden den – herunder dørfarver – venligst oplys mig farvekode på mail

Skriver bygherre ikke 9006 – morten vil du bekræfte

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S

T: 74622060

F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Sendt: 10. august 2020 07:58

Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; 'Arne Borum Linnet' <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>; Johan Juul Larsen (johan@trehoeje.dk) <johan@trehoeje.dk>; Jesper S. Hansen <jh@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Dørfarve/tegninger KS Skærbæk skole

Farve på foldedøre – Se farve og materialeskema.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Sendt: 6. august 2020 14:28

Til: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; 'Arne Borum Linnet' <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>; Johan Juul Larsen (johan@trehoeje.dk) <johan@trehoeje.dk>; Jesper S. Hansen <jh@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Dørfarve/tegninger KS Skærbæk skole

Hej Alle

Farve modtaget og sat i ordre herunder

og vi bekræfter :

Dørskema Q som på nogle sider hedder: **R+P** også af 10.07.2020
Vinduesskema P som på nogle sider hedder: **O+C+N** også af 10.07.2020
Opstaltstegninger af 10.07.2020 **rev. A** – 4 stk (dog uden 47dB glas i døre) Disse er massive

Glasdøre fås ikke over 40dB
f.eks. er under type står der 44dB og under akutik 40dB – vi følger akutik kolone

vi forventer at nordbygning kan komme uge 37/38 – syd bygning ca. 3-4 uger efter

**NB – vi skal have gang i foldedøre jeg har endnu ikke modtaget en farve på dem ved arkitekten, har spurgt tidligere
Tænker også der er 6-8 ugers leveringstid på dem**

Med venlig hilsen

Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH

KRAFTMAN A/S

T: 74622060

F: 7462 2080



Solidt byggeri ...

www.kraftman.dk

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Sendt: 6. august 2020 13:48

Til: 'Arne Borum Linnet' <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; hv@friis-moltke.dk; Henning Skriver <hs@kraftman.dk>

Emne: SV: SSK - Dørfarve

Hej Arne og Henning

Hermed bekræftelse på at dørene må bestilles i nedenstående farver, Crystal white M3091 (Ral 9016) og Storm F7912 (Ral 7015).

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent

Ejendomme

Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Fra: Arne Borum Linnet [<mailto:al@fmbyggningsdrift.dk>]

Sendt: 6. august 2020 13:45

Til: Kim Kirkegaard Sørensen

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; hv@friis-moltke.dk; Henning Skriver

Emne: SSK - Dørfarve

Hej Kim

Kan du bekræfte at det er disse to farve at BH ønsker på dørene.

Crystal white M3091 (Ral 9016)

Storm F7912 (Ral 7015)

* Fulde ark
(3050mm x 1300mm)

M3091

Crystal White

Download prove JPG (3.91 kb)

Download fulde ark JPG (16.52 kb)

Notat:
Prøver fremstilles separat og kan derfor variere i farve fra det endelige produkt.
Rekvirer venligst en prøve af produktet, før du foretager det endelige valg.

Bestil Gratis Prove

Colour Match Info

LRV - 88.8 RAL - 9016

NCS - S 0300-N



F7912

Storm

 [Download prøve JPG \(13,23 kb\)](#)

 [Download fulde ark JPG \(21,84 kb\)](#)

Notat:

Prøver fremstilles separat og kan derfor variere i farve fra det endelige produkt.
Rekvirer venligst en prøve af produktet, før du foretager det endelige valg.

 [Bestil Gratis Prøve](#) 

Colour Match Info

LRV - 14,8

RAL - 7015

NCS - S 6502-B

Produkter som er tilgængelige

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnét

Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923

Mail: al@fmbygningsdrift.dk

Web: www.fmbygningsdrift.dk

FM Bygningsdrift

Logistik & Rådgivning

Hovedkontor:

FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:

FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

<p>Foldevægge BD.nr. 327001</p>	<p>Mellem undervisningsrum iht. tegningsmateriale</p>	<p>100 mm tykke, dør i sidste fag, 48 dB Top/centrisk hængt uden gulvskinne</p>	<p>Hvid RAL 9016 Laminat Skal overholde brand- og lydkrav</p>		
--	---	---	---	---	--













RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR




Solidt byggeri ...


4 Fulde ark
(3050mm x 1300mm)



M3091

Crystal White

 [Download prøve JPG \(3.91 kb\)](#)

 [Download fulde ark JPG \(16.52 kb\)](#)

Notat:

Prøver fremstilles separat og kan derfor variere i farve fra det endelige produkt.
Følg venligst en prøve af produktet, før du foretager det endelige valg.

 [Bestil Gratis Prøve](#)

Colour Match Info

LRV - 88.8

RAL - 9016


NCS - S 0300-N

* Fulde ark
(9050mm x 1300mm)



F7912

Storm

 [Download prøve JPG \(13,23 kb\)](#)

 [Download fulde ark JPG \(21,84 kb\)](#)

Notat:

Prøver fremstilles seperat og kan derfor variere i farve fra det endelige produkt. Bedes bedt om at bestille en prøve af produktet, før du foretager det endelige valg.

 [Bestil Gratis Prøve](#)

Colour Match Info

LRV - 14,8

RAL - 7015

NCS - S 6502-B

Produkter som er tilgængelige

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

5733234#0 - SV SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Fra: Lars Høi [lh@garant.nu]
Til: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]; Ingri B. Løvsbogen [ibl@friis-moltke.dk]; Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Arne Borum Linnet [al@fmbyggningsdrift.dk]
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Sendt dato: 10-08-2020 09:22
Modtaget Dato: 10-08-2020 09:22
Vedrørende: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020
Vedhæftninger: image001_15.gif
image002_581.png
image003_21.jpg
image004_594.png
image005_598.png
image006_155.png
image007_95.png
image008_66.png
image009_49.jpg

Hej Henrik

Jeg har brug for en [gulvplan](#), der viser de korrekte farver/dessin numre på gulvene.

Med venlig hilsen
Lars Høi



Tlf. 74 66 21 24
Mobil 20 27 38 10



Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Sendt: 10. august 2020 08:59
Til: Lars Høi <lh@garant.nu>; Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars

Se tidligere fremsendt farve/materiale oversigt. Oversigten ligger også på Dalux.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Lars Høi <lh@garant.nu>
Sendt: 10. august 2020 08:22
Til: Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Ingri og øvrige

Bygherre har ønsker om nogle forskellige farver.
Jeg har brug for en gulvplan, der viser de korrekte farver/dessin numre på gulvene.

5399

Med venlig hilsen
Lars Høi



Tlf. 74 66 21 24
Mobil 20 27 38 10



Fra: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Sendt: 5. august 2020 11:56
Til: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Lars Høi <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten/Lars,

Gulvplaner er opdateret, og bliver lagt på Dalux. De er også vedhæftet i denne mail sammen med Oplæg gulve.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvskogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ibl@friis-moltke.dk



 **Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail**
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!

Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Sendt: 3. august 2020 09:28
Til: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; 'Lars Høi' <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

Vi har rettet gulvene i det tidligere fremsendte til bygherre og Gulvlægger for at få en pris.
Vi mener godt at der kan gives en pris ud fra det vedhæftede.

Vi ville vendte med at bruge timer på at rette gulvplaner indtil der var en aftalt pris.

Vi retter gulvplanerne nu. 😊

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Sendt: 14. juli 2020 09:00
Til: 'Lars Høi' <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Det kan jeg godt se. Den jeg refererede til var også kun et oplæg.
@Henrik vil i få opdateret planerne når i er tilbage på kontoret?

Jeg får arrangeret et møde i slut uge 33.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Lars Høj [<mailto:lh@garant.nu>]

Sendt: 14. juli 2020 08:53

Til: Morten Bramstrup Jakobsen; Arne Borum Linnet

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; hv@friis-moltke.dk

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

De gulvplaner, der er på Dalux er ikke opdateret med farvenumre på linoleum. Der står stadig "gummi eller linoleum". Dem jeg kan finde er uploaded i marts måned, så de er ikke opdateret.

Jeg har brug for at tegningerne viser de rigtige dessinumre, ellers er det dømt til at gå galt.

Jeg går på ferie fra næste uge. Vi kan tage et møde slut uge 33/start uge 34, hvis det kan passe jer.

Med venlig hilsen

Lars Høj

Garant

FOR GULVE OG GARDINER
Høj Tæpper A/S, Rødebro

Tlf. 74 66 21 24

Mobil 20 27 38 10



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 14. juli 2020 08:41

Til: Lars Høj <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; hv@friis-moltke.dk

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Tak for din mail

Den opdateret plan skulle meget gerne være tilgængelig på Dalux.

Angående aftalesedlen mangler jeg stadig en opgørelse for de reelle "ekstra m²". – Jeg vil foreslå et dialogmøde, hvor vi gennemgår hvorfor I, og Friis og Moltke kommer frem til to forskellige mængder. Jeg skal selvfølgelig gerne underskrive den når parterne er enig.

Er det en acceptabel løsning for Jer?

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Lars Høi [<mailto:lh@garant.nu>]
Sendt: 14. juli 2020 08:37
Til: Morten Bramstrup Jakobsen; Arne Borum Linnet
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; hv@friis-moltke.dk
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

Jeg mangler stadig en opdateret gulvplan samt en aftaleseddel, så jeg kan få bestilt materialerne.
Arne: Hvordan ser tidsplanen ud for os?

Med venlig hilsen
Lars Høi



Tlf. 74 66 21 24
Mobil 20 27 38 10



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Sendt: 25. juni 2020 11:03
Til: Lars Høi <lh@garant.nu>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; hv@friis-moltke.dk
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Tak for det hurtige svar. Så tager vi den blå farve i delområderne. – Jeg tror Friis og Moltke er på sagen og får planen opdateret.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Lars Høi [<mailto:lh@garant.nu>]
Sendt: 25. juni 2020 11:01
Til: Morten Bramstrup Jakobsen
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

5402
Hej Morten

Der er ikke noget økonomi i at ændre farven.

Jeg vil meget gerne have en opdateret gulvplan hurtigst muligt (inden for en uge), så jeg kan få reserveret de forskellige mængder.

De prøver i har, må i gerne ligge i skurvognen på byggepladsen, så tager jeg dem med, når jeg engang skal til byggemøde.

Med venlig hilsen

Lars Høi

Garant

FOR GULVE OG GARDINER

Høi Tæpper A/S, Rødebro

Tlf. 74 66 21 24

Mobil 20 27 38 10



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 25. juni 2020 10:44

Til: Lars Høi <lh@garant.nu>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Emne: VS: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Lige et par ting ift. skolen i Skærbæk. Som du kan se af nedenstående korrespondance.

Skolen ønsker gerne at dele af gulvet, hvor det var tiltænkt blå bliver lavet med Linoflex Forbo 809, lys blå i stedet for den grønne. Er det muligt at få med og er der evt. merøkonomi forbundet med det?

Jeg får selvfølgelig Friis og Moltke til at opdatere, deres farveplan til dig. – Ellers ønskes de tre farver du har fremsendt.

Angående farveprøver samt katalog, skal jeg sende dem retur til dig?

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent

Ejendomme

Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Klaus Fog

Sendt: 25. juni 2020 08:26

Til: Thomas Ushus

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; Sune Bundesen

Emne: Gulve

Hej Thomas (cc Kim og Sune)

Vi har kigget en gang mere på gulvfarver efter, at det er blevet ændret til linoleum og alle væggene er blevet ændret til hvid farve. Vi kigger på at ændre gulvet i indskolingen på begge etager til Linofleks Forbo 809 (lyseblå farve). Vores indskoling hedder "Vadehavet" og mange af udsmykningerne vil nok være i den genre. Derfor passer det bedst med et blå gulv. De øvrige gulve fastholder vi. Har du nogle faglige kommentarer til det?

Venlig hilsen

Klaus Fog

Distriktsskoleleder

Skærbæk Distriktsskole

Tønder Kommune

Skolegade 19 - 6780 Skaerbæk

Tlf. +45 74 92 82 81 - E-mail klfo3@toender.dk



[<Logo>](#)

Garant
FOR GULVE OG GARDINER

















RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5736508#0 - SV:SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Lars Høi [lh@garant.nu]; Ingri B. Løvsbogen [ibl@friis-moltke.dk]; Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Arne Borum Linnet [al@fmbyggningsdrift.dk]
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Sendt dato: 10-08-2020 09:32
Modtaget Dato: 10-08-2020 09:32
Vedrørende: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020
Vedhæftninger: 20200629 Oplæg gulve_0.pdf
image001_18.gif
image002_935.png
image003_31.jpg
image004_954.png
image005_959.png
image006_239.png
image007_143.png
image008_109.png
image009_67.jpg
Screen Shot 08-10-20 at 09.31 AM.PNG

Hej Lars

Her er gulvplan med farver.

Vil du fremskaffe de viste farver som prøver og aflevere dem til bygherre.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Lars Høi <lh@garant.nu>
Sendt: 10. august 2020 09:23
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Henrik

Jeg har brug for en gulvplan, der viser de korrekte farver/dessin numre på gulvene.

Med venlig hilsen
Lars Høi

Garant
FOR GULVE OG GARDINER
Høi Tæpper A/S, Rødekre

Tlf. 74 66 21 24
Mobil 20 27 38 10



Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Sendt: 10. august 2020 08:59
Til: Lars Høi <lh@garant.nu>; Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

5414

Hej Lars

Se tidligere fremsendt farve/materiale oversigt. Oversigten ligger også på Dalux.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Lars Høi <lh@garant.nu>

Sendt: 10. august 2020 08:22

Til: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Ingri og øvrige

Bygherre har ønsker om nogle forskellige farver.
Jeg har brug for en gulvplan, der viser de korrekte farver/dessin numre på gulvene.

Med venlig hilsen

Lars Høi

Garant

FOR GULVE OG GARDINER

Høi Tæpper A/S, Rødebro

Tlf. 74 66 21 24

Mobil 20 27 38 10



Fra: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>

Sendt: 5. august 2020 11:56

Til: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Lars Høi <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten/Lars,

Gulvplaner er opdateret, og bliver lagt på Dalux. De er også vedhæftet i denne mail sammen med Oplæg gulve.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvskogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ibl@friis-moltke.dk

FRIIS & MOLTKE
ARCHITECTS

 Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!

Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Sendt: 3. august 2020 09:28

Til: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; 'Lars Høi' <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

Vi har rettet gulvene i det tidligere fremsendte til bygherre og Gulvlægger for at få en pris.

Vi mener godt at der kan gives en pris ud fra det vedhæftede.

Vi ville vendte med at bruge timer på at rette gulvplaner indtil der var en aftalt pris.

Vi retter gulvplanerne nu. 😊

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 14. juli 2020 09:00

Til: 'Lars Høi' <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Det kan jeg godt se. Den jeg refererede til var også kun et oplæg.
@Henrik vil i få opdateret planerne når i er tilbage på kontoret?

Jeg får arrangeret et møde i slut uge 33.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Lars Høi [<mailto:lh@garant.nu>]

Sendt: 14. juli 2020 08:53

Til: Morten Bramstrup Jakobsen; Arne Borum Linnet

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; hv@friis-moltke.dk

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

De gulvplaner, der er på Dalux er ikke opdateret med farvenumre på linoleum. Der står stadig "gummi eller linoleum". Dem jeg kan finde er uploaded i marts måned, så de er ikke opdateret.

Jeg har brug for at tegningerne viser de rigtige dessinumre, ellers er det dømt til at gå galt.

Jeg går på ferie fra næste uge. Vi kan tage et møde slut uge 33/start uge 34, hvis det kan passe jer.

Med venlig hilsen

Lars Høi

Garant

FOR GULVE OG GARDINER

Høi Tæpper A/S, Rødekrø

Tlf. 74 66 21 24

Mobil 20 27 38 10



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Sendt: 14. juli 2020 08:41
Til: Lars Høj <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnét <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; hv@friis-moltke.dk
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Tak for din mail

Den opdateret plan skulle meget gerne være tilgængelig på Dalux.
Angående aftalesedlen mangler jeg stadig en opgørelse for de reelle "ekstra m2". – Jeg vil foreslå et dialogmøde, hvor vi gennemgår hvorfor I, og Friis og Moltke kommer frem til to forskellige mængder. Jeg skal selvfølgelig gerne underskrive den når parterne er enig.

Er det en acceptabel løsning for Jer?

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Lars Høj [<mailto:lh@garant.nu>]
Sendt: 14. juli 2020 08:37
Til: Morten Bramstrup Jakobsen; Arne Borum Linnét
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; hv@friis-moltke.dk
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

Jeg mangler stadig en opdateret gulvplan samt en aftaleseddel, så jeg kan få bestilt materialerne.
Arne: Hvordan ser tidsplanen ud for os?

Med venlig hilsen
Lars Høj

Garant
FOR GULVE OG GARDINER
Høj Tæpper A/S, Rødekro

Tlf. 74 66 21 24
Mobil 20 27 38 10



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Sendt: 25. juni 2020 11:03
Til: Lars Høj <lh@garant.nu>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; hv@friis-moltke.dk
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Tak for det hurtige svar. Så tager vi den blå farve i delområderne. – Jeg tror Friis og Moltke er på sagen og får planen opdateret.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Lars Høi [<mailto:lh@garant.nu>]

Sendt: 25. juni 2020 11:01

Til: Morten Bramstrup Jakobsen

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

Der er ikke noget økonomi i at ændre farven.

Jeg vil meget gerne have en opdateret gulvplan hurtigst muligt (inden for en uge), så jeg kan få reserveret de forskellige mængder.

De prøver i har, må i gerne ligge i skurvognen på byggepladsen, så tager jeg dem med, når jeg engang skal til byggemøde.

Med venlig hilsen

Lars Høi

Garant

FOR GULVE OG GARDINER

Høi Tæpper A/S, Rødekre

Tlf. 74 66 21 24

Mobil 20 27 38 10



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 25. juni 2020 10:44

Til: Lars Høi <lh@garant.nu>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Emne: VS: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Lige et par ting ift. skolen i Skærbæk. Som du kan se af nedenstående korrespondance.

Skolen ønsker gerne at dele af gulvet, hvor det var tiltænkt blå bliver lavet med Linoflex Forbo 809, lys blå i stedet for den grønne. Er det muligt at få med og er der evt. mæøkonomi forbundet med det?

Jeg får selvfølgelig Friis og Moltke til at opdater, deres farveplan til dig. – Ellers ønskes de tre farver du har fremsendt.

Angående farveprøver samt katalog, skal jeg sende dem retur til dig?

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Klaus Fog
Sendt: 25. juni 2020 08:26
Til: Thomas Ushus
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; Sune Bundesen
Emne: Gulve

Hej Thomas (cc Kim og Sune)

Vi har kigget en gang mere på gulvfarver efter, at det er blevet ændret til linoleum og alle væggene er blevet ændret til hvid farve. Vi kigger på at ændre gulvet i indskolingen på begge etager til Linofleks Forbo 809 (lyseblå farve). Vores indskoling hedder "Vadehavet" og mange af udsmykningerne vil nok være i den genre. Derfor passer det bedst med et blå gulv. De øvrige gulve fastholder vi. Har du nogle faglige kommentarer til det?

Venlig hilsen

Klaus Fog
Distriktsskoleleder
Skærbæk Distriktsskole
Børn & Skole

Tønder Kommune
Skolegade 19 - 6780 Skærbæk
Tlf. +45 74 92 82 81 - E-mail kfo3@toender.dk



<Logo>


 FRIIS & MOLTKE
ARCHITECTS



SKÆRBÆK SKOLE
OPLÆG TIL GULVE OG FARVER
31.01.2020 REV. C - 29.06.2020

LINOLEUM:

FORBO LINO FLEX



BRUN 208



GRÅ 617



GRØN 407



LYS BLÅ 809


Læringsrum, fællesrum, finværksteder,
garderober, toiletter, personalerum

VINYLGULV:

FORBO SURESTEP ORIGINAL



171262 UMBER



171922 CONCRETE

Vådtrum - brusenicher og rengøringsrum

TRÆGULV:

HØJKANTSPARKET, EG



EG, NATUR

Administration, grovværksted

LAMELMÅTTER:

SOM EGE LAMELMÅTTER



TEKSTIL/ALU/GUMMI

Vindfang og garderobe indskoling

BETONGULV:

STØVBUNDET BETON



NATUR

Teknikrum, varmt depot/rengøring







Garant
FOR GULVE OG GARDINER

















RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

LINOLEUM:

FORBO LINO FLEX



BRUN 208



GRÅ 617



GRØN 407



LYS BLÅ 809


Læringsrum, fællesrum, finværksteder,
garderober, toiletter, personalerum

VINYLGULV:

FORBO SURESTEP ORIGINAL



171262 UMBER



171922 CONCRETE

Vådrom - brusenicher og rengøringsrum

TRÆGULV:

HØJKANTSPARKET, EG




EG, NATUR

Administration, grovværksted

LAMELMÅTTER:

SOM EGE LAMELMÅTTER



TEKSTIL/ALU/GUMMI

Vindfang og garderobe indskoling

BETONGULV:

STØVBUNDET BETON



NATUR

Teknikrum, varmt depot/rengøring

5736513#0 - SV SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Fra: Lars Høi [lh@garant.nu]
Til: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]; Ingri B. Løvsbogen [ibl@friis-moltke.dk]; Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Arne Borum Linnet [al@fmbyggningsdrift.dk]
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Sendt dato: 10-08-2020 09:40
Modtaget Dato: 10-08-2020 09:40
Vedrørende: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020
Vedhæftninger: image001_20.gif
image002_937.png
image003_33.jpg
image004_956.png
image005_961.png
image006_241.png
image007_145.png
image008_111.png
image009_69.jpg

Hej Henrik

Bygherre har allerede fået prøver.

Jeg tror du skal afklare med bygherre om det er jeres valg, der er gældende eller om det er deres valg. For jeg aner ikke hvad der op eller ned i det her...

Med venlig hilsen

Lars Høi

Garant

FOR GULVE OG GARDINER

Høi Tæpper A/S, Rødebro

Tlf. 74 66 21 24

Mobil 20 27 38 10



Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Sendt: 10. august 2020 09:32

Til: Lars Høi <lh@garant.nu>; Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars

Her er gulvplan med farver.

Vil du fremskaffe de viste farver som prøver og aflevere dem til bygherre.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Lars Høi <lh@garant.nu>

Sendt: 10. august 2020 09:23

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

5436
Hej Henrik

Jeg har brug for en gulvplan, der viser de korrekte farver/dessin numre på gulvene.

Med venlig hilsen
Lars Høi

Garant
FOR GULVE OG GARDINER
Høi Tæpper A/S, Rødekro

Tlf. 74 66 21 24
Mobil 20 27 38 10



Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Sendt: 10. august 2020 08:59

Til: Lars Høi <lh@garant.nu>; Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars

Se tidligere fremsendt farve/materiale oversigt. Oversigten ligger også på Dalux.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Lars Høi <lh@garant.nu>

Sendt: 10. august 2020 08:22

Til: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Ingri og øvrige

Bygherre har ønsker om nogle forskellige farver.

Jeg har brug for en gulvplan, der viser de korrekte farver/dessin numre på gulvene.

Med venlig hilsen
Lars Høi

Garant
FOR GULVE OG GARDINER
Høi Tæpper A/S, Rødekro

Tlf. 74 66 21 24
Mobil 20 27 38 10



Fra: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>

Sendt: 5. august 2020 11:56

Til: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Lars Høi <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten/Lars,

Gulvplaner er opdateret, og bliver lagt på Dalux. De er også vedhæftet i denne mail sammen med Oplæg gulve.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvsbogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ib@friis-moltke.dk



 **Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail**
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!

Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Sendt: 3. august 2020 09:28

Til: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; 'Lars Høi' <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

Vi har rettet gulvene i det tidligere fremsendte til bygherre og Gulvlægger for at få en pris.
Vi mener godt at der kan gives en pris ud fra det vedhæftede.

Vi ville vendte med at bruge timer på at rette gulvplaner indtil der var en aftalt pris.

Vi retter gulvplanerne nu. 😊

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 14. juli 2020 09:00

Til: 'Lars Høi' <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Det kan jeg godt se. Den jeg refererede til var også kun et oplæg.
@Henrik vil i få opdateret planerne når i er tilbage på kontoret?

Jeg får arrangeret et møde i slut uge 33.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Lars Høi [<mailto:lh@garant.nu>]

Sendt: 14. juli 2020 08:53

Til: Morten Bramstrup Jakobsen; Arne Borum Linnet

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; hv@friis-moltke.dk

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

De gulvplaner, der er på Dalux er ikke opdateret med farvenumre på linoleum. Der står stadig "gummi eller linoleum". Dem jeg kan finde er uploaded i marts måned, så de er ikke opdateret.

Jeg har brug for at tegningerne viser de rigtige dessinumre, ellers er det dømt til at gå galt.

Jeg går på ferie fra næste uge. Vi kan tage et møde slut uge 33/start uge 34, hvis det kan passe jer.

Med venlig hilsen

Lars Høi

Garant

FOR GULVE OG GARDINER
Høi Tæpper A/S, Rødekre

Tlf. 74 66 21 24

Mobil 20 27 38 10



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 14. juli 2020 08:41

Til: Lars Høi <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; hv@friis-moltke.dk

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Tak for din mail

Den opdateret plan skulle meget gerne være tilgængelig på Dalux.

Angående aftalesedlen mangler jeg stadig en opgørelse for de reelle "ekstra m2". – Jeg vil foreslå et dialogmøde, hvor vi gennemgår hvorfor I, og Friis og Moltke kommer frem til to forskellige mængder. Jeg skal selvfølgelig gerne underskrive den når parterne er enig.

Er det en acceptabel løsning for Jer?

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Lars Høi [<mailto:lh@garant.nu>]

Sendt: 14. juli 2020 08:37

Til: Morten Bramstrup Jakobsen; Arne Borum Linnet

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; hv@friis-moltke.dk

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

Jeg mangler stadig en opdateret gulvplan samt en aftaleseddel, så jeg kan få bestilt materialerne.

Arne: Hvordan ser tidsplanen ud for os?

Med venlig hilsen

Lars Høi



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Sendt: 25. juni 2020 11:03
Til: Lars Høi <lh@garant.nu>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; hv@friis-moltke.dk
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Tak for det hurtige svar. Så tager vi den blå farve i delområderne. – Jeg tror Friis og Moltke er på sagen og får planen opdateret.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Lars Høi [<mailto:lh@garant.nu>]
Sendt: 25. juni 2020 11:01
Til: Morten Bramstrup Jakobsen
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

Der er ikke noget økonomi i at ændre farven.

Jeg vil meget gerne have en opdateret gulvplan hurtigst muligt (inden for en uge), så jeg kan få reserveret de forskellige mængder.

De prøver i har, må i gerne ligge i skurvognen på byggepladsen, så tager jeg dem med, når jeg engang skal til byggemøde.

Med venlig hilsen
Lars Høi



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 25. juni 2020 10:44

Til: Lars Høi <lh@garant.nu>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Emne: VS: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Lige et par ting ift. skolen i Skærbæk. Som du kan se af nedenstående korrespondance.

Skolen ønsker gerne at dele af gulvet, hvor det var tiltænkt blå bliver lavet med Linoflex Forbo 809, lys blå i stedet for den grønne. Er det muligt at få med og er der evt. mærkonomi forbundet med det?

Jeg får selvfølgelig Friis og Moltke til at opdater, deres farveplan til dig. – Ellers ønskes de tre farver du har fremsendt.

Angående farveprøver samt katalog, skal jeg sende dem retur til dig?

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent

Ejendomme

Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Klaus Fog

Sendt: 25. juni 2020 08:26

Til: Thomas Ushus

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; Sune Bundesen

Emne: Gulve

Hej Thomas (cc Kim og Sune)

Vi har kigget en gang mere på gulvfarver efter, at det er blevet ændret til linoleum og alle væggene er blevet ændret til hvid farve. Vi kigger på at ændre gulvet i indskoling på begge etager til Linofleks Forbo 809 (lyseblå farve). Vores indskoling hedder "Vadehavet" og mange af udsmykningerne vil nok være i den genre. Derfor passer det bedst med et blå gulv. De øvrige gulve fastholder vi. Har du nogle faglige kommentarer til det?

Venlig hilsen

Klaus Fog

Distriktsskoleleder

Skærbæk Distriktsskole

Børn & Skole

Tønder Kommune

Skolegade 19 - 6780 Skærbæk

Tlf. +45 74 92 82 81 - E-mail klfo3@toender.dk



<Logo>

Garant
FOR GULVE OG GARDINER

















RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

5733266#0 SV: Skærbæk KS of TØNDER KOMMUNE EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DLOVKS

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen [mailto:kimkir@toender.dk]
Til: 'Johan Juul Larsen' [johan@trehoeje.dk]
Cc: 'Henning Skriver' [hs@kraftman.dk]; 'jh@kraftman.dk' [jh@kraftman.dk]; 'hv@friis-moltke.dk' [hv@friis-moltke.dk]; Sune Bundesen [sb32@toender.dk]; Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Arne Borum Linnet [al@fmbyggningsdrift.dk] [al@fmbyggningsdrift.dk]
Sendt dato: 10-08-2020 09:42
Modtaget Dato: 10-08-2020 09:42
Vedrørende: SV: Skærbæk KS - farve på indvendig døre
Vedhæftninger: Laminat farvekort.pdf
image003_591.png
image004_598.png
image005_602.png
image006_157.png
image007_96.png
image008_119.jpg
image012_48.png
image013_28.png
image014_6.jpg
image015_12.jpg
image016_13.png

Hej Johan

Hermed farver på de indvendig døre, ud fra den fremsendte laminat farvekort.

(Hvid) F2255 Polar White Colors S 0500-N Ral. 9016

(Antracit) F7912 Storm Colors S 6502-B Ral. 7015

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Fra: Johan Juul Larsen [mailto:johan@trehoeje.dk]
Sendt: 10. august 2020 09:03
Til: Kim Kirkegaard Sørensen
Cc: Henning Skriver; jh@kraftman.dk; hv@friis-moltke.dk
Emne: SV: Skærbæk KS

Hej Kim

Jeg tror I har udvalgt farver på laminat fra den forkerte oversigt fra Formica. Os dørproducenter bestiller fra deres Door Collection.

Den har jeg vedhæftet. Du ser farverne på side 10 og 11.

Vil I vende tilbage med de korrekte farver.

Tak

Med venlig hilsen

Johan Larsen

Ekstern salg

Mobil: +45 21251425

Mail: johan@trehoeje.dk



Fabriksvej 6, DK-6973 Ørnhøj
Tlf: +45 96926000
Web: www.trehoeje.dk



NYHED - vores nye produktguide er online

Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Sendt: 6. august 2020 13:51
Til: Johan Juul Larsen <johan@trehoeje.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>
Emne: Skærbæk KS

Med venlig hilsen

HENNING SKRIVER

KRAFTMAN A/S
T: 7462 2060

Se meget mere på https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k3eQN-0008XF-4C&i=57e1b682&c=toVSxLhoh9uFCr6U7qeBfyLL372Mi6u1qBNob7WypP6Ub-_2pWqVGuXthB-Fn6NoOnaOumxXhPBL5pqsWjmVklKyA0Dp4o1mXFikxmClhztWPbjdrWc0WTOTQKgm51woj94oPB815YfTHT_EDxjvkbMJ2VRry2rQXgVDC4uxdX78UKf2HaxOZNXNIBNosUaQBI8vbloNcfGFIVnq68GcQ

Start på videresendt besked:

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Dato: 6. august 2020 kl. 13.47.41 CEST
Til: Arne Borum Linnét <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>, "hv@friis-moltke.dk" <hv@friis-moltke.dk>, Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Emne: SV: SSK - Dørfarve

Hej Arne og Henning

Hermed bekræftelse på at dørene må bestilles i nedenstående farver, Crystal white M3091 (Ral 9016) og Storm F7912 (Ral 7015).

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Fra: Arne Borum Linnét [<mailto:al@fmbyggningsdrift.dk>]
Sendt: 6. august 2020 13:45
Til: Kim Kirkegaard Sørensen
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; hv@friis-moltke.dk; Henning Skriver
Emne: SSK - Dørfarve

Hej Kim

Kan du bekræfte at det er disse to farve at BH ønsker på dørene.

Crystal white M3091 (Ral 9016)
Storm F7912 (Ral 7015)



M3091

Crystal White

Download prøve .JPG (3,91 kb)

Download fulde ark .JPG (16,52 kb)

Notat:
Prøver fremstilles separat og kan derfor variere i farve fra det endelige produkt.
Rekvirer venligst en prøve af produktet, for du foretager det endelige valg.

Bestil Gratis Prøve

Colour Match Info

LRV - 88,8

RAL - 9016

NCS - S 0300-N



F7912

Storm

Download prøve .JPG (13,23 kb)

Download fulde ark .JPG (21,84 kb)

Notat:
Prøver fremstilles separat og kan derfor variere i farve fra det endelige produkt.
Rekvirer venligst en prøve af produktet, for du foretager det endelige valg.

Bestil Gratis Prøve

Colour Match Info

LRV - 14,8

RAL - 7015

NCS - S 6502-B

Produkter som er tilgængelige

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnét
Bygge- og projektleder

Mobilnr.: +45 2677 8923
Mail: al@fmbyggningsdrift.dk
Web: www.fmbyggningsdrift.dk

FM Byggningsdrift
Logistik & Rådgivning

Hovedkontor:
FM Byggningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:
FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg













RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR







4 Fulde ark
(3050mm x 1300mm)



M3091

Crystal White

 [Download prøve JPG \(3.91 kb\)](#)

 [Download fulde ark JPG \(16.52 kb\)](#)

Notat:

Prøver fremstilles separat og kan derfor variere i farve fra det endelige produkt.
Fåkvir venligst en prøve af produktet, før du foretager det endelige valg.

 [Bestil Gratis Prøve](#)

Colour Match Info

LRV - 88.8

RAL - 9016


NCS - S 0300-N


* Fulde ark
(9050mm x 1300mm)



F7912

Storm

 [Download prøve JPG \(13,23 kb\)](#)

 [Download fulde ark JPG \(21,84 kb\)](#)

Notat:

Prøver fremstilles seperat og kan derfor variere i farve fra det endelige produkt. Bedes bedt om at bestille en prøve af produktet, før du foretager det endelige valg.

 [Bestil Gratis Prøve](#)

Colour Match Info

LRV - 14,8

RAL - 7015

NCS - S 6502-B

Produkter som er tilgængelige

FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning



welcome



FORMICA® Door Collection



S466

WELCOME TO THE FORMICA® Door Collection

Formica® High Pressure Laminate, offers a practical solution for interior doors. Its inherent properties make it ideal for functional, high-traffic applications.

- Highly resistant to stains, impact, water and scratches
- Easy to maintain
- Hygienic and easy to clean
- Impervious to moisture
- Chemical Resistant
- FSC®, Greenguard and Carbon Trust certified as standard

The new **FORMICA® Door Collection** offers products with the strength and durability that your projects need to maintain their quality and beauty over time.



Chemical resistant



Postform Grade HGP



Flat bonding



Scratch resistant



Hygienic



Water resistant



Impact resistant



Stain resistant



- 186 decors, including 60 new introductions
- 4 sheet sizes specific to interior doors
- 4 surface finishes:
 - Matte 58™, Naturelle™, Linewood™, Puregrain™
- Magnetic Laminate for multifunctional surfaces
- Younique® by Formica Group customised visuals



PUREGRAIN™

PREMIUM FINISH by FORMICA GROUP

NEW

The timeless and premium finish **Puregrain™** brings the natural feel of lightly brushed or oiled woodgrains to your projects when your environments need a classic touch.

Refer to pages 14 - 17 for full sheet woodgrain structures and pages 12 and 13 for woodgrain samples.



NATURELLE™

PREMIUM FINISH by FORMICA GROUP

Naturelle™ provides a near natural woodgrain look with an elegant matt finish. **Naturelle™** is available as a premium finish on selected woodgrains.

Refer to availability table on pages 18 - 19 for details and page 12 - 13 for samples.



LINWOOD™

SURFACE FINISH by FORMICA GROUP

NEW

Velvety smooth to the touch, **Linwood™**, faithfully reflects the beauty of wire brushed or sandblasted woods in a variety of woodgrains. **Linwood™** is also available as a premium finish on 30 Colors.

*Refer to pages 14 - 17 for full sheet woodgrain structures and pages 12 and 13 for woodgrain samples.
Refer to availability table on pages 18 and 19 for details and page 13 for Linwood on Colors sample.*



MATTE 58™

SURFACE FINISH by FORMICA GROUP

Matte 58™ delivers a clean and modern look. **Matte 58™** is available on all Colors, Patterns and selected woodgrains.

Refer to availability table on pages 18 - 19 for details and page 10 - 11 for samples.


5469



INSPIRATION IS FINALLY YOURS

We take your image and encapsulate it into customised and personalised **Yunique® by Formica Group High Pressure Laminate**, to create exceptional and unique environments.

5470

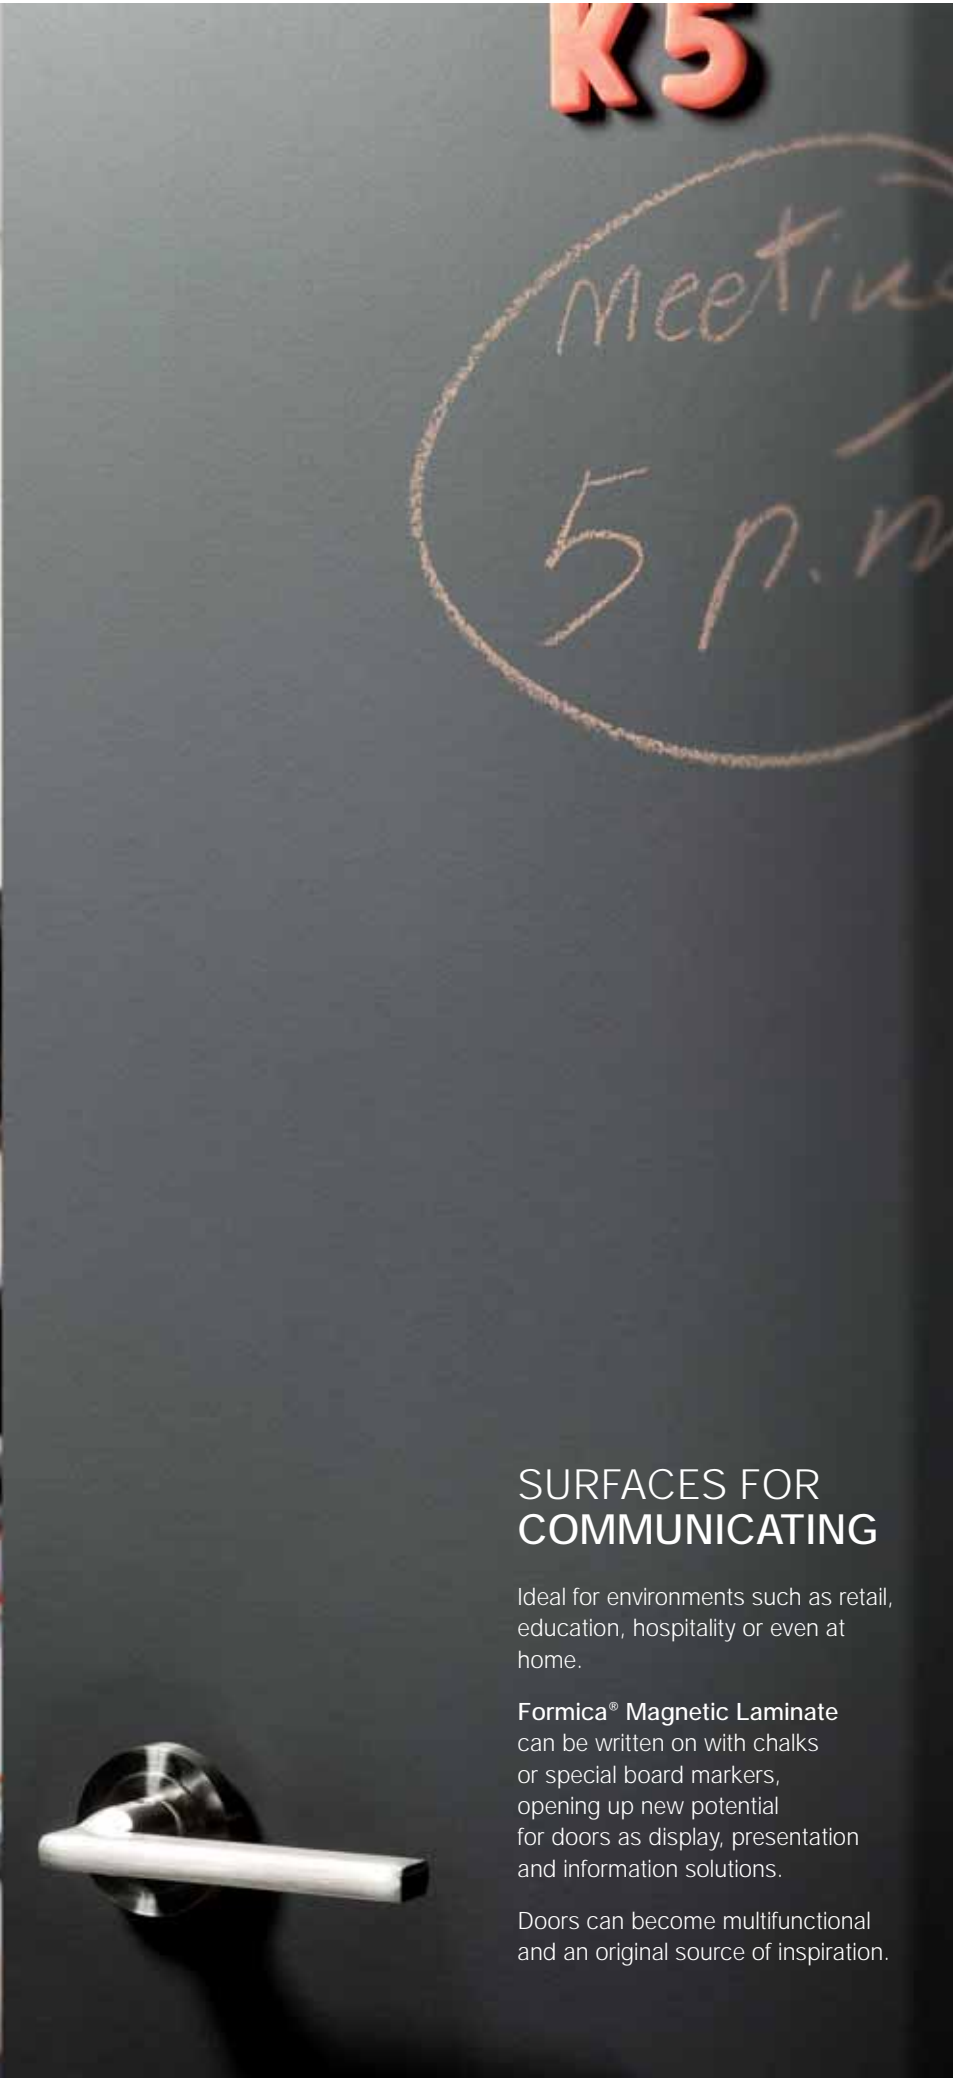

SURFACES FOR COMMUNICATING

Ideal for environments such as retail, education, hospitality or even at home.

Formica® Magnetic Laminate can be written on with chalks or special board markers, opening up new potential for doors as display, presentation and information solutions.

Doors can become multifunctional and an original source of inspiration.




5472

408


5473




F0949 White MAT* **NEW**




F2696 Super White MAT




F2255 Polar White MAT*



F1093 Aries MAT




F7934 Pearl MAT




F2001 Baikal MAT



F3091 Crystal White MAT




F2274 Blanc Polaire MAT




F2010 Malibu MAT




F7927 Folkestone MAT*



F7923 Surf MAT*



F2791 Silver MAT



F7938 Glacier MAT



F1484 Steel MAT




F1994 Fox MAT



F7961 Fog MAT*



F7902 Iron MAT



F7858 Pumice MAT*



F0189 Sparta MAT



F7924 Lead MAT



F1535 Tornado MAT



F7928 Mouse MAT



F2770 Sarum Grey MAT



F3202 Otter MAT



F7912 Storm MAT*



F2297 Terril MAT



F7837 Graphite MAT



F2253 Diamond Black MAT*



F9266 Citadel MAT



F5342 Earth MAT*



F3210 Levante MAT*



F5348 Energy MAT*



F8858 Just Rose MAT **NEW**



F2582 Lilac MAT



F0231 Peaceful Blue MAT



F1194 Iris MAT



F2962 Clementine MAT



F1238 Carnaval MAT*



F0232 Juicy Pink MAT



F0233 Heather MAT



F1019 Azur MAT



F7880 Thistle MAT



F2824 Blaze Red MAT



F7845 Spectrum Red MAT



F6907 Amarena MAT*



F5346 Orchid MAT



F1997 Oceano MAT



F4168 Campanula MAT



F6902 Grenadine MAT



F0188 Beaujolais MAT



F5345 Viola MAT*



F2483 Ultramarine MAT



F7851 Spectrum Blue MAT*



F2828 Tropical Blue MAT



F2005 Paprika MAT



F7966 New Burgundy MAT*



F6903 Cassis MAT*



F5323 Nocturne MAT **NEW**



F7969 Navy Blue MAT



F7914 Marine Blue MAT

					
F7949 Soft White	F1534 Magnolia	F1192 Porcelana	F1040 Alpino	F7932 Antique White	F2273 Seringa
					
F1531 Irish Cream	F2774 New Magnolia	F0547 Papyrus	F2296 Sno White	F0901 Gobi	F2833 Sandstone
					
F3050 Cygnet	F7929 Oyster Grey	F1532 Eldorado	F7882 Pale Gold	F7940 Spectrum Yellow	F1803 Tenere
					
F8751 Mojave	F0187 Kashmir	F0903 Cafe	F1485 Chrome Yellow	F3209 Sol	F4156 Caramel
					
F8757 Choco	F2200 Dark Chocolate	F8823 Patina	F8857 Just Gold	F4155 Sun	F4161 Terracotta
					
F8821 Just Blue	F5493 Arctic Blue	F5494 Aquamarine	F2966 Opal	F3236 Avocado	F5344 Seed
					
F5127 Monaco	F1998 Oslo	F1850 Fontana	F5349 Fossil	F8755 Lemon	F0800 Artichoke
					
F7884 China Blue	F5347 Maui	F7879 Dusty Jade	F7853 Ocean Grey	F4177 Lime	F5341 Wasabi
					
F8822 Denim	F4172 Caribbean	F1326 Capri	F7897 Spectrum Green	F6901 Vibrant Green	F3007 Pale Olive
					
F5175 Tahiti	F7846 Grotto	F2478 Bermuda	F7967 Hunter Green	F8820 Leaf Green	F5343 Possum

*All Colors available in Matte 58 surface finish as standard. In addition 30 Colors are available in Linewood™ surface finish, at a premium. See availability table on pages 10 and 11 for details.



F8841
White Ash NAT
NEW



F8841
White Ash MAT
NEW



F8839
Ashen Ribbonwood NAT
NEW



F8839
Ashen Ribbonwood MAT
NEW



F8006
Avignon Walnut NAT
NEW



F8006
Avignon Walnut MAT
NEW



F1079
Natural Oak LNW
NEW



F1079
Natural Oak NAT
NEW



F1079
Natural Oak MAT



F8853
Rural Oak PGN
NEW



F5887
Millennium Oak PGN
NEW



F5372
Vintage Wood MAT



F8966
Delano Oak PGN
NEW



F5483
Mocca Firwood LNW
NEW



F5483
Mocca Firwood MAT
NEW



F5883
Pecan Woodline NAT
NEW



F5883
Pecan Woodline MAT
NEW



F6052
Cottage Oak PGN
NEW




F6926
Smoky Walnut Woodline NAT



F6926
Smoky Walnut Woodline MAT
NEW



F5373
Nocturne Wood MAT



F5477
Ebony Oak Cross MAT




F8967
Logan Oak PGN
NEW




F8851
Classic Wenge LNW
NEW



F5488
Smoky Brown Pear LNW
NEW



F5488
Smoky Brown Pear NAT



F5488
Smoky Brown Pear MAT



F9012
Ebony LNW
NEW



F9012
Ebony NAT




F9012
Ebony MAT



F5884
Chestnut Woodline NAT
NEW



F5884
Chestnut Woodline MAT
NEW




F0873
Ebony Ribbonwood NAT
NEW



F0873
Ebony Ribbonwood MAT
NEW



F8848
Blackened Legno NAT
NEW



F8848
Blackened Legno MAT
NEW



F7555
Manitoba Maple MAT



F8843
Natural Ash NAT
NEW




F8843
Natural Ash MAT
NEW



F3855
Clear Maple MAT



F7921
Birch MAT



F7603
Bio-Oak MAT



F1143
French Sycamore MAT



F2726
Natural Beech MAT



F1297
American Maple MAT



F1062
Smoked Oak LNW
NEW



F1062
Smoked Oak NAT



F5370
Ivory Oak Cross MAT



F6930
Natural Cane NAT



F6930
Natural Cane MAT
NEW



F5374
Elegant Oak LNW
NEW



F5374
Elegant Oak NAT



F5374
Elegant Oak MAT
NEW



F5486
Classic Walnut MAT



F0190
Finn Beech MAT




F2884
Vosges Pear MAT



F6149
Light Oak MAT



F3699
Rattan Cane NAT



F3699
Rattan Cane MAT
NEW



F1139
Country Cherry MAT

Formica® Laminate

THE ORIGINAL HIGH PRESSURE LAMINATE by FORMICA GROUP

Woods



F5487 MAT
Oiled Walnut



F6932 NAT
Macchiato Walnut



F6932 MAT **NEW**
Macchiato Walnut



F1293 MAT
Redwood



F6209 MAT
Prestige Walnut



F1614 MAT
Punga Punga Wood



F5489 LNW **NEW**
Espresso Pear



F5489 NAT
Espresso Pear



F5489 MAT **NEW**
Espresso Pear

Formica® Laminate

THE ORIGINAL HIGH PRESSURE LAMINATE by FORMICA GROUP

Patterns



F0193 MAT
Xenon



F3735 MAT
Krypton



F3734 MAT
Radon



F8837 MAT **NEW**
Brushed Zinc



F8975 MAT **NEW**
Patina Brush




F8859 MAT **NEW**
Vintage Brush



F6305 MAT **NEW**
Limed Strand



F6307 MAT **NEW**
Burnt Strand



F6306 MAT **NEW**
Wenge Strand



F0202 MAT
Light Gauze



F7708 MAT
Flax Gauze




F5583 MAT
Steel Metal



F5270 MAT **NEW**
Geo White




F5272 MAT **NEW**
Geo Folkestone



F5273 MAT **NEW**
Geo Citadel



F5281 MAT **NEW**
Dogbone White



F5280 MAT **NEW**
Dogbone Grey



F5283 MAT **NEW**
Dogbone Storm

Formica® Magnetic Laminate

SURFACES FOR COMMUNICATING by FORMICA GROUP



M3091 MNL
Crystal White



M2253 MNL
Diamond Black

A non-decorative magnetic board M4702, (unspecified finish), is also available, that can be used to add magnetic properties to almost any thin, decorative laminate from the Formica Door Collection.

LINWOOD™

SURFACE FINISH by FORMICA GROUP



F0949 LNW **NEW**
White

30 Colors are available in Linewood™ surface finish, at a premium. See availability table for details.

Younique®

DESIGN A LAMINATE by FORMICA GROUP



MAT



F8841 White Ash **NEW**



F8839 Ashen Ribbonwood **NEW**



F8006 Avignon Walnut **NEW**



F8966 Delano Oak **NEW**



F1079 Natural Oak




F7603 Bio-Oak



F1062 Smoked Oak



F8853 Rural Oak **NEW**

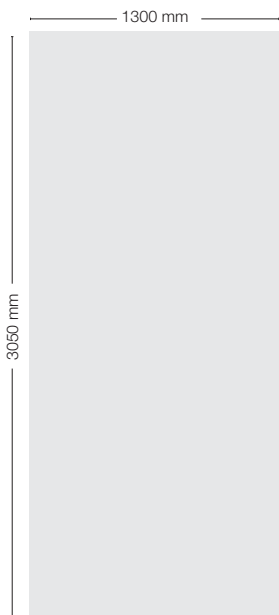

F6926 Smoky Walnut Woodline



F5372 Vintage Wood



F5483 Mocca Firwood **NEW**



F7555 Manitoba Maple



F8843 Natural Ash **NEW**



F6930 Natural Cane



F8967 Logan Oak **NEW**



F6932 Macchiato Walnut



F5487 Oiled Walnut



F9012 Ebony



F5489 Espresso Pear



F5488 Smoky Brown Pear



F5373 Nocturne Wood



F5477 Ebony Oak Cross



F0873 Ebony Ribbonwood **NEW**

5479

Woodgrain layouts shown on this page are provided for guidance only.
To see the colour and sample in 1:1 scale please refer to the actual product samples on pages 12 and 13.
Full sheet sizes are represented in 3050 x 1300 mm.



F1143 French Sycamore



F2726 Natural Beech



F3855 Clear Maple



F5370 Ivory Oak Cross



F7921 Birch




F1297 American Maple



F0190 Finn Beech



F5374 Elegant Oak

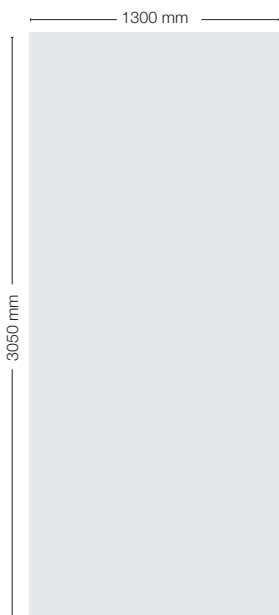

F5486 Classic Walnut



F5883 Pecan Woodline **NEW**



F5887 Millennium Oak **NEW**



F6149 Light Oak



F3699 Rattan Cane



F2884 Vosges Pear



F1139 Country Cherry



F1293 Redwood



F6052 Cottage Oak **NEW**



F5884 Chestnut Woodline **NEW**



F8851 Classic Wenge **NEW**



F8848 Blackened Legno **NEW**



F6209 Prestige Walnut



F1614 Punga Punga Wood

5481

Woodgrain layouts shown on this page are provided for guidance only.
To see the colour and sample in 1:1 scale please refer to the actual product samples on pages 12 and 13.
Full sheet sizes are represented in 3050 x 1300 mm.

FORMICA® Door Collection


Code	Name	Range	NCS*	RAL*	Light reflectance value	Sheet size (mm)	
						2150 x 950 / 2350 x 950 / 2350 x 1300	3050 x 1300
						Grade HGS	Grade HGP
F0157	Tahiti	Colors	S 4550-R90B	5010	11.4	MAT	MAT
F0187	Kashmir	Colors	S 5010-Y30R		25.6	LNW / MAT	LNW / MAT
F0188	Beaujolais	Colors	S 3060-R	3003	12.0	MAT	MAT
F0189	Sparta	Colors	S 3502-B	7040	39.1	MAT	MAT
F0190	Finn Beech	Woods			40.8	MAT	MAT
F0193	Xenon	Patterns			47.2	MAT	MAT
F0202	Light Gauze	Patterns			64.6	MAT	MAT
F0231	Peaceful Blue	Colors	S 1030-R80B		55.7	MAT	MAT
F0232	Juicy Pink	Colors	S 1060-R20B	4003	23.7	MAT	MAT
F0233	Heather	Colors	S 2030-R50B		44.8	MAT	MAT
F0547	Papyrus	Colors	S 1010-Y20R	1015	77.5	MAT	MAT
F0800	Artichoke	Colors	S 2020-G80Y	1000	48.6	MAT	MAT
F0873	Ebony Ribbonwood	Woods			9.1	MAT / NAT	MAT / NAT
F0901	Gobi	Colors	S 1010-Y30R		72.1	MAT	MAT
F0903	Cafe	Colors	S 3020-Y20R		39.0	MAT	MAT
F0949	White	Colors	S 0502-R50B		81.5	LNW / MAT	LNW / MAT
F1019	Azur	Colors	S 2040-R80B		36.7	MAT	MAT
F1040	Alpino	Colors	S 0502-G50Y	9010	86.9	MAT	MAT
F1062	Smoked Oak	Woods			31.7	LNW / NAT	LNW / NAT
F1079	Natural Oak	Woods			49.0	LNW / NAT	LNW / NAT
F1093	Aries	Colors	S 1500-N		66.2	MAT	MAT
F1139	Country Cherry	Woods			21.0	MAT	MAT
F1143	French Sycamore	Woods			58.6	MAT	MAT
F1192	Porcelana	Colors	S 0505-Y20R	1013	81.4	MAT	MAT
F1194	Iris	Colors	S 1020-R90B		63.3	MAT	MAT
F1238	Carnaval	Colors	S 1580-Y90R	3001	15.7	LNW / MAT	LNW / MAT
F1293	Redwood	Woods			12.7	MAT	MAT
F1297	American Maple	Woods			39.3	MAT	MAT
F1326	Capri	Colors	S 3030-B70G		31.2	MAT	MAT
F1484	Steel	Colors	S 3005-R80B	7040	42.6	MAT	MAT
F1485	Chrome Yellow	Colors	S 1060-Y	1018	65.6	MAT	MAT
F1531	Irish Cream	Colors	S 1005-Y50R		74.2	MAT	MAT
F1532	Eldorado	Colors	S 1020-Y20R	1014	61.2	MAT	MAT
F1534	Magnolia	Colors	S 0502-Y50R		78.3	MAT	MAT
F1535	Tornado	Colors	S 4500-N	7036	32.3	MAT	MAT
F1614	Punga Punga Wood	Woods			8.0	MAT	MAT
F1803	Tenere	Colors	S 1040-Y10R		63.0	MAT	MAT
F1850	Fontana	Colors	S 2010-B90G		57.0	MAT	MAT
F1994	Fox	Colors	S 3500-N	7004	42.4	MAT	MAT
F1997	Oceano	Colors	S 3050-R80B		17.9	MAT	MAT
F1998	Oslo	Colors	S 3020-B		33.9	MAT	MAT
F2001	Baikal	Colors	S 1502-Y	9002	67.6	MAT	MAT
F2005	Paprika	Colors	S 4050-Y80R		12.7	MAT	MAT
F2010	Malibu	Colors	S 1000-N		77.7	MAT	MAT
F2200	Dark Chocolate	Colors	S 8005-Y80R	8017	9.0	LNW / MAT	LNW / MAT
F2253	Diamond Black	Colors	S 9000-N	9011	6.7	LNW / MAT	LNW / MAT
M2253	Diamond Black	Formica® Magnetic	S 9000-N	9011	6.7		MNL* (2440 x 1220 / 3050 x 1220)
F2255	Polar White	Colors	S 0500-N	9016	85.7	LNW / MAT	LNW / MAT
F2273	Seringa	Colors	S 1010-Y30R	1015	70.7	MAT	MAT
F2274	Blanc Polaire	Colors	S 0502-B	9003	82.8	MAT	MAT
F2296	Sno White	Colors	S 0502-Y	9010	85.8	MAT	MAT
F2297	Terri	Colors	S 7502-B	7016	9.6	MAT	MAT
F2478	Bermuda	Colors	S 3050-B30G	5021	20.2	MAT	MAT
F2483	Ultramarine	Colors	S 4550-R70B	5022	9.3	MAT	MAT
F2582	Lilac	Colors	S 1020-R70B		59.7	MAT	MAT
F2696	Super White	Colors	S 0505-R70B		81.2	MAT	MAT
F2726	Natural Beech	Woods			55.0	MAT	MAT
F2770	Sarum Grey	Colors	S 4502-Y		30.5	MAT	MAT
F2774	New Magnolia	Colors	S 1005-Y30R	1013	73.1	MAT	MAT
F2791	Silver	Colors	S 1002-Y	9002	68.9	MAT	MAT
F2824	Blaze Red	Colors	S 1080-Y80R	2002	20.4	MAT	MAT
F2828	Tropical Blue	Colors	S 3060-R90B		18.3	MAT	MAT
F2833	Sandstone	Colors	S 2010-Y30R		57.8	MAT	MAT
F2884	Vosges Pear	Woods			25.2	MAT	MAT
F2962	Clementine	Colors	S 1080-Y70R	2009	26.2	MAT	MAT
F2966	Opal	Colors	S 1010-G10Y		66.6	MAT	MAT
F3007	Pale Olive	Colors	S 3020-G60Y		39.5	MAT	MAT
F3050	Cygnat	Colors	S 2005-Y40R		59.3	MAT	MAT
F3091	Crystal White	Colors	S 0300-N	9016	88.8	MAT	MAT
M3091	Crystal White	Formica® Magnetic	S 0300-N	9016	88.8		MNL* (2440 x 1220 / 3050 x 1220)
F3202	Otter	Colors	S 4005-Y20R		34.4	MAT	MAT
F3209	Sol	Colors	S 0560-Y20R	1017	56.1	MAT	MAT
F3210	Levarite	Colors	S 1070-Y40R	2011	37.1	LNW / MAT	LNW / MAT
F3236	Avocado	Colors	S 0530-G50Y		73.8	MAT	MAT
F3699	Rattan Cane	Woods			23.7	MAT / NAT	MAT / NAT
F3734	Radon	Patterns			18.7	MAT	MAT
F3735	Krypton	Patterns			35.3	MAT	MAT
F3855	Clear Maple	Woods			52.2	MAT	MAT
F4155	Sun	Colors	S 0580-Y30R	1028	49.7	MAT	MAT
F4156	Caramel	Colors	S 2040-Y30R		45.4	MAT	MAT
F4161	Terracotta	Colors	S 3040-Y60R		27.9	MAT	MAT
F4168	Campanula	Colors	S 1550-R80B		29.4	MAT	MAT
F4172	Caribbean	Colors	S 2050-B20G		35.2	MAT	MAT
F4177	Lime	Colors	S 1040-G50Y		56.6	LNW / MAT	LNW / MAT
M4702	Magn. Board Sanded Both Sides	Formica® Magnetic					UNS* (2440 x 1220 / 3050 x 1220)
F5127	Monaco	Colors	S 1050-R90B		36.8	MAT	MAT
F5270	Geo White	Patterns			69.1	MAT	MAT
F5272	Geo Folkestone	Patterns			43.9	MAT	MAT
F5273	Geo Citadel	Patterns			16.4	MAT	MAT
F5280	Dogbone Grey	Patterns			69.7	MAT	MAT
F5281	Dogbone White	Patterns			71.5	MAT	MAT
F5283	Dogbone Storm	Patterns			11.0	MAT	MAT
F5323	Nocturne	Colors	S 8010-R70B	5004	6.5	MAT	MAT

* M3091 Crystal White, M2253 Diamond Black and M4702 Magnetic Board Sanded Both Sides are only available in sizes 2440 x 1220 and 3050 x 1220 mm in grade MLB.

Code	Name	Range	NCS®	RAL®	Light reflectance value	Sheet size (mm)	
						2150 x 950 / 2350 x 950 / 2350 x 1300	3050 x 1300
						Grade HGS	Grade HGP
F5341	Wasabi	Colors	S 2040-G80Y		49.8		MAT
F5342	Earth	Colors	S 6005-Y20R	7006	20.0		LNW / MAT
F5343	Possum	Colors	S 5005-G80Y		27.3		MAT
F5344	Seed	Colors	S 3005-G80Y	7032	46.7		LNW / MAT
F5345	Viola	Colors	S 5040-R30B		9.6		LNW / MAT
F5346	Orchid	Colors	S 3040-R40B		24.1		MAT
F5347	Maui	Colors	S 2030-B30G		42.1		LNW / MAT
F5348	Energy	Colors	S 1070-Y90R		23.9		LNW / MAT
F5349	Fossil	Colors	S 3005-B80G		42.9		LNW / MAT
F5370	Ivory Oak Cross	Woods			43.8		MAT
F5372	Vintage Wood	Woods			25.2		MAT
F5373	Nocturne Wood	Woods			14.7		MAT
F5374	Elegant Oak	Woods			35.0		LNW / MAT / NAT
F5477	Ebony Oak Cross	Woods			11.4		MAT
F5483	Mocca Firwood	Woods			32.0		LNW
F5486	Classic Walnut	Woods			30.5		MAT
F5487	Oiled Walnut	Woods			18.6		MAT
F5488	Smoky Brown Pear	Woods			14.8		LNW / MAT / NAT
F5489	Espresso Pear	Woods			9.8		LNW / MAT / NAT
F5493	Arctic Blue	Colors	S 0510-R90B		71.8		MAT
F5494	Aquamarine	Colors	S 0510-B90G		77.1		MAT
F5583	Steel Metal	Patterns			22.9		MAT
F5883	Pecan Woodline	Woods			27.4		MAT / NAT
F5884	Chestnut Woodline	Woods			13.9		MAT / NAT
F5887	Millennium Oak	Woods			26.7		PGN
F6052	Cottage Oak	Woods			17.9		PGN
F6149	Light Oak	Woods			29.0		MAT
F6209	Prestige Walnut	Woods			8.8		MAT
F6305	Limed Strand	Patterns			66.7		MAT
F6306	Wenge Strand	Patterns			11.0		MAT
F6307	Burnt Strand	Patterns			15.1		MAT
F6901	Vibrant Green	Colors	S 2060-G30Y	6018	32.1		LNW / MAT
F6902	Grenadine	Colors	S 3060-Y80R	3016	16.2		MAT
F6903	Cassis	Colors	S 6030-R50B		9.8		LNW / MAT
F6907	Amarena	Colors	S 3050-R30B	4006	14.3		LNW / MAT
F6926	Smoky Walnut Woodline	Woods			22.3		MAT / NAT
F6930	Natural Cane	Woods			49.1		MAT / NAT
F6932	Macchiato Walnut	Woods			15.8		MAT / NAT
F7555	Manitoba Maple	Woods			62.0		MAT
F7603	Bio-Oak	Woods			43.0		MAT
F7708	Flax Gauze	Patterns			51.5		MAT
F7837	Graphite	Colors	S 8000-N	8019	10.8		MAT
F7845	Spectrum Red	Colors	S 2070-R	3001	15.9		MAT
F7846	Grotto	Colors	S 5030-B10G		18.3		MAT
F7851	Spectrum Blue	Colors	S 3060-R80B		13.4		LNW / MAT
F7853	Ocean Grey	Colors	S 3010-G20Y		37.0		MAT
F7858	Pumice	Colors	S 2005-Y20R		60.0		LNW / MAT
F7879	Dusty Jade	Colors	S 3020-B50G		42.5		MAT
F7880	Thistle	Colors	S 3010-R80B		39.5		MAT
F7882	Pale Gold	Colors	S 1020-Y		71.2		MAT
F7884	China Blue	Colors	S 3020-R90B		34.7		MAT
F7897	Spectrum Green	Colors	S 3050-G	6024	20.3		MAT
F7902	Iron	Colors	S 3502-Y		43.9		MAT
F7912	Storm	Colors	S 6502-B	7015	14.8		LNW / MAT
F7914	Marine Blue	Colors	S 6030-R80B	5003	9.2		MAT
F7921	Birch	Woods			52.2		MAT
F7923	Surf	Colors	S 1502-Y	9002	69.4		LNW / MAT
F7924	Lead	Colors	S 5010-R90B		25.4		MAT
F7927	Folkestone	Colors	S 2500-N		53.5		LNW / MAT
F7928	Mouse	Colors	S 5000-N	7037	25.0		MAT
F7929	Oyster Grey	Colors	S 2005-Y50R		48.1		MAT
F7932	Antique White	Colors	S 0804-Y30R		81.6		LNW / MAT
F7934	Pearl	Colors	S 1002-Y	9002	73.7		MAT
F7938	Glacier	Colors	S 1502-B		63.9		MAT
F7940	Spectrum Yellow	Colors	S 1070-Y10R	1023	54.5		LNW / MAT
F7949	Soft White	Colors	S 0500-N	9016	86.2		MAT
F7961	Fog	Colors	S 4000-N	7004, 7036	37.0		LNW / MAT
F7966	New Burgundy	Colors	S 5040-R	3004	9.8		LNW / MAT
F7967	Hunter Green	Colors	S 7020-G	6005	10.6		MAT
F7969	Navy Blue	Colors	S 7020-R80B	5013	8.3		MAT
F8006	Avignon Walnut	Woods			35.4		MAT / NAT
F8751	Mojave	Colors	S 3010-Y30R		40.9		MAT
F8755	Lemon	Colors	S 1060-G60Y		56.3		LNW / MAT
F8757	Chocco	Colors	S 6010-Y50R		16.7		MAT
F8820	Leaf Green	Colors	S 3040-G50Y		33.6		MAT
F8821	Just Blue	Colors	S 2020-R90B		45.2		LNW / MAT
F8822	Denim	Colors	S 5030-R90B		16.1		LNW / MAT
F8823	Patina	Colors	S 6020-Y30R	8007, 8025	14.0		MAT
F8837	Brushed Zinc	Patterns			37.0		MAT
F8839	Ashen Ribbonwood	Woods			43.0		MAT / NAT
F8841	White Ash	Woods			69.7		MAT / NAT
F8843	Natural Ash	Woods			53.3		MAT / NAT
F8848	Blackened Legno	Woods			8.0		MAT / NAT
F8851	Classic Wenge	Woods			9.4		LNW
F8853	Rural Oak	Woods			32.9		PGN
F8857	Just Gold	Colors	S 2040-Y	1012	48.5		LNW / MAT
F8858	Just Rose	Colors	S 1010-R10B		65.7		MAT
F8859	Vintage Brush	Patterns			25.0		MAT
F8966	Delano Oak	Woods			31.5		PGN
F8967	Logan Oak	Woods			14.5		PGN
F8975	Patina Brush	Patterns			21.0		MAT
F9012	Ebony	Woods			9.1		LNW / NAT
F9266	Citadel	Colors	S 6502-Y		18.6		MAT

5483


All Younique® laminates are only available in sizes 2440 x 1220 and 3050 x 1300 mm in MAT surface finish.



Formica® Laminate

THE ORIGINAL HIGH PRESSURE LAMINATE by FORMICA GROUP

Formica® High Pressure Laminate (HPL) is manufactured through fusing multiple layers of impregnated paper under high pressure and temperature to create a hard wearing, durable and hygienic surfacing material. The Formica® Colors, Patterns and Woods ranges are high pressure laminates which are available in horizontal, general purpose, standard grade, (HGS), and horizontal, general purpose, postforming grade, (HGP) as standard. Flame retardant HPL (VFP grade) is also available on request.




Formica® Magnetic Laminate

SURFACES FOR COMMUNICATING by FORMICA GROUP

Formica® Magnetic Laminate is a decorative laminate with all the benefits and assured quality of traditional Formica® laminate but with added advantages ideal for communication and display. Formica Magnetic Laminate helps to create practical, fun and functional spaces at home, at school or in the workplace. Carefully selected colours and a mix of surface finishes combine to offer a wide variety of applications and uses in environments such as retail, education, commercial and residential.

All achieve a very high magnetic effect and can be written on with chalks or special board markers, making them ideal for use as display, presentation and information boards. They can also provide the perfect backdrop for visual display projection.

A non-decorative magnetic board M4702 (unspecified finish) is also available, that can be used to add magnetic properties to almost any thin decorative laminate from the Formica® Door Collection.



Younique®

DESIGN A LAMINATE by FORMICA GROUP

Younique® by Formica Group is a High Pressure Laminate with a customised, printed image as its decorative face. The printed image in Younique laminates is incorporated in the laminate structure and not just printed on the surface; this affords a much greater resistance to damage and ease of maintenance. Younique laminates can be either single sided, thin High Pressure Laminate, or Compact in single sided or double sided format in varying thicknesses.

All Younique projects are priced on volume and complexity. For further information on sizes, pricing quotes, lead-time, file transfer options, etc. go to www.formica.com or contact your local Formica Group sales office or representative.

Performance Features



Chemical resistant



Impact resistant



Water resistant



Hygienic



Flat bonding



Postform Grade HGP



Stain resistant



Scratch resistant

The performance features icons are for general reference only. For more specific product information, including technical data and warranties please refer to www.formica.com (Knowledge).

Surface Finish & Grade Matrix

Surface Finish Description	Surface Finish Designation	Surface Finish Code	Grade	Grade Code
Linewood™ NEW	LNW	LW	HGP / HGS	02 / 01
Magnetic Matt	MNL	MN	MLB	M5
Matte 58™	MAT	58	HGP / HGS	02 / 01
Naturelle™	NAT	NT	HGP / HGS	02 / 01
Puregrain™ NEW	PGN	35	HGP / HGS	02 / 01
Unspecified Finish	UNS	99	MLB	M5

Grade	Grade Description	Nominal thickness (mm)
HGP	Horizontal, General purpose, Postforming	0.7
HGS	Horizontal, General purpose, Standard	0.7
MLB	Magnetic Laminate Standard	1.0

K to F Code Conversion

Previous K Code	Name	New F Code
K1019	Azur	F1019
K1031	Papyrus	F0547
K1040	Alpino	F1040
K1093	Aries	F1093
K1097	Citadel	F9266
K1181	Irish Cream	F1531
K1192	Porcelana	F1192
K1194	Iris	F1194
K1238	Carnaval	F1238
K1301	Gobi	F0901
K1326	Capri	F1326
K1394	Tahiti	F0157
K1834	Kashmir	F0187
K1850	Fontana	F1850
K1871	Monaco	F5127
K1902	Eldorado	F1532
K1903	Cafe	F0903
K1962	Magnolia	F1534
K1994	Fox	F1994
K1997	Oceano	F1997
K1998	Oslo	F1998
K2001	Baikal	F2001
K2005	Paprika	F2005
K2010	Malibu	F2010
K2020	Tornado	F1535
K2022	Tenere	F1803
K2046	Beaujolais	F0188
K2081	Sparta	F0189
K3202	Otter	F3202
K3209	Sol	F3209
K3210	Levante	F3210
K3236	Avocado	F3236
K3734	Radon	F3734
K3735	Krypton	F3735
K3737	Xenon	F0193
K6583	Steel Metal	F5583
K6149	Light Oak	F6149
K7016	Finn Beech	F0190
K7024	Birch	F7921
K7555	Manitoba Maple	F7555
K7603	Bio-Oak	F7603





5485

Austria

Tel: +49 (0) 180 367 64 22
austria@formica.com

Belgium

Tel: +32 2 705 18 18
contact.belgie@formica.com

Denmark

Tel: +45 43 58 82 00
info.danmark@formica.com

Finland

Tel: +358 3 5800 200
info.finland@formica.com

France

Tel: +33 (0) 3 87 29 10 13
service.echantillons@formica.com

Germany

Tel: +49 (0) 180 367 64 22
kontakt.deutschland@formica.com

Holland

Tel: +31 (0) 70 413 48 20
contact.nederland@formica.com

Ireland

Tel: +353 1 872 4322
samples.uk@formica.com

Italy

Tel: +39 068 7502115
italia@formica.com

Middle East

Tel: +971 4 329 82 80
middle.east@formica.com

Morocco

Tel: +212 (0) 522472047
administration.maroc@formica.com

Norway

Tel: +47 800 13 016
info.norge@formica.com

Poland

Tel: +48 22 516 20 84/85
info.polska@formica.com

Russia

Tel: +7 495 646 07 25
Samples tel: +8 800 333 11 63
russia@formica.com

Spain

Tel: + 34 96 122 07 01 (opción 2)
contact.es@formica.com
muestras@formica.com

Sweden

Tel: +46 42 38 48 00
info.sverige@formica.com

Switzerland

Tel: +41 44 818 88 18
schweiz@formica.com

United Kingdom

Tel: +44 191 259 3100
Samples tel: +44 191 259 3512
samples.uk@formica.com

formica.com



5736509#0 - SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Lars Høi [lh@garant.nu]; Ingri B. Løvsbogen [ibl@friis-moltke.dk]; Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]; Arne Borum Linnet [al@fmbyggningsdrift.dk]; Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]; Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Sendt dato: 10-08-2020 09:46
Modtaget Dato: 10-08-2020 09:46
Vedrørende: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020
Vedhæftninger: 20200629 Oplæg gulve_1.pdf
image001_19.gif
image002_936.png
image003_32.jpg
image004_955.png
image005_960.png
image006_240.png
image007_144.png
image008_110.png
image009_68.jpg
Screen Shot 08-10-20 at 08.06 AM.PNG

Hej Kim & Morten

Har i lavet om på farverne jf. vedhæftede ?

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Lars Høi <lh@garant.nu>
Sendt: 10. august 2020 09:40
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Henrik

Bygherre har allerede fået prøver.

Jeg tror du skal afklare med bygherre om det er jeres valg, der er gældende eller om det er deres valg. For jeg aner ikke hvad der op eller ned i det her...

Med venlig hilsen

Lars Høi

Garant
FOR GULVE OG GARDINER

Høi Tæpper A/S, Rødekro

Tlf. 74 66 21 24

Mobil 20 27 38 10



Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Sendt: 10. august 2020 09:32

Til: Lars Høi <lh@garant.nu>; Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

5487

Hej Lars

Her er gulvplan med farver.

Vil du fremskaffe de viste farver som prøver og aflevere dem til bygherre.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Lars Høi <lh@garant.nu>

Sendt: 10. august 2020 09:23

Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Henrik

Jeg har brug for en gulvplan, der viser de korrekte farver/dessin numre på gulvene.

Med venlig hilsen

Lars Høi

Garant

FOR GULVE OG GARDINER

Høi Tæpper A/S, Rødekro

Tlf. 74 66 21 24

Mobil 20 27 38 10



Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Sendt: 10. august 2020 08:59

Til: Lars Høi <lh@garant.nu>; Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars

Se tidligere fremsendt farve/materiale oversigt. Oversigten ligger også på Dalux.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Lars Høi <lh@garant.nu>

Sendt: 10. august 2020 08:22

Til: Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Ingri og øvrige

Bygherre har ønsker om nogle forskellige farver.

Jeg har brug for en gulvplan, der viser de korrekte farver/dessin numre på gulvene.

Med venlig hilsen

Lars Høi

5488



Fra: Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>

Sendt: 5. august 2020 11:56

Til: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Lars Høi <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten/Lars,

Gulvplaner er opdateret, og bliver lagt på Dalux. De er også vedhæftet i denne mail sammen med Oplæg gulve.

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvsbogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ibl@friis-moltke.dk



 Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!

Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Sendt: 3. august 2020 09:28

Til: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; 'Lars Høi' <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Ingri B. Løvsbogen <ibl@friis-moltke.dk>

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

Vi har rettet gulvene i det tidligere fremsendte til bygherre og Gulvlægger for at få en pris.
Vi mener godt at der kan gives en pris ud fra det vedhæftede.

Vi ville vendte med at bruge timer på at rette gulvplaner indtil der var en aftalt pris.

Vi retter gulvplanerne nu. 😊

Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder

Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 14. juli 2020 09:00

Til: 'Lars Høi' <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnet <al@fmbyggningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Det kan jeg godt se. Den jeg refererede til var også kun et oplæg.
@Henrik vil i få opdateret planerne når i er tilbage på kontoret?

Jeg får arrangeret et møde i slut uge 33.

5489
Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Lars Høi [<mailto:lh@garant.nu>]

Sendt: 14. juli 2020 08:53

Til: Morten Bramstrup Jakobsen; Arne Borum Linnet

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; hv@friis-moltke.dk

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

De gulvplaner, der er på Dalux er ikke opdateret med farvenumre på linoleum. Der står stadig "gummi eller linoleum". Dem jeg kan finde er uploaded i marts måned, så de er ikke opdateret.

Jeg har brug for at tegningerne viser de rigtige dessinumre, ellers er det dømt til at gå galt.

Jeg går på ferie fra næste uge. Vi kan tage et møde slut uge 33/start uge 34, hvis det kan passe jer.

Med venlig hilsen

Lars Høi

Garant

FOR GULVE OG GARDINER
Høi Tæpper A/S, Rødebro

Tlf. 74 66 21 24

Mobil 20 27 38 10



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>

Sendt: 14. juli 2020 08:41

Til: Lars Høi <lh@garant.nu>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; hv@friis-moltke.dk

Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Tak for din mail

Den opdateret plan skulle meget gerne være tilgængelig på Dalux.

Angående aftalesedlen mangler jeg stadig en opgørelse for de reelle "ekstra m²". – Jeg vil foreslå et dialogmøde, hvor vi gennemgår hvorfor I, og Friis og Moltke kommer frem til to forskellige mængder. Jeg skal selvfølgelig gerne underskrive den når parterne er enig.

Er det en acceptabel løsning for Jer?

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Lars Høi [<mailto:lh@garant.nu>]
Sendt: 14. juli 2020 08:37
Til: Morten Bramstrup Jakobsen; Arne Borum Linnét
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; hv@friis-moltke.dk
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

Jeg mangler stadig en opdateret gulvplan samt en aftaleseddel, så jeg kan få bestilt materialerne.
Arne: Hvordan ser tidsplanen ud for os?

Med venlig hilsen
Lars Høi

Garant
FOR GULVE OG GARDINER
Høi Tæpper A/S, Rødekre

Tlf. 74 66 21 24
Mobil 20 27 38 10



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Sendt: 25. juni 2020 11:03
Til: Lars Høi <lh@garant.nu>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; hv@friis-moltke.dk
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Tak for det hurtige svar. Så tager vi den blå farve i delområderne. – Jeg tror Friis og Moltke er på sagen og får planen opdateret.

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Lars Høi [<mailto:lh@garant.nu>]
Sendt: 25. juni 2020 11:01
Til: Morten Bramstrup Jakobsen
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen
Emne: SV: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Morten

Der er ikke noget økonomi i at ændre farven.
Jeg vil meget gerne have en opdateret gulvplan hurtigst muligt (inden for en uge), så jeg kan få reserveret de forskellige mængder.

De prøver i har, må i gerne ligge i skurvognen på byggepladsen, så tager jeg dem med, når jeg engang skal til byggemøde.

Med venlig hilsen
Lars Høi



Tlf. 74 66 21 24
Mobil 20 27 38 10



Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Sendt: 25. juni 2020 10:44
Til: Lars Høi <lh@garant.nu>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: VS: SSK - valg af Gulvfarve juni 2020

Hej Lars.

Lige et par ting ift. skolen i Skærbæk. Som du kan se af nedenstående korrespondance. Skolen ønsker gerne at dele af gulvet, hvor det var tiltænkt blå bliver lavet med Linoflex Forbo 809, lys blå i stedet for den grønne. Er det muligt at få med og er der evt. mærkonomi forbundet med det? Jeg får selvfølgelig Friis og Moltke til at opdater, deres farveplan til dig. – Ellers ønskes de tre farver du har fremsendt.

Angående farveprøver samt katalog, skal jeg sende dem retur til dig?

Venlig hilsen

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk



Fra: Klaus Fog
Sendt: 25. juni 2020 08:26
Til: Thomas Ushus
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; Sune Bundesen
Emne: Gulve

Hej Thomas (cc Kim og Sune)

Vi har kigget en gang mere på gulvfarver efter, at det er blevet ændret til linoleum og alle væggene er blevet ændret til hvid farve. Vi kigger på at ændre gulvet i indskoling på begge etager til Linofleks Forbo 809 (lyseblå farve). Vores indskoling hedder "Vadehavet" og mange af udsmykningerne vil nok være i den genre. Derfor passer det bedst med et blå gulv. De øvrige gulve fastholder vi. Har du nogle faglige kommentarer til det?

Venlig hilsen

Klaus Fog
Distriktsskoleleder
Skærbæk Distriktsskole
Børn & Skole

Tønder Kommune
Skolegade 19 - 6780 Skærbæk
Tlf. +45 74 92 82 81 - E-mail kfo3@toender.dk



[<Logo>](#)

 FRIIS & MOLTKE
ARCHITECTS



SKÆRBÆK SKOLE
OPLÆG TIL GULVE OG FARVER
31.01.2020 REV. C - 29.06.2020

LINOLEUM:

FORBO LINO FLEX



BRUN 208



GRÅ 617



GRØN 407




LYS BLÅ 809


Læringsrum, fællesrum, finværksteder,
garderober, toiletter, personalerum

VINYLGULV:

FORBO SURESTEP ORIGINAL



171262 UMBER



171922 CONCRETE

Vådrum - brusenicher og rengøringsrum

TRÆGULV:

HØJKANTSPARKET, EG




EG, NATUR

Administration, grovværksted

LAMELMÅTTER:

SOM EGE LAMELMÅTTER



TEKSTIL/ALU/GUMMI

Vindfang og garderobe indskoling

BETONGULV:

STØVBUNDET BETON



NATUR

Teknikrum, varmt depot/rengøring





